


工程量确认单



- 1、清理草地 4788 m²。
- 2、机械平整场地 4788 m²；回填 100mm 厚石子 540 m³。
- 3、排球场、篮球场、器械场：400mm 厚外运土回填；400mm 厚戈壁料回填。150mm 厚 C25 商品混凝土浇筑地面 1554 m²。
- 4、排球场、篮球场铺设硅 PU 地面 1428 m²。
- 5、新建多孔砖台阶长 76m、宽 0.3m、高 0.15m，共计三踏，水泥砂浆抹灰。
- 6、机械开挖排水沟长 96m、宽 0.6m、深 0.6m。

建设单位（签字盖章）：_____

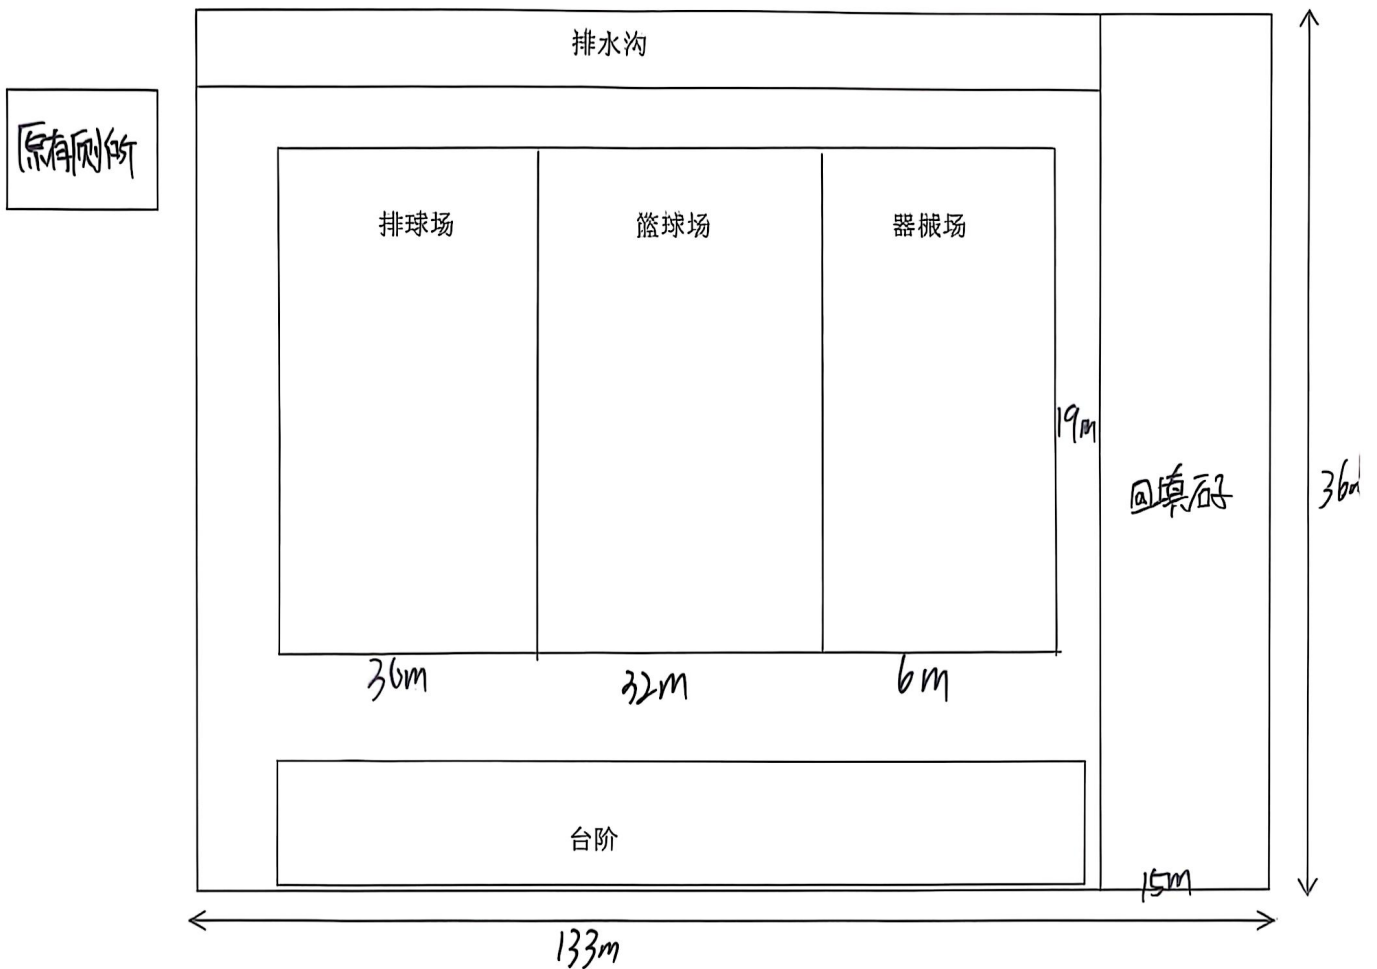
