

合同书编号: AKZCYGK20250415-01/ 第 1 包

四十一团 2025 年移动式小型保鲜库项目

施工合同

工程名称: 四十一团 2025 年移动式小型保鲜库项目

工程地点: 四十一团三连、六连、七连、九连

签订日期: 2025 年 5 月 日

协议条款

发 包 人（全称） 四十一团农业和林业草原中心

承 包 人（全称） 1、新疆兵安电力建设有限责任公司

2、新疆新北商贸有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就移动式小型保鲜库采购、建设及电力安装项目协商一致，订立本合同条款如下。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：四十一团 2025 年移动式小型保鲜库项目

1.2 工程地点：四十一团三连 18 套，六连 5 套，7 连 12 套，9 连 15 套

1.3 工程内容：移动式小型保鲜库施工建设、安装。

第二条 工程承包范围

2.1: 新疆兵安电力建设有限责任公司：敷设室外供电管线等附属配套设施，购置柱上变压器 3 台（250KAV）。

2.2: 新疆新北商贸有限公司：购置成品移动式小型保鲜库 50 个，每个保鲜库容量为 3 吨；（配置技术参数要求详见附件一）

第三条 承包方式

包工包料。

第四条 施工工期

开 工 日 期： 2025 年 5 月 30 日

完 工 日 期： 2025 年 6 月 30 日

预计施工工期总日历天数 30 天。

第五条 工程质量标准

5.1 工程质量标准：合格

5.2 工程质量材料标准：国家标准质量要求（技术参数标准见附件一）

5.3 工程施工质量满足电气装置安装工程施工验收规范及建筑工程施工验收规范，原电力部及国家颁布的现行的各种有关施工及验收规范、质量评定标准，《电力建筑安全健康与环境管理工作规定》，满足施工图设计。

第六条 合同价款

6.1 确定合同价款的方式，双方约定：合同价款为人民币小写：¥ 2200732.33 元，金额大写：贰佰贰拾万零柒佰叁拾贰元叁角叁分。其中：不含税价 2019020.49 元，增值税税率 9%，税款：181711.84 元，若国家出台新的税收政策，以不含税价为基准，执行国家法规及税务机关规定的税率。

6.2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。

6.3 双方在本条款内约定：对于设计变更或现场签证引起的工程量变化，经甲方、监理方确认后，按照变更或签证后的工程量及相应的综合单价调整工程进度款，将调整原因、金额以书面签证形式通知发包人进行复核。如审核过程中发现问题，发包人应及时通知承包人，承包人应在规定时间内进行整改或提供补充资料。发包人审核确认调整金额后可作为追加合同价款，与工程款同期支付。发包人收到承包人通知后 20 日内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。如无相应综合单价，由双方根据市场价格协商确定。

第七条 工程付款及结算方式

7.1 工程预付款：本合同生效后 5 日内，发包方向承包方预付合同价款的 30%，计 660219.70 元（金额大写：陆拾陆万零贰佰壹拾玖元柒角整）。

7.2 工程预付款时限：预付时间应不迟于约定的开工日期。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间 2 天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知 2 天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

7.3 工程进度款：根据确定的工程量结果，监理人在收到进度付款清单后，尽快完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出监理人及审计单位人为应当到期支付给承包人的金额，进度款金额应按审定的工程价款的 90% 支付给承包人，支付至合同总价的 85% 后停止。

7.4 工程款：工程完工程结算及竣工验收合格后，发包方向承包方支付至合同价款的 12 %。

7.5 工程质保金为合同价款的 3%：在工程正常运行 12 个月后，发包方向承包方支付完合同价款 3 %的质保金（无息），计 66021.97 元（金额大写：陆万陆仟零贰拾壹元玖角柒分）。

7.6 结算方式：电汇或支票。

7.7 发票：承包人应向发包人提供相应的符合税法要求的增值税专用发票。

第八条 发包方责任

8.1 发包方具备工程施工必要合法手续：即土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等相关证明、手续，协调沟通工程所在地领导与施工方的相关文件证明，包括开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

8.2 发包人必须满足工地现场施工方用电需求、地面平整及硬化等基础条件的基本要求。最迟时限为施工方进场前一天。

8.3 发包方协调项目所在地相关配合工作，如有意见不统一由发包人负责协调。

8.4 按照合同签订付款条款支付工程款。

8.5 发包方负责对承包方的安全施工教育、提醒。

第九条 承包方责任

9.1 按照招标文件规定，及时缴纳履约保证金或出具履约保函工作。

9.2 按合同约定的时间、质量标准按照合同要求具体点及数量位供应设备并完成安装工作。具体安装移动式保鲜库设备数量为：三连 18 套，六连 5 套，7 连 12 套，9 连 15 套及配套电力。

9.3 质量标准：满足本发包人提出的是最低限度的要求，我公司的方案符合现行国家有关工程施工验收规范要求并达合格标准。使其掌握设备的基本操作及日常维护知识。

9.4 工程质量要求：我公司对工程质量要求为根据发包方提供的建设地点、建设内容保质保量地进行施工，本工程的工程质量符合国家验收标准合格以上要求，按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和工程量清单要求等技术文件为依据施工。如工程质量达不到约定合格条件的部分，一经发现，可要求返工，直至达到合同约定条件，并由我公司承担全部返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。

9.5 施工材料要求：用于本工程的主要材料品质不得低于工程量清单中对材料设备所规定的参照规格、型号、规格、技术参数各项指标自行采购材料设备，质量应符合国

家和行业标准、经采购人确认，才能进行使用和安装，并同时提供相关质量证件。如若未按此采购材料，将视为违约，所造成的损失由我方承担，所有材料均为环保型优等品。如若施工单位未按此采购材料，将视为违约，所造成的损失由施工单位承担。

9.6 工程安全要求：工程安全要求为严格执行《中华人民共和国安全生产法》等法律和法规的规定。

9.7 文明施工要求：文明施工根据文明施工标准化工地要求和安全文明施工规范，实现达标工地。施工现场平面布置在规定的施工用地范围内。材料、设备堆放整齐，保持场地卫生，做好现场环境保护工作，防止水污染、大气污染与噪声污染。务必每天及时清理场地。遵守管理规定，严禁在居民正常休息时段施工；保护财物，若有损坏则照价赔偿。

9.8 其他：在施工过程中尽量降低因施工噪音、交通和环境等因素(大气、水、固体废物污染)对周边职工群众的居住及出行和环境造成的影响。若在施工过程中破坏周边职工群众的农作物，我公司及时处理，所造成的损失及后果自行承担，如有青苗补偿和周边阻工引起的人员、机械台班误工费等，我公司在响应时要综合考虑。保持日常清洁卫生及降尘符合环境卫生管理的有关规定和安全文明施工标准化管理的要求。同时办理有关施工现场交通、水土保持、固体废物污染和施工噪音，安全生产等管理规定手续，并承担有关费用。我公司承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

9.9 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程；除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

9.10 向甲方提供设备的使用说明书、保修卡、合格证等相关资料及文件。

第十条 施工图纸

发包人向承包人提供图纸的日期和套数：开工前 3 日，图纸 1 套。

第十一条 工程变更

合同履行中如发包人要求变更工程质量标准或变动工程量及提供设备材料、前期等工作，经发包方、监理方签证后生效。

第十二条 工程验收

工程具备竣工验收条件，由施工单位通知质检部门，质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续，相关部门验收送电。工程未经竣工验收

或竣工验收未合格的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人承担一切责任。

第十三条 竣工资料

承包人提供竣工资料的约定时间：竣工验收送电后 30 个工作日内

承包人提供竣工资料的约定份数：1 套复印件

第十四条 发包方供应的材料和设备

第十五条 承包方供应的材料和设备

成品移动式小型保鲜库 50 个，每个保鲜库容量为 3 吨；购置柱上变压器 3 台（250KAV）；敷设室外供电管线等附属配套设施等。

因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。

第十六条 工程质量保修

16.1 发包方负责采购的材料和设备质量由发包方负责。

16.2 承包方负责采购的材料和设备质量由承包方负责。承包方负责施工的工程质量。

16.4 本工程双方约定的工程质量保修期自 2025 年 月 日至 2026 年 月 日，工程质量保修期为 壹 年。

第十七条 违约责任

17.1 承包方违约应承担的责任：按《中华人民共和国民法典》执行；承包方应保证按时交货及完成安装。如延误安装工期（不可抗力除外），造成发包方无法按时正常使用，则承包方自延误日起至安装完成日，每日支付合同总额的 0.15% 作为违约金。如因发包方原因延误工期，则承包方不負責任。

17.2 发包方违约应承担的责任：按《中华人民共和国民法典》执行；发包方如未能按时付款，则自延误付款日起，以未付总款项为基数，支付每日万分之十五金额作为违约金。并且发包方同意，承包方有权向其要求一次性支付所欠的全部货款（包括质保金）。

17.3 双方违约应承担的责任：双方应严格按本合同约定款项履行相应的义务，一方违约，应按国家法律法规的相关规定向对方承担相应的违约责任并赔偿对方的损失，其损失包括律师费、保全费、担保费、诉讼费，因追索债务产生的交通费等维权的相应费用。

第十八条 合同争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交合同签订地仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十九条 其他

第二十条 合同生效

合同订立时间：2025 年 月 日

合同订立地点：新疆生产建设兵团四十一团草湖镇。

本合同的双方约定：双方签字盖章后生效。

第二十一条 合同份数

本合同一式玖份，发包人、承包人各持三份。

第二十二条 终止

发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

签署页

甲方

单位名称（章）



单位地址：

法定代表人：



委托代理人：

电 话：

开户银行：

帐 号：

税 号：

签约日期： 年 月 日

乙方

单位名称（章）新疆兵安电力建设有限责任公司

（盖章）



单位地址：

法定代表人：包文韬

委托代理人：

电 话：

开户银行：中国农业银行股份有限公司喀什草湖支行

帐 号：30784101040004200

税 号：91659003MABKYYL66Y

签约日期： 年 月 日



乙方

单位名称(章)新疆新北商贸有限公司(公章)

单位地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)

北站路1号

法定代表人:陈子龙

委托代理人:

电话:13565849580

开户银行:中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐城西兵

团支行

帐号:707301040001545

税号:91650100787623964B

签约日期: 年 月 日

此页无正文

合同附件（一）技术参数要求：


序号	项目名称	技术要求	计量单位	数量
1	成品移动式小型保鲜库	规格尺寸:箱体尺寸 2.2m×6.00m×2.20m 建筑总高度为 2.20m 库体温度: -5 ° C ~ 10 ° C 可调。 冷库库体自重:1 吨; 库内使用容量:3 吨。 一、设备部分: 1. 整套冷库冷源设备为: 冷赞机组 (松下机头) 2. 蒸发器采用: 铜管翅片风冷式 3. 融霜方式: 热氟融霜 4. 制冷剂: R410a 5. 控制箱: 带远程控制 6. 辅助材料: 包括连接铜管、电缆线、冷库照明、钢材五金固件等 二、冷库外护及保温部分 1. 冷库外护采用钢材底座, 固定顶板 2. 库体六面体顶板、墙板及地面采用 100mm 厚聚氨酯保温板。 三、运输及安装及交付地点: 1. 详见附件二施工图纸及甲方要求	个	50


序号	项目名称	技术要求	计量单位	数量
1	油浸电力变压器	1. 名称:柱上油浸式变压器 2. 容量 (KV · A) :250kVA 3. 备注:含柱上油浸式变压器、配件等所需材料购置、运输、安装、调试等所有施工工艺, 直至后期投入使用 4. 台区四周需设置防护栏杆, 尺寸 5m*4m 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 本体安装	台	3

2	导线架设	1. 名称:10kV 高压电缆 2. 型号:3* (10KV*JKLGYJ*50/8) 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	
3	配电箱	1. 名称:室外配电箱 2. 型号:详设计 3. 备注:含室外配电箱基础制作、安装等所有施工工艺 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	
4	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4x70 3. 备注:含电缆挖方、填方、回填等所有施工工艺 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 土方开挖、回填 2. 电缆敷设 3. 揭(盖)盖板	m	
5	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5x6 3. 备注:含电缆挖方、填方、回填等所有施工工艺 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 土方开挖、回填 2. 电缆敷设 3. 揭(盖)盖板	m	
6	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质、规格:钢管 SC80 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地	m	


7	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质、规格:钢管 SC32 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地	m	
8	送配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 电压等级 (kV):详见施工图纸 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 系统调试	系统	


附件二：合同项目图纸

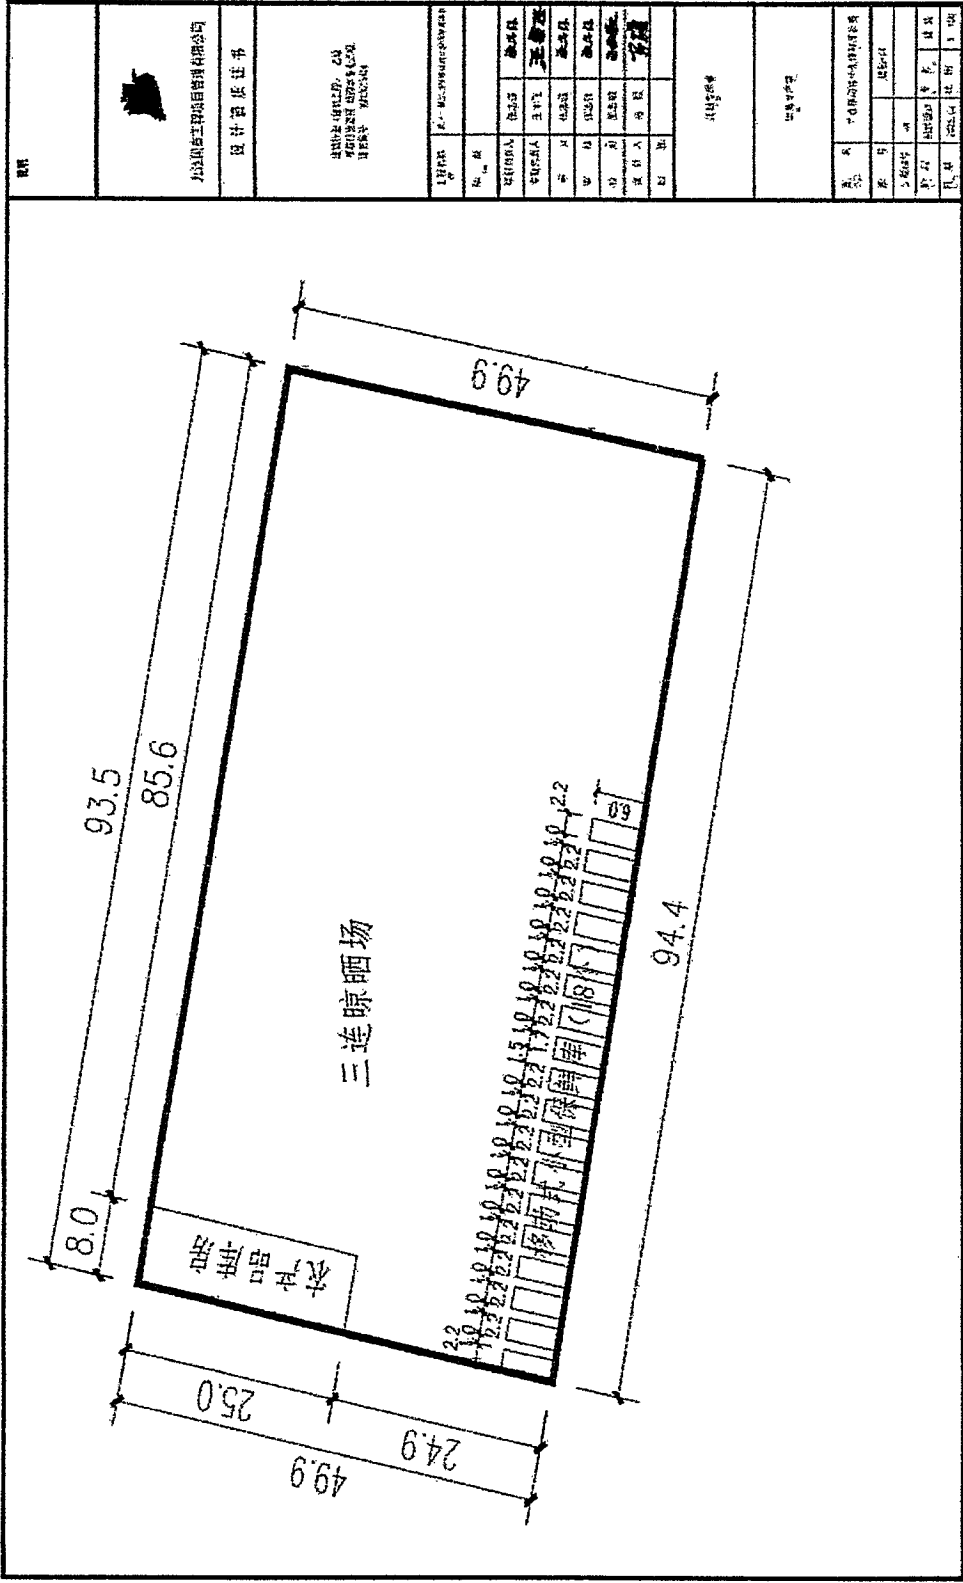


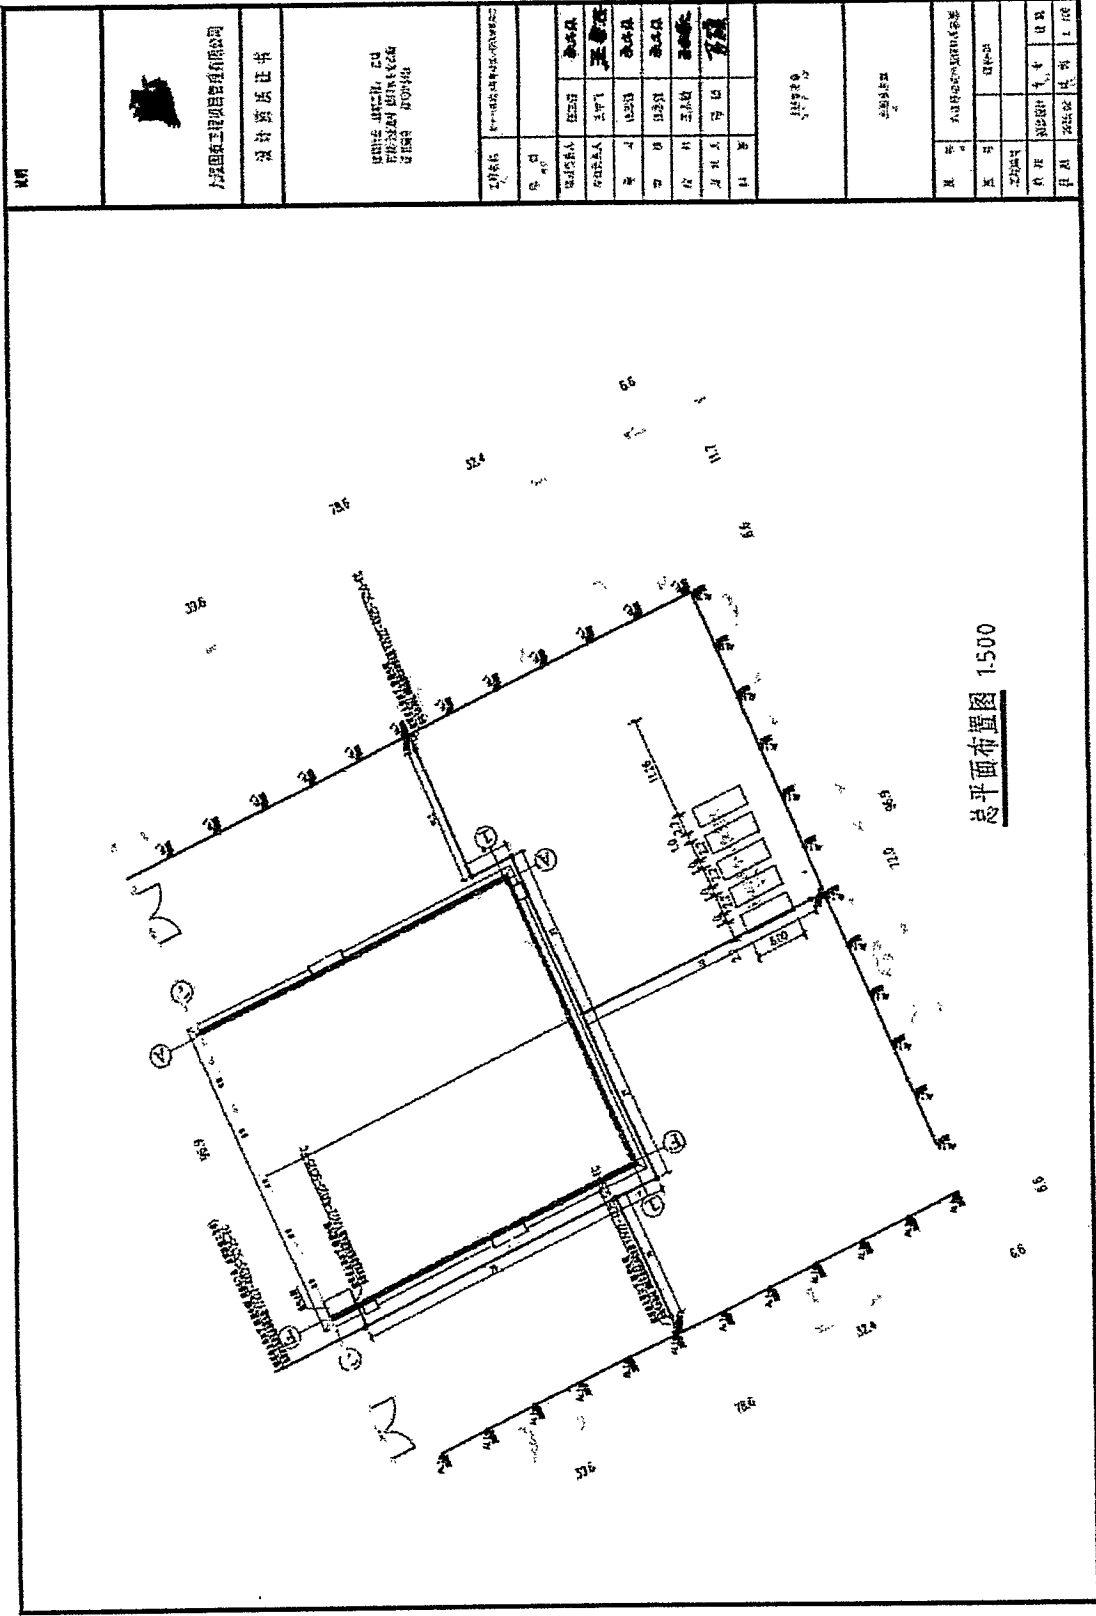



说明	
 江苏五中工程咨询有限公司	
设计资质证书	
资质等级：甲级 证书编号：苏咨证字第001号 有效期至：2025年12月	
工程名称	江苏五中工程咨询有限公司
建设单位	江苏五中工程咨询有限公司
项目负责人	王中
设计人	王中
审核人	王中
批准人	王中
日期	2024.10.10
设计单位	
名称	江苏五中工程咨询有限公司
地址	江苏省南京市鼓楼区
电话	025-12345678
传真	025-87654321
邮编	210000
网址	www.jswz.com
电子邮箱	info@jswz.com

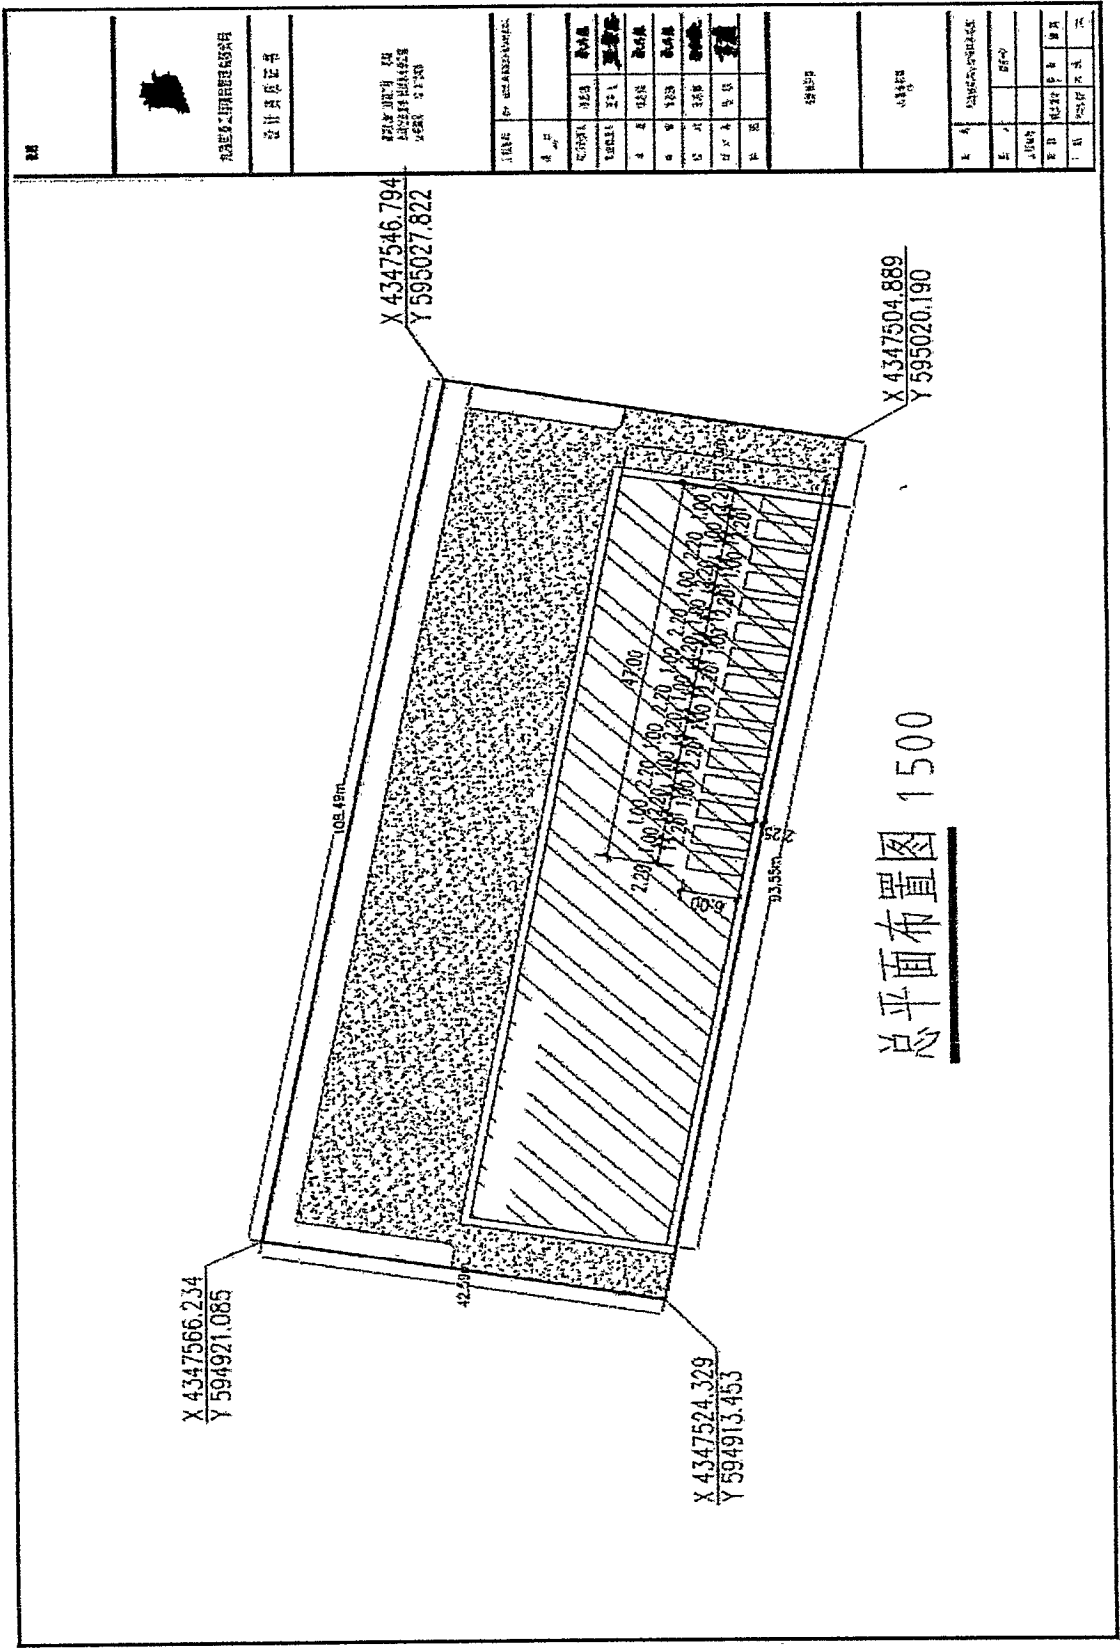

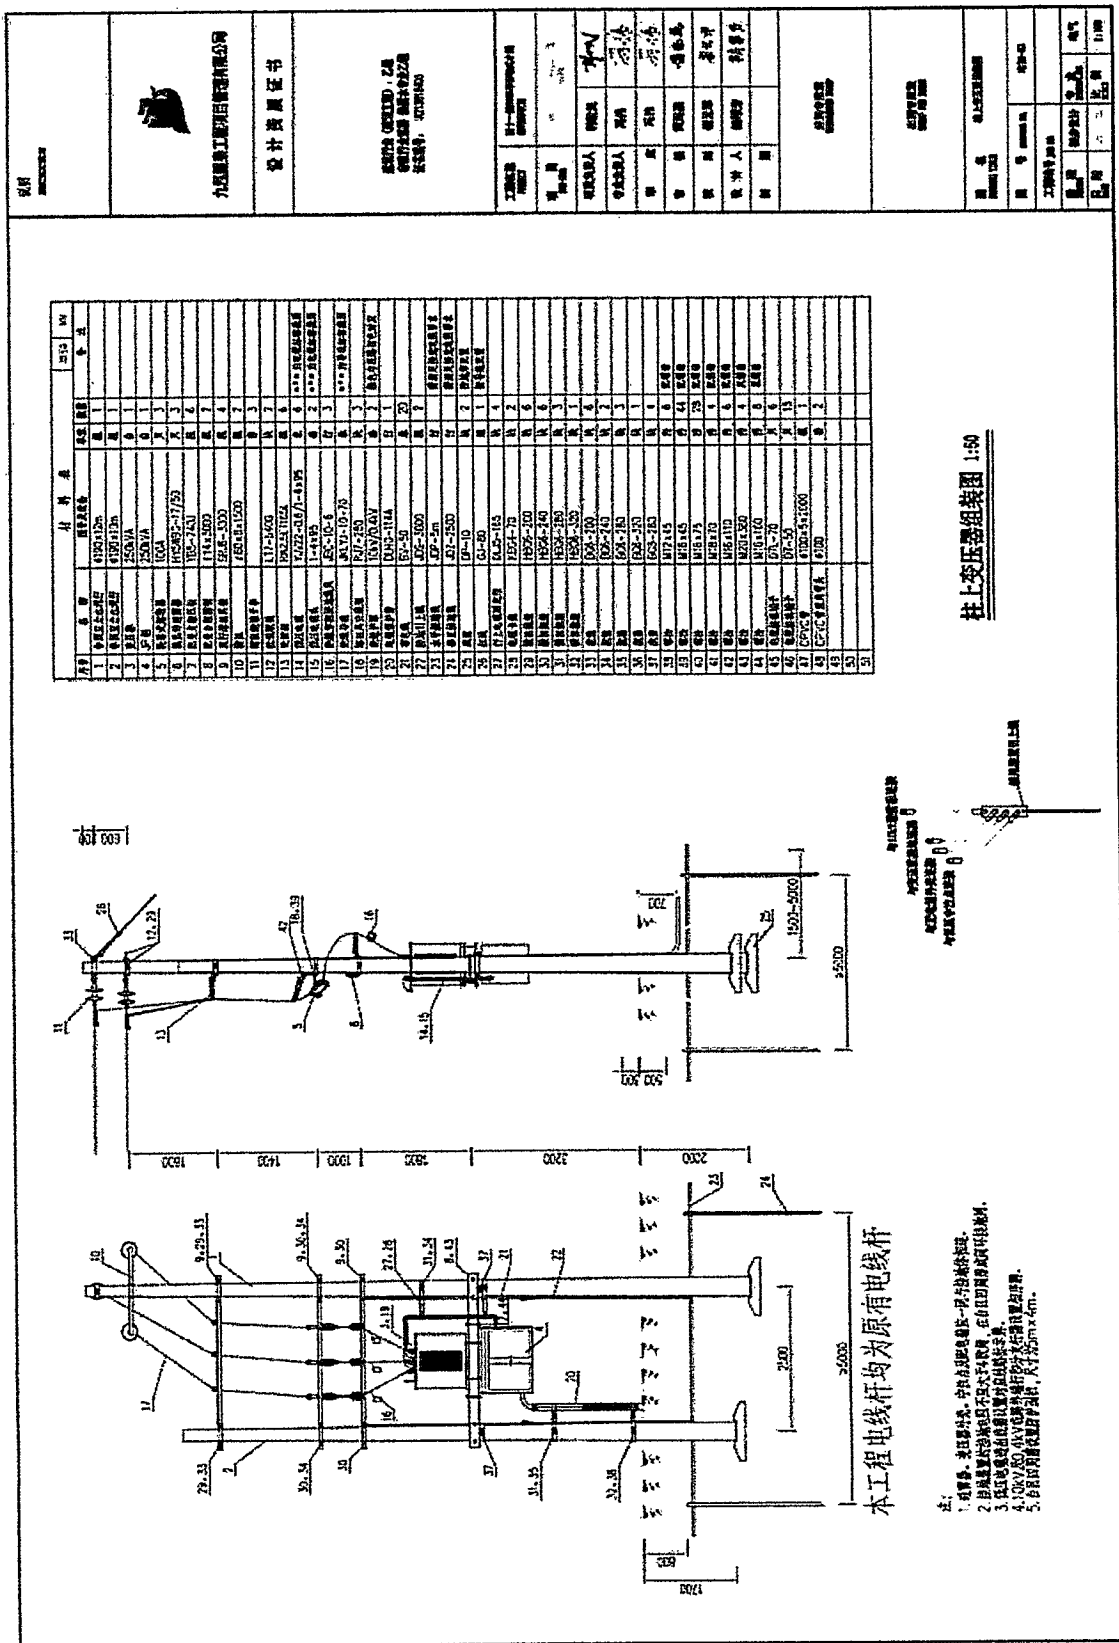

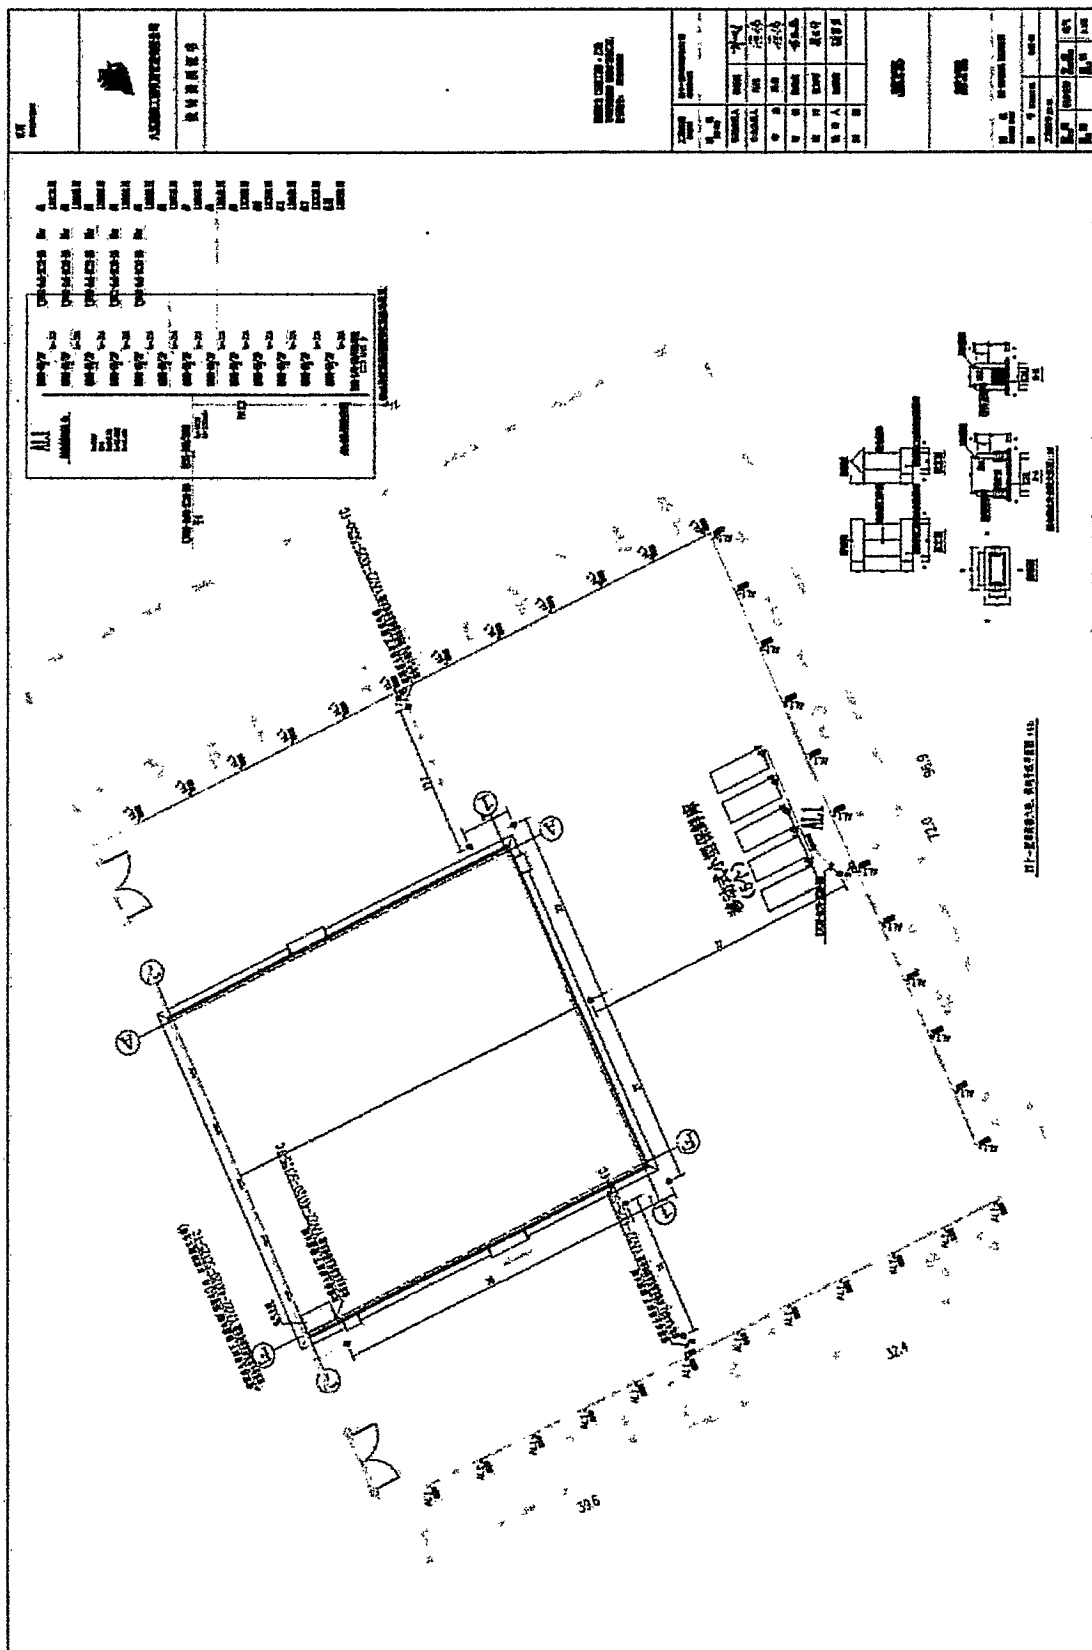

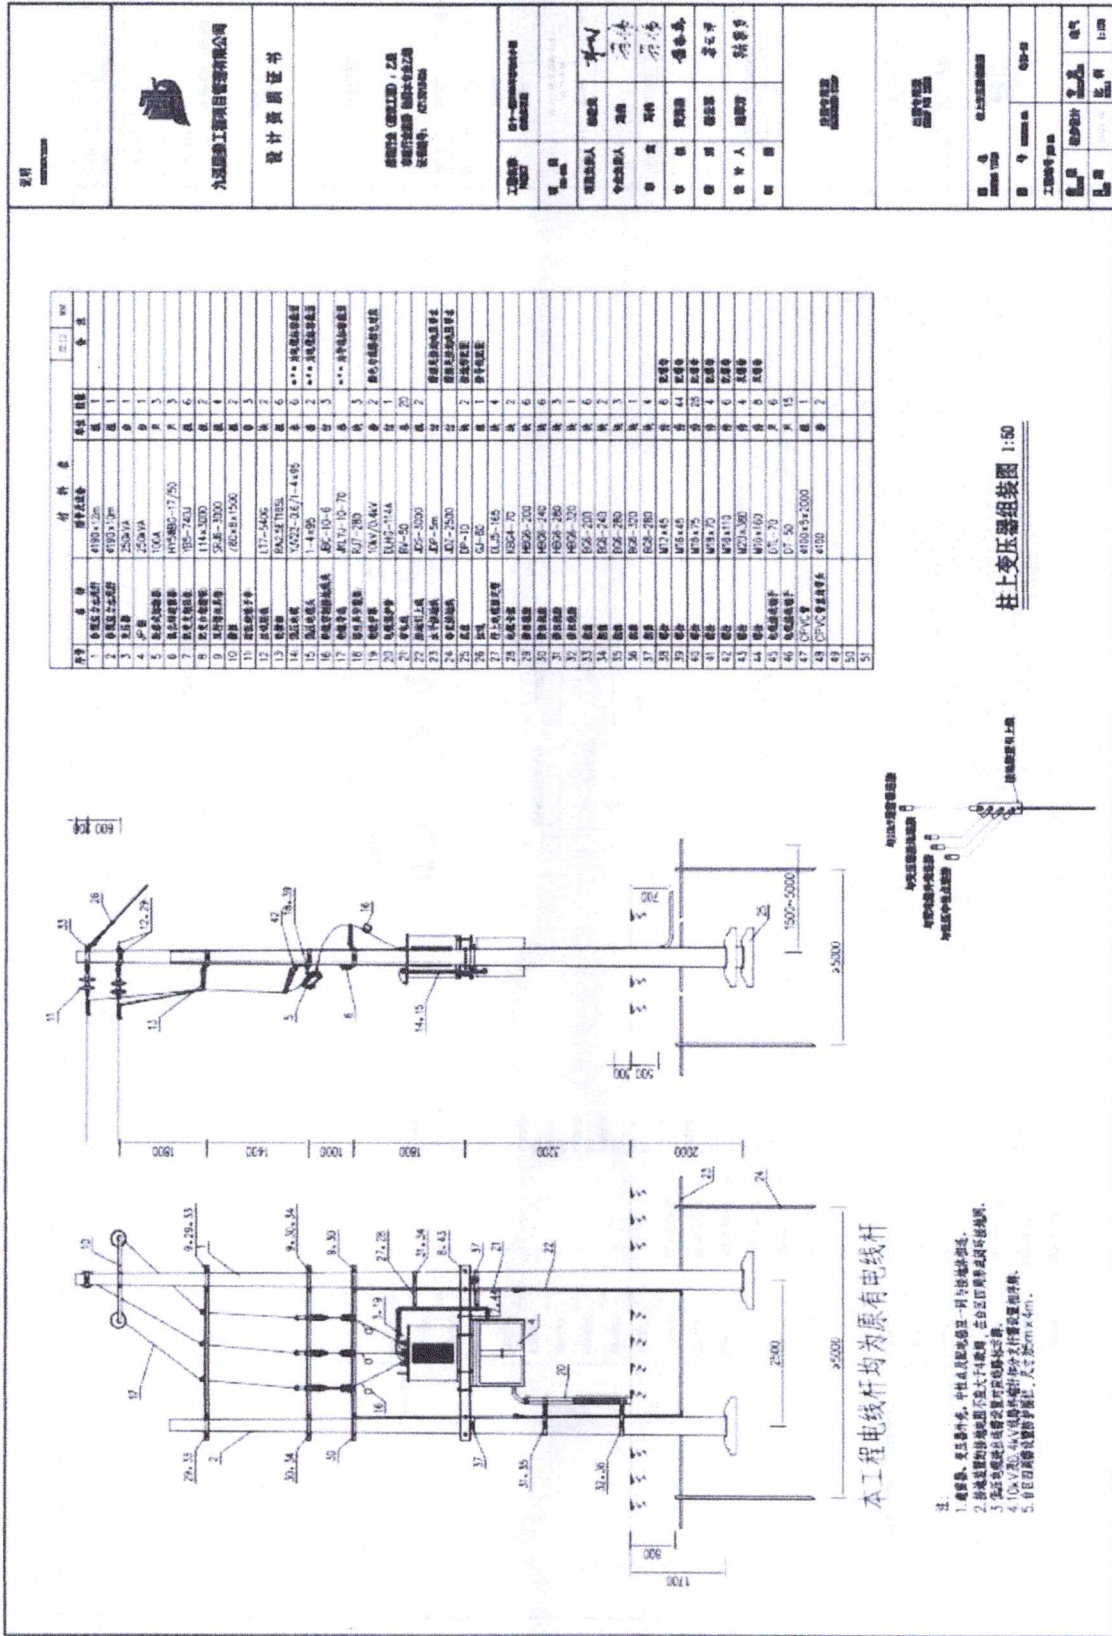

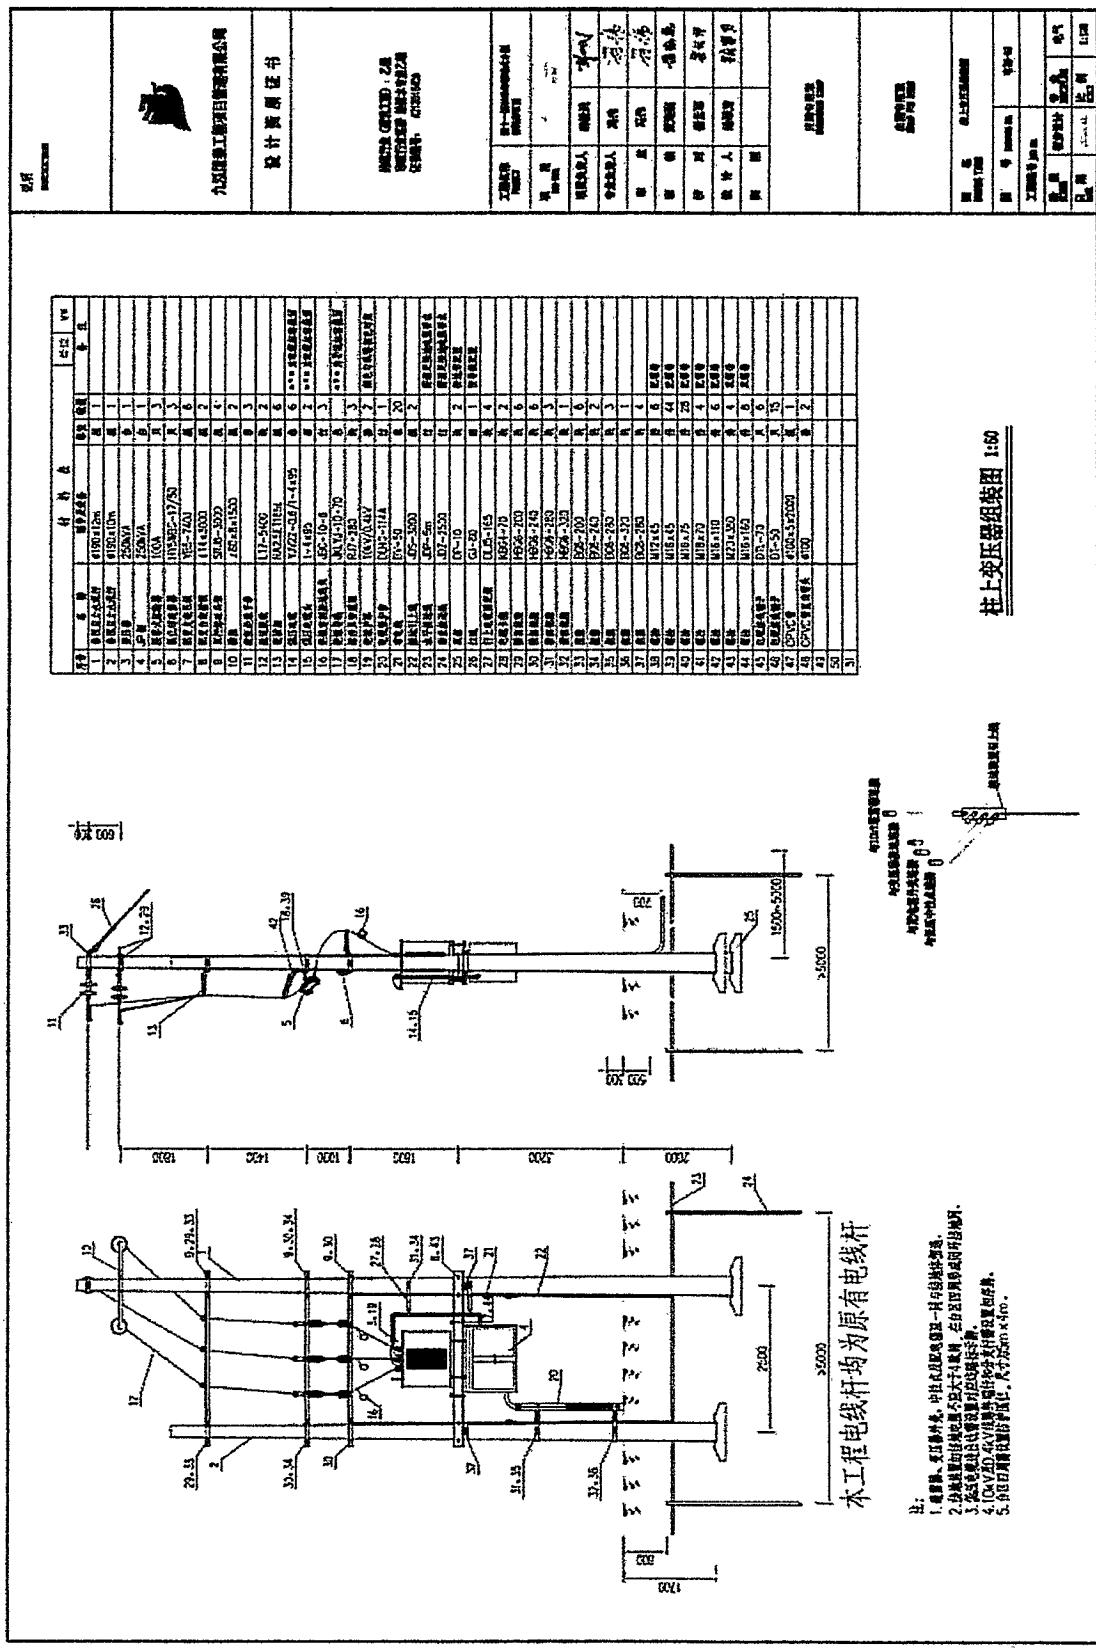

附件三：联合体协议

联合体协议书

(以联合体形式评审响应的，提供联合体协议书；本项目不接受联合体评审响应或者供应商不以联合体形式评审响应的，则不需要提供)

新疆兵安电力建设有限责任公司、新疆新北商贸有限公司(联合体所有成员名称) 自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加四十一团 2025 年移动式 小型保鲜库项目(项目名称)【项目编号/包号：AKZCYGK20250415-01/ 第 1 包】评审。

一、各方一致决定，新疆兵安电力建设有限责任公司(某联合体成员名称) 为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责评审响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据公开采购文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合评审响应各方产生约束力。

三、本次联合评审响应中，分工如下：

(联合体成员 1)新疆兵安电力建设有限责任公司承担项目采购合同金额的 15%，负责的工作和义务为：变压器采购及电力安装；

(联合体成员 2)新疆新北商贸有限公司承担项目采购合同金额的 85%，负责的工作和义务为：移动保鲜冷库采购及安装服务；

.....

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、(联合体成员 X、Y)提供的全部工程由中小企业实施，其合同份额占到合同总金额 1% 以上；.....。(未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体评审响应的，联合体协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体报价按评审标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。)

2、中小企业合同金额达到 1%，其中小微企业合同金额达到 1%。(要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按公开采购文件第一部分公开招标公告申请人的资格要求中规定的联合体协议书中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。)

附件 4：工程措施项目清单

分部分项工程措施项目清单

工程名称：四十一团 2025 年移动式小型保鲜库项目 标段：三连购置

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		三连购置						
1	01B001	非预应力电线杆、 断路器、高压计量箱、金具	[项目特征] 1. 名称:15m电线杆安装、断路器安装、高压计量箱（电表计量）、金具 3. 其余未注事项满足甲方要求及设计规范 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 购置、运输、安装、调试、第三方检测	套	1			
2	030401001002	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:柱上油浸式变压器 2. 容量 (KV · A) :250kVA 3. 备注:含柱上油浸式变压器、配件等所需材料购置、运输、安装、调试等所有施工工艺,直至后期投入使用 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 本体安装	台	1			
3	030410003002	导线架设	[项目特征] 1. 名称:100kV高压电缆 2. 型号:3* (10KV*JKLGYJ*50/8) 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.180			

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订采购合同，并就采购合同 约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合评审响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合 同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质 等级较低的供应商确定资质等级。


3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述 内容进行修改或撤销。

4、其他：设备费税率 13%,建安费税率 9%,如果因为税率问题产生税差， 由新疆新北商贸有限公司承担。


5、本协议书自签署之日起生效，若未成交，自本响应文件有效期结束后自行 失效；若成交，自合同书规定的期限之后自行失效。

6、本协议书正本一式二份，联合体成员各执二份；副本一式/份，联合体成员各执/份。

联合体成员 1 名称(公章): 新疆兵安申力建设有限公司



联合体成员 2 名称(公章): 新疆新北商贸有限公司



日期：2025 年 04 月 29 日

分部分项工程措施项目清单

工程名称：四十一团2025年移动式小型保鲜库项目

标段：三连购置

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030404017002	配电箱	[项目特征] 1. 名称:室外配电箱 2. 型号:详设计 3. 备注:含室外配电箱基础制作、安装等所有施工工艺 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1.000			
5	030408001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 4x70 3. 备注:含电缆挖方、填方、回填等所有施工工艺 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 土方开挖、回填 2. 电缆敷设 3. 揭(盖)盖板	m	40.000			
6	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5x6 3. 备注:含电缆挖方、填方、回填等所有施工工艺 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 土方开挖、回填 2. 电缆敷设 3. 揭(盖)盖板	m	250.000			
7	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电缆配管 2. 材质、规格:钢管 SC80 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地	m	40.000			

分部分项工程措施项目清单

工程名称：四十一团2025年移动式小型保鲜库项目

标段：三连购置

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电缆配管 2. 材质、规格: 钢管 SC32 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地	m	250.000			
		分部小计						
		三连购置						
10	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称: 室外配电箱 2. 型号: 详设计 3. 备注: 含室外配电箱基础制作、安装等所有施工工艺 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1.000			

分部分项工程措施项目清单

工程名称：四十一团2025年移动式小型保鲜库项目

标段：六连购置

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4x70 3. 备注:含电缆挖方、填方、回填等所有施工工艺 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 土方开挖、回填 2. 电缆敷设 3. 揭(盖)盖板	m	100.000			
12	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5x6 3. 备注:含电缆挖方、填方、回填等所有施工工艺 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 土方开挖、回填 2. 电缆敷设 3. 揭(盖)盖板	m	62.000			
13	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电缆配管 2. 材质、规格:钢管 SC80 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地	m	100.000			
14	030411001004	配管	[项目特征] 1. 名称:电缆配管 2. 材质、规格:钢管 SC32 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地	m	62.000			

分部分项工程措施项目清单

工程名称：四十一团2025年移动式小型保鲜库项目

标段：七连购置

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	01B001	非预应力电线杆、断路器、高压计量箱、金具	[项目特征] 1. 名称:15m电线杆安装、断路器安装、高压计量箱(电表计量)、金具 3. 其余未注事项满足 甲方要求及设计规范 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 购置、运输、安装、调试、第三方检测	套	1.000			
16	030401001003	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:柱上油浸式 变压器 2. 容量 (KV · A) :250kVA 3. 备注:含柱上油浸式变压器、配件等所需材料购置、运输、 安装、调试等所有施工工艺,直至后期投入使用 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 本体安装	台	1.000			
17	030410003003	导线架设	[项目特征] 1. 名称:100kV高压电缆 2. 型号:3*(10KV*JKLGJ*50/8) 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线 架设 3. 工地运输	km	0.100			

分部分项工程措施项目清单

工程名称：四十一团2025年移动式小型保鲜库项目

标段：七连购置

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030404017003	配电箱	[项目特征] 1. 名称:室外配电箱 2. 型号:详设计 3. 备注:含室外配电箱基础制作、安装等 所有施工工艺 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1.000			
19	030408001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4x70 3. 备注:含电缆挖方、填方、回填等所有施工工艺 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 土方开挖、回填 2. 电缆敷设 3. 揭（盖）盖板	m	50.000			
20	030408001006	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5x6 3. 备注:含电缆挖方、填方、回填等所有施工工艺 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 土方开挖、回填 2. 电缆敷设 3. 揭（盖）盖板	m	150.000			
21	030411001005	配管	[项目特征] 1. 名称:电缆配管 2. 材质、规格:钢管 SC80 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地	m	50.000			

分部分项工程措施项目清单

工程名称：四十一团2025年移动式小型保鲜库项目 标段：七连购置

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030411001006	配管	[项目特征] 1. 名称:电缆配管 2. 材质、规格:钢管 SC32 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地	m	150.000			
		分部小计						
		九连购置						
23	01B004	非预应力电线杆、断路器、高压计量箱、金具	[项目特征] 1. 名称:15m电线杆安装、断路器安装、高压计量箱(电表计量)、金具 3. 其余未注事项满足 甲方要求及设计规范 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 购置、运输、安装、调试、第三方检测	套	1.000			
24	030401001004	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:柱上油浸式 变压器 2. 容量 (KV · A) :250kVA 3. 备注:含柱上油浸式变压器、配件等所需材料购置、运输、 安装、调试等所有施工工艺,直至后期投入使用 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 本体安装	台	1.000			

分部分项工程措施项目清单

工程名称：四十一团2025年移动式小型保鲜库项目

标段：九连购置

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	030410003004	导线架设	[项目特征] 1. 名称:100kV高压电 缆 2. 型号:3* (10KV*JKLGYJ*50/8) 具体详见施工图及甲 方要求 [工程内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线 架设 3. 工地运输	km	0.100			
26	030404017004	配电箱	[项目特征] 1. 名称:室外配电 箱 2. 型号:详设 计 3. 备注:含室外配 电 箱基础制作、 安装等 所有施工工 艺 具体详见施工图及甲 方要求 [工程内容]] 1. 本体安 装 2. 基础型钢制作、安 装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1.000			
27	030408001007	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4x70 3. 备注:含电缆挖 方 、填方、回填 等所有 施工工艺 具体详见施工图及甲 方要求 [工程内容] 1. 土方开挖、回填 2. 电缆敷设 3. 揭(盖)盖板	m	55.000			
28	030408001008	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5x6 3. 备注:含电缆挖 方 、填方、回填 等所有 施工工艺 具体详见施工图及甲 方要求	m	200.000			
			[工程内容] 1. 土方开挖、回填 2. 电缆敷设 3. 揭(盖)盖板					

分部分项工程措施项目清单

工程名称：四十一团2025年移动式小型保鲜库项目 标段：九连购置

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	030411001007	配管	[项目特征] 1. 名称:电缆配管 2. 材质、规格:钢管 SC80 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地	m	50.000			
30	030411001008	配管	[项目特征] 1. 名称:电缆配管 2. 材质、规格:钢管 SC32 具体详见施工图及甲方要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地	m	200.000			

工程名称：四十一团 2025 年移动式小型保鲜库项目

标段：三连 18 套、六连 5 套 、七连 12 套、九连 15 套

冷藏库工程措施项目清单

序号	设备名称	规格型号	容量	单位	数量	品牌	其他
31	保鲜库	2.2m×6.00m×2.20m	3 吨	套	50	/	
32	冷源设备	冷赞机组	/	个	50	松下	
33	保鲜库控制箱	见设计图纸	/	套	50	/	带远程控制
34	配件材料		/	套	50		
