


滨海新区 30-1 号地块中小企业安置园消防报警室外综合排管

项目设计答疑

1. 编制预算的图纸是按照图纸的尺寸还是按照图集的尺寸？

设计回复：电缆预埋管线的数量规格、电缆井的规格数量按照图纸尺寸，具体施工参照图集。

2. 预埋管件有 6 孔和 5 孔的请提供具体图纸？




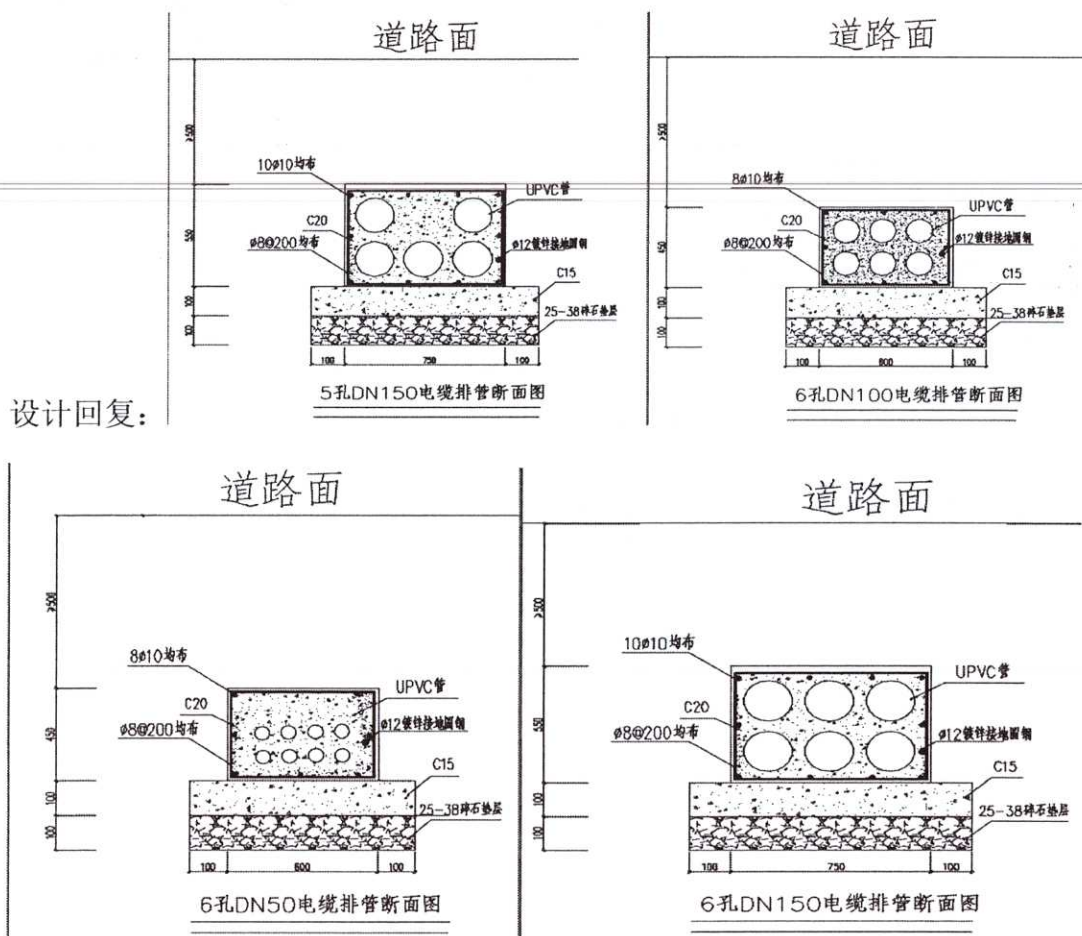


3. 弱电管线用的什么材质的管子？

设计回复：施工图上弱电保护管为 upvc 管（同时采用混凝土封包）

4. 请提供具体 500*500*1000 电缆井和 1000*1000*1000 电缆井的具体图纸？

设计回复：

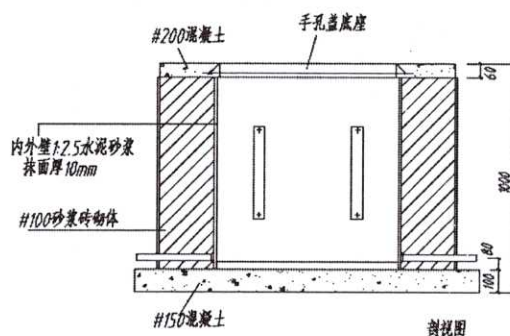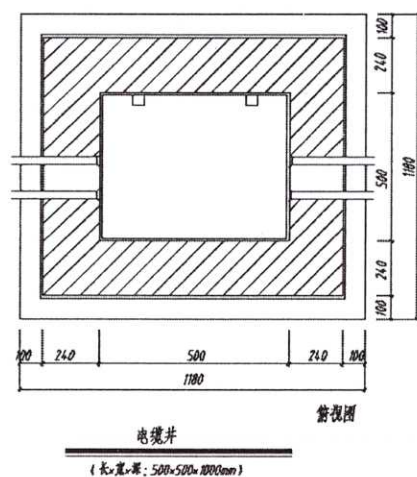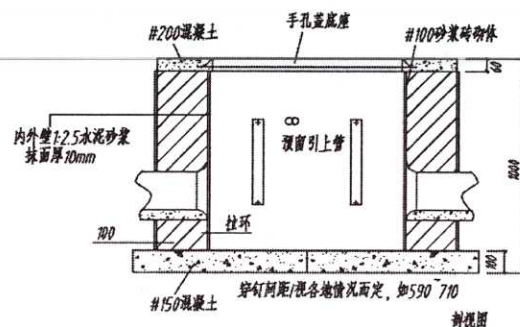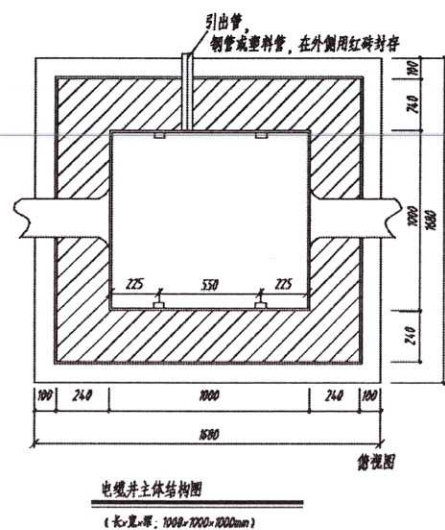

5. 图纸中盖板采用的材料请明确？

设计回复：材料采用 C25 商品混凝土。

6. 电缆井砖砌体做法未明确？

设计回复：M10 混合砂浆砌筑 MU10 混凝土实心砖。

7. UPVC 管的壁厚规格请明确？

设计回复：upvcDN50 壁厚 2.0mm；DN100 壁厚 3.2mm；DN150 壁厚 4.0mm

浙江省工业设计研究院有限公司
2024 年 08 月 16 日

技术联系专用章
章朝平
