


1、配电箱 AP1~AP3 是否为新做，若为新做其进线引自哪里。
新做，引自一层原变配电间


2、新建电梯是否要放入本次预算中，若放入请提供规格。
电梯做观光电梯，无障碍，载重量 1050，速度 1.0。

3、四层电气这一块是只有开关无灯具吗。

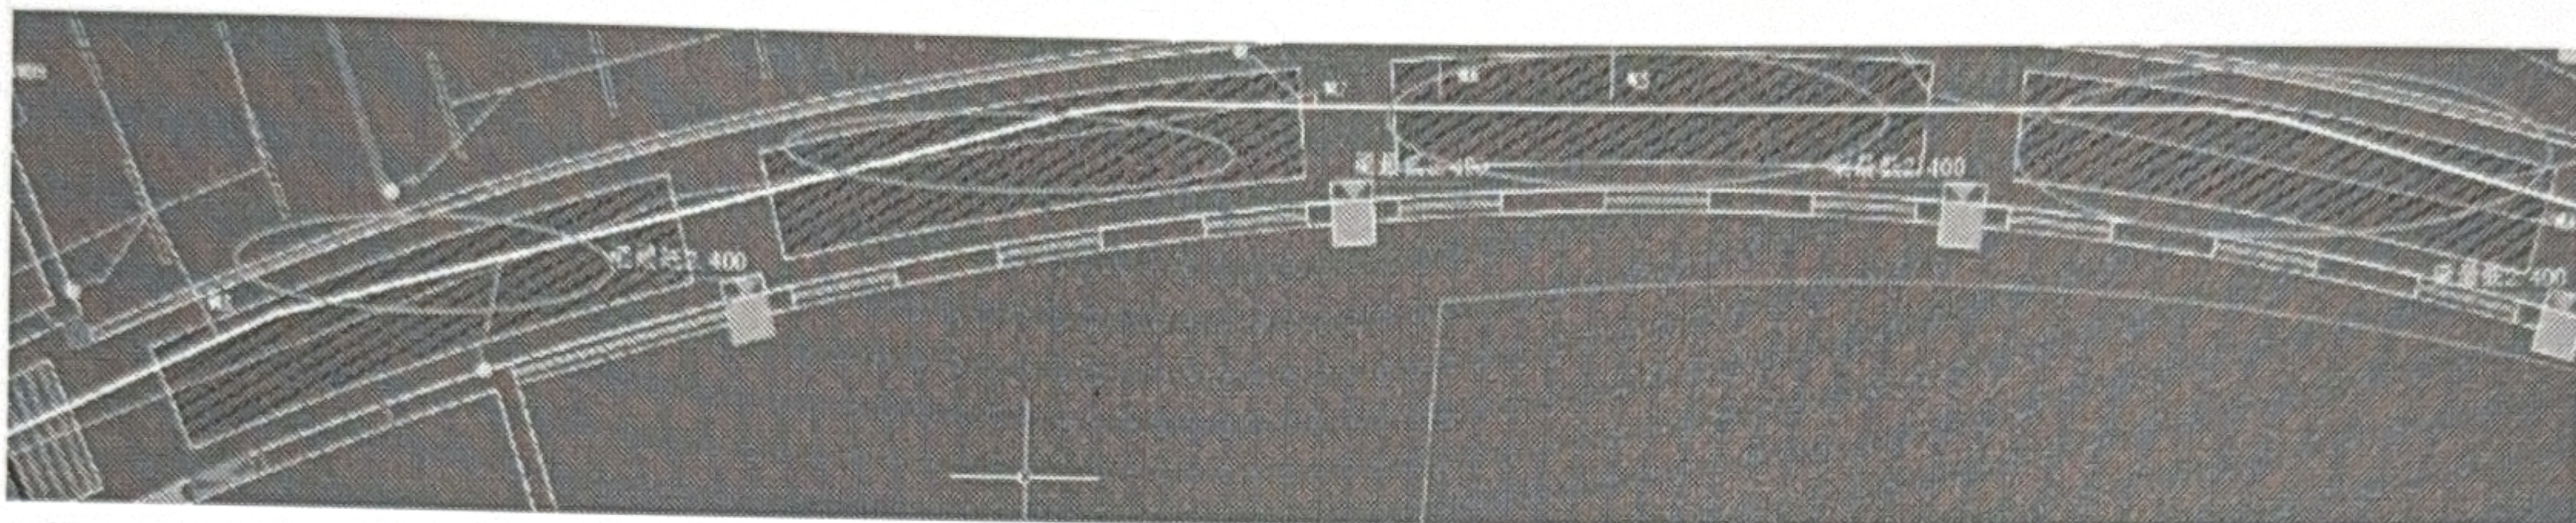

是透光软膜天花

4、1.5 壁挂机铜管规格是多少。

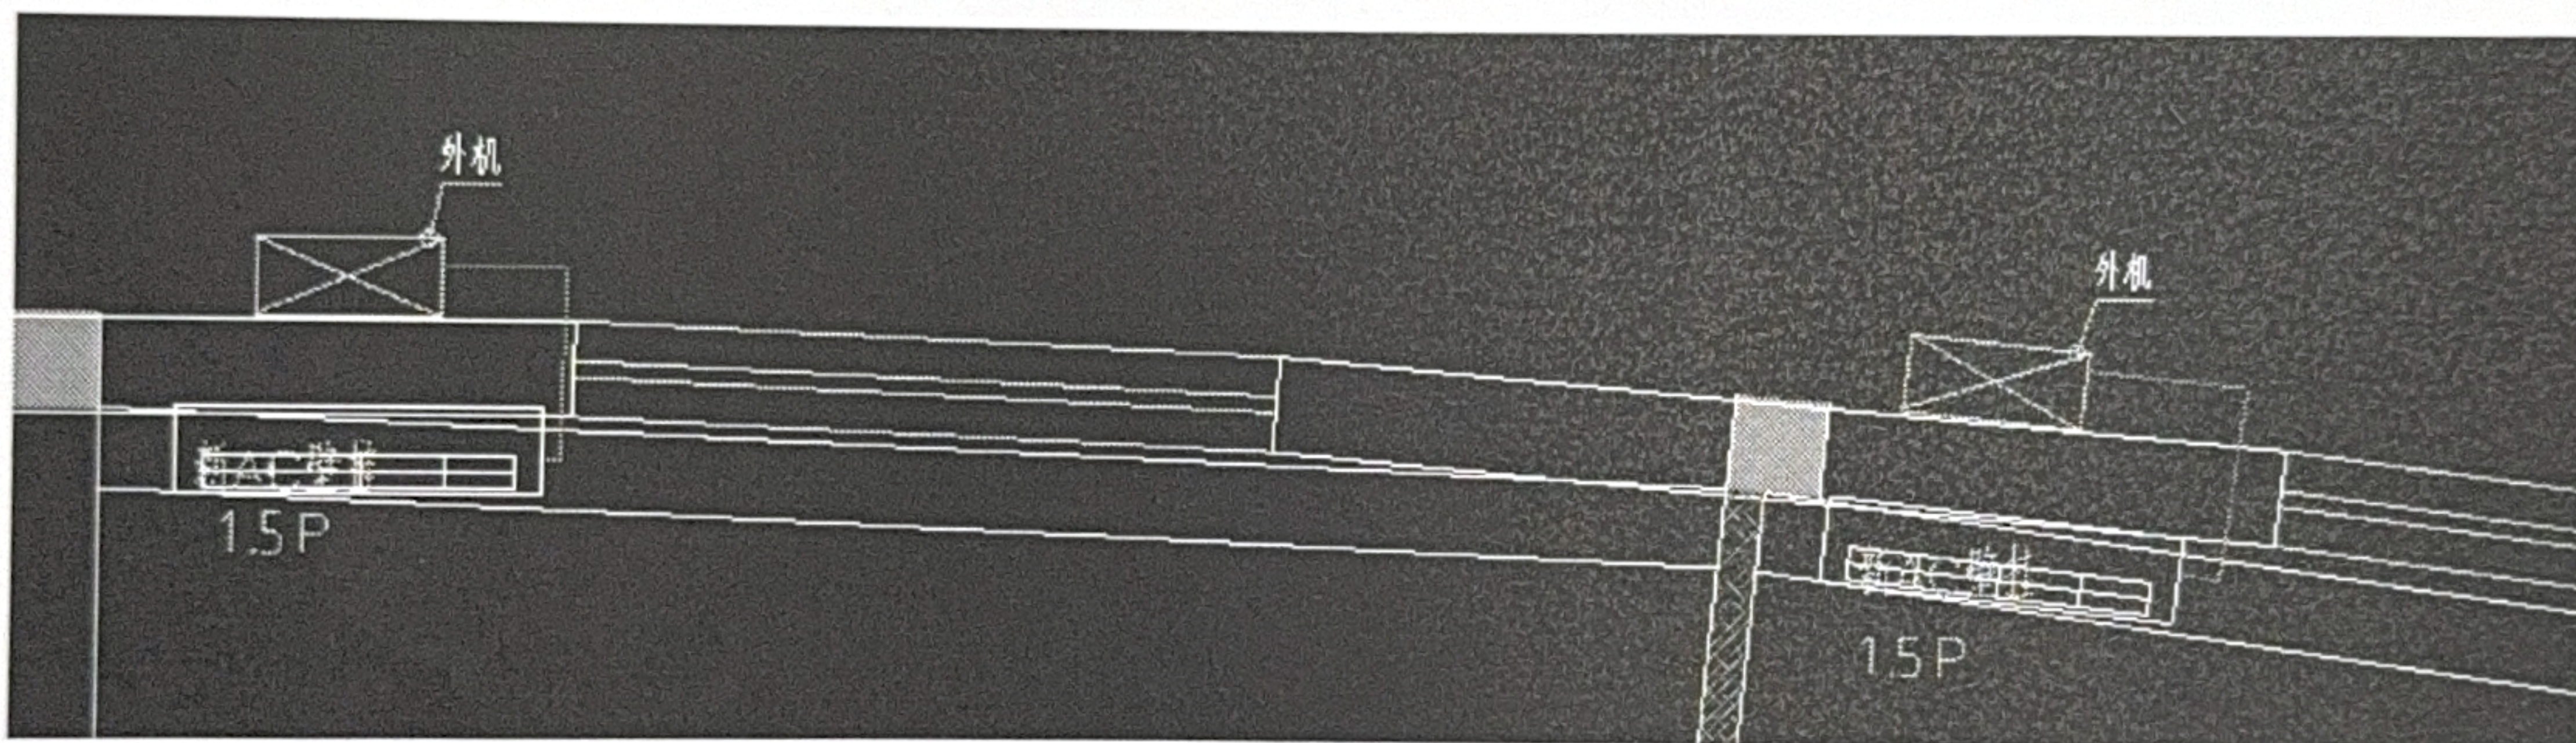

规格 6.35mm/12.7mm

5、空调部分是否需要考虑信号线，如考虑，规格为多少。
挂机信号线规格 RVVP-4*1 一般为随机标配

6、排水管与给水管是否接至原有给排水立管。
是

7、卫生洁具图上标注的是否需要新做。
是

8、小便斗是否需要考虑感应器。
是

9、洗脸盆为冷水还是冷热水混合。
冷热水混合

10、蹲便器是否为脚踏式。
是

11、座便器水箱是什么样式的。

成品马桶带水箱

12、管线走墙是否需要开槽。

开槽处理

13、电梯井道要考虑底坑和顶层出屋面，这部分做砼结构，请设计明确下具体做法编入清单
已出


14、新做电梯需要的技术指标、参数、品牌等信息，便于询价
已出

15、主材的材料品牌、规格，型号等信息的物料表有吗
已出

16、室外地面材料平面图是地砖、剖面图是石材，哪个为准？
剖面图为准

17、室外哪些区域做扶手？

如图

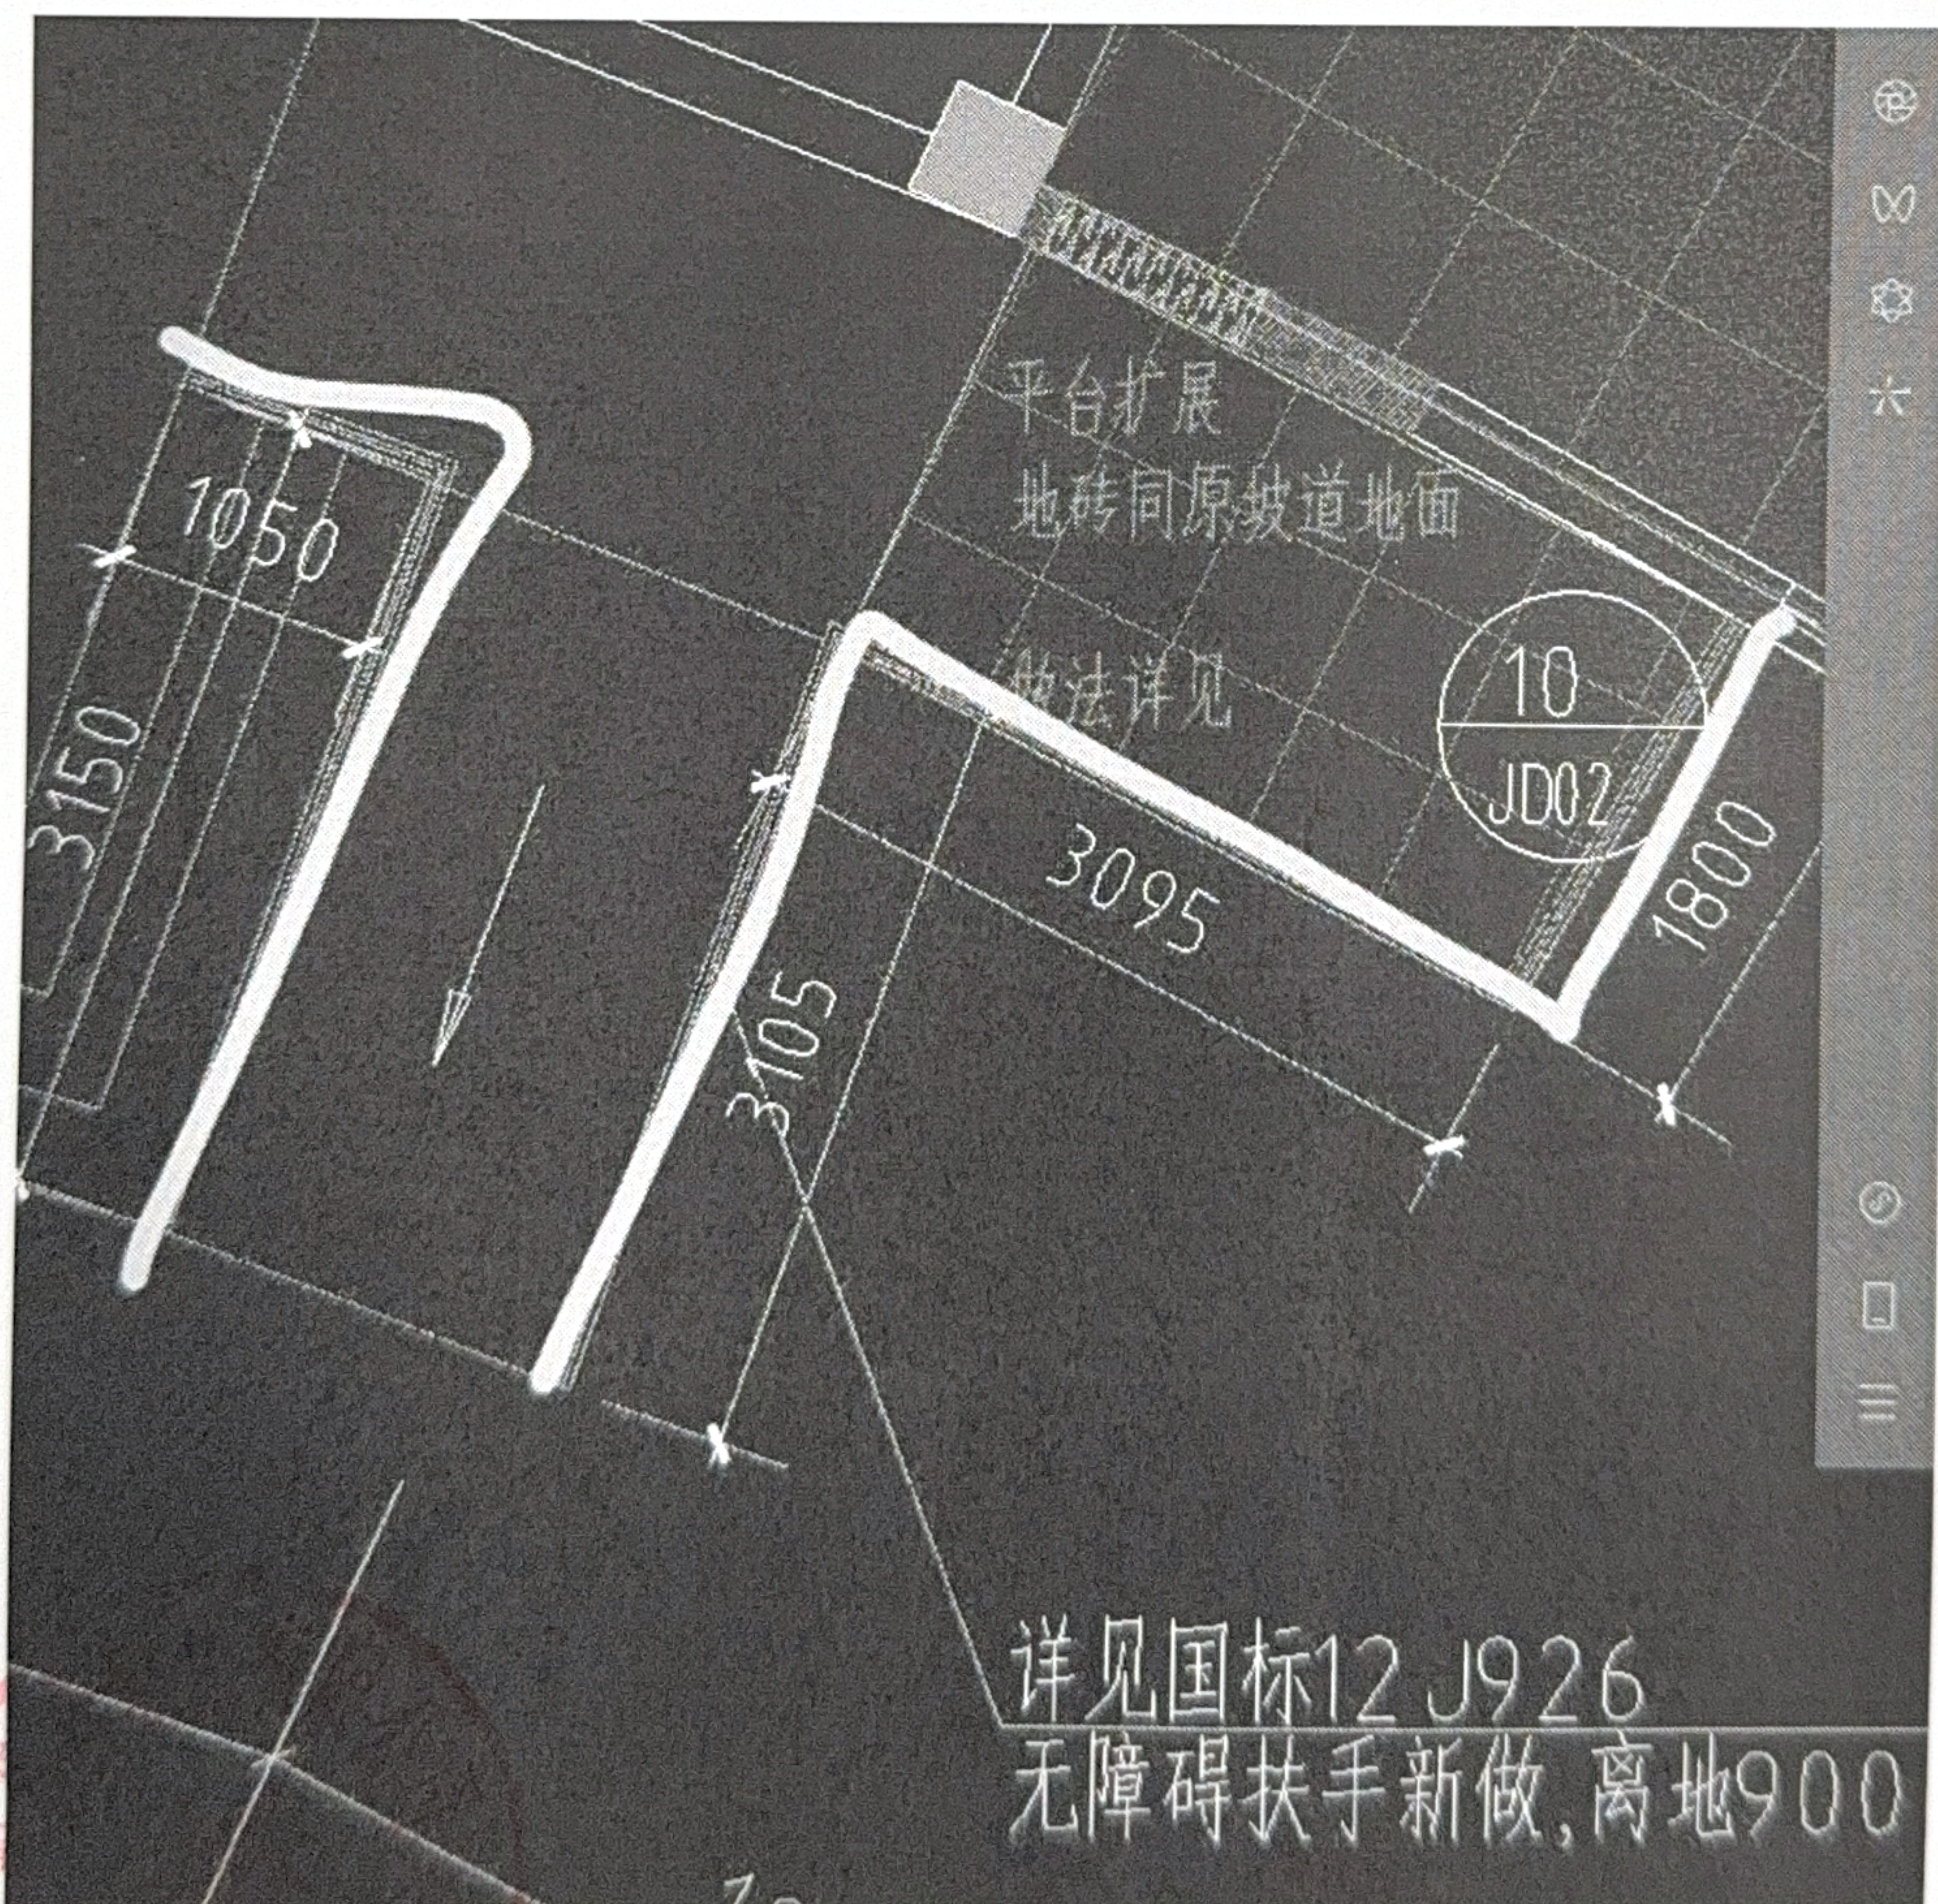

18、无机涂料按几遍考虑？腻子按几遍考虑？

腻子 2 遍，无机三遍

19、原墙面涂料是否需要铲除？

需要

20、设计说明中轻钢龙骨吊顶做法与剖面图不一致，以哪个为准？

节点有标注的按照节点，没有标注的按说明

21、砂浆是否都统一按预拌干混砂浆？


可以

22、厨房墙面是否需要做？具体做法？砖规格厚度？CT04 墙砖 300*600*12

1. 300*600墙面砖到顶，白水泥擦缝
2. 专用胶粘结层
3. 2厚JS II 型聚合物防水涂料300mm高
4. 12厚DPM10水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
5. 墙体不同材料交界处加订耐碱网格布，沿缝居中宽500

燃烧性能等级：A


23、请铝方通吊顶是直接固定在轻钢龙骨上吗？原顶需要刷涂料吗？

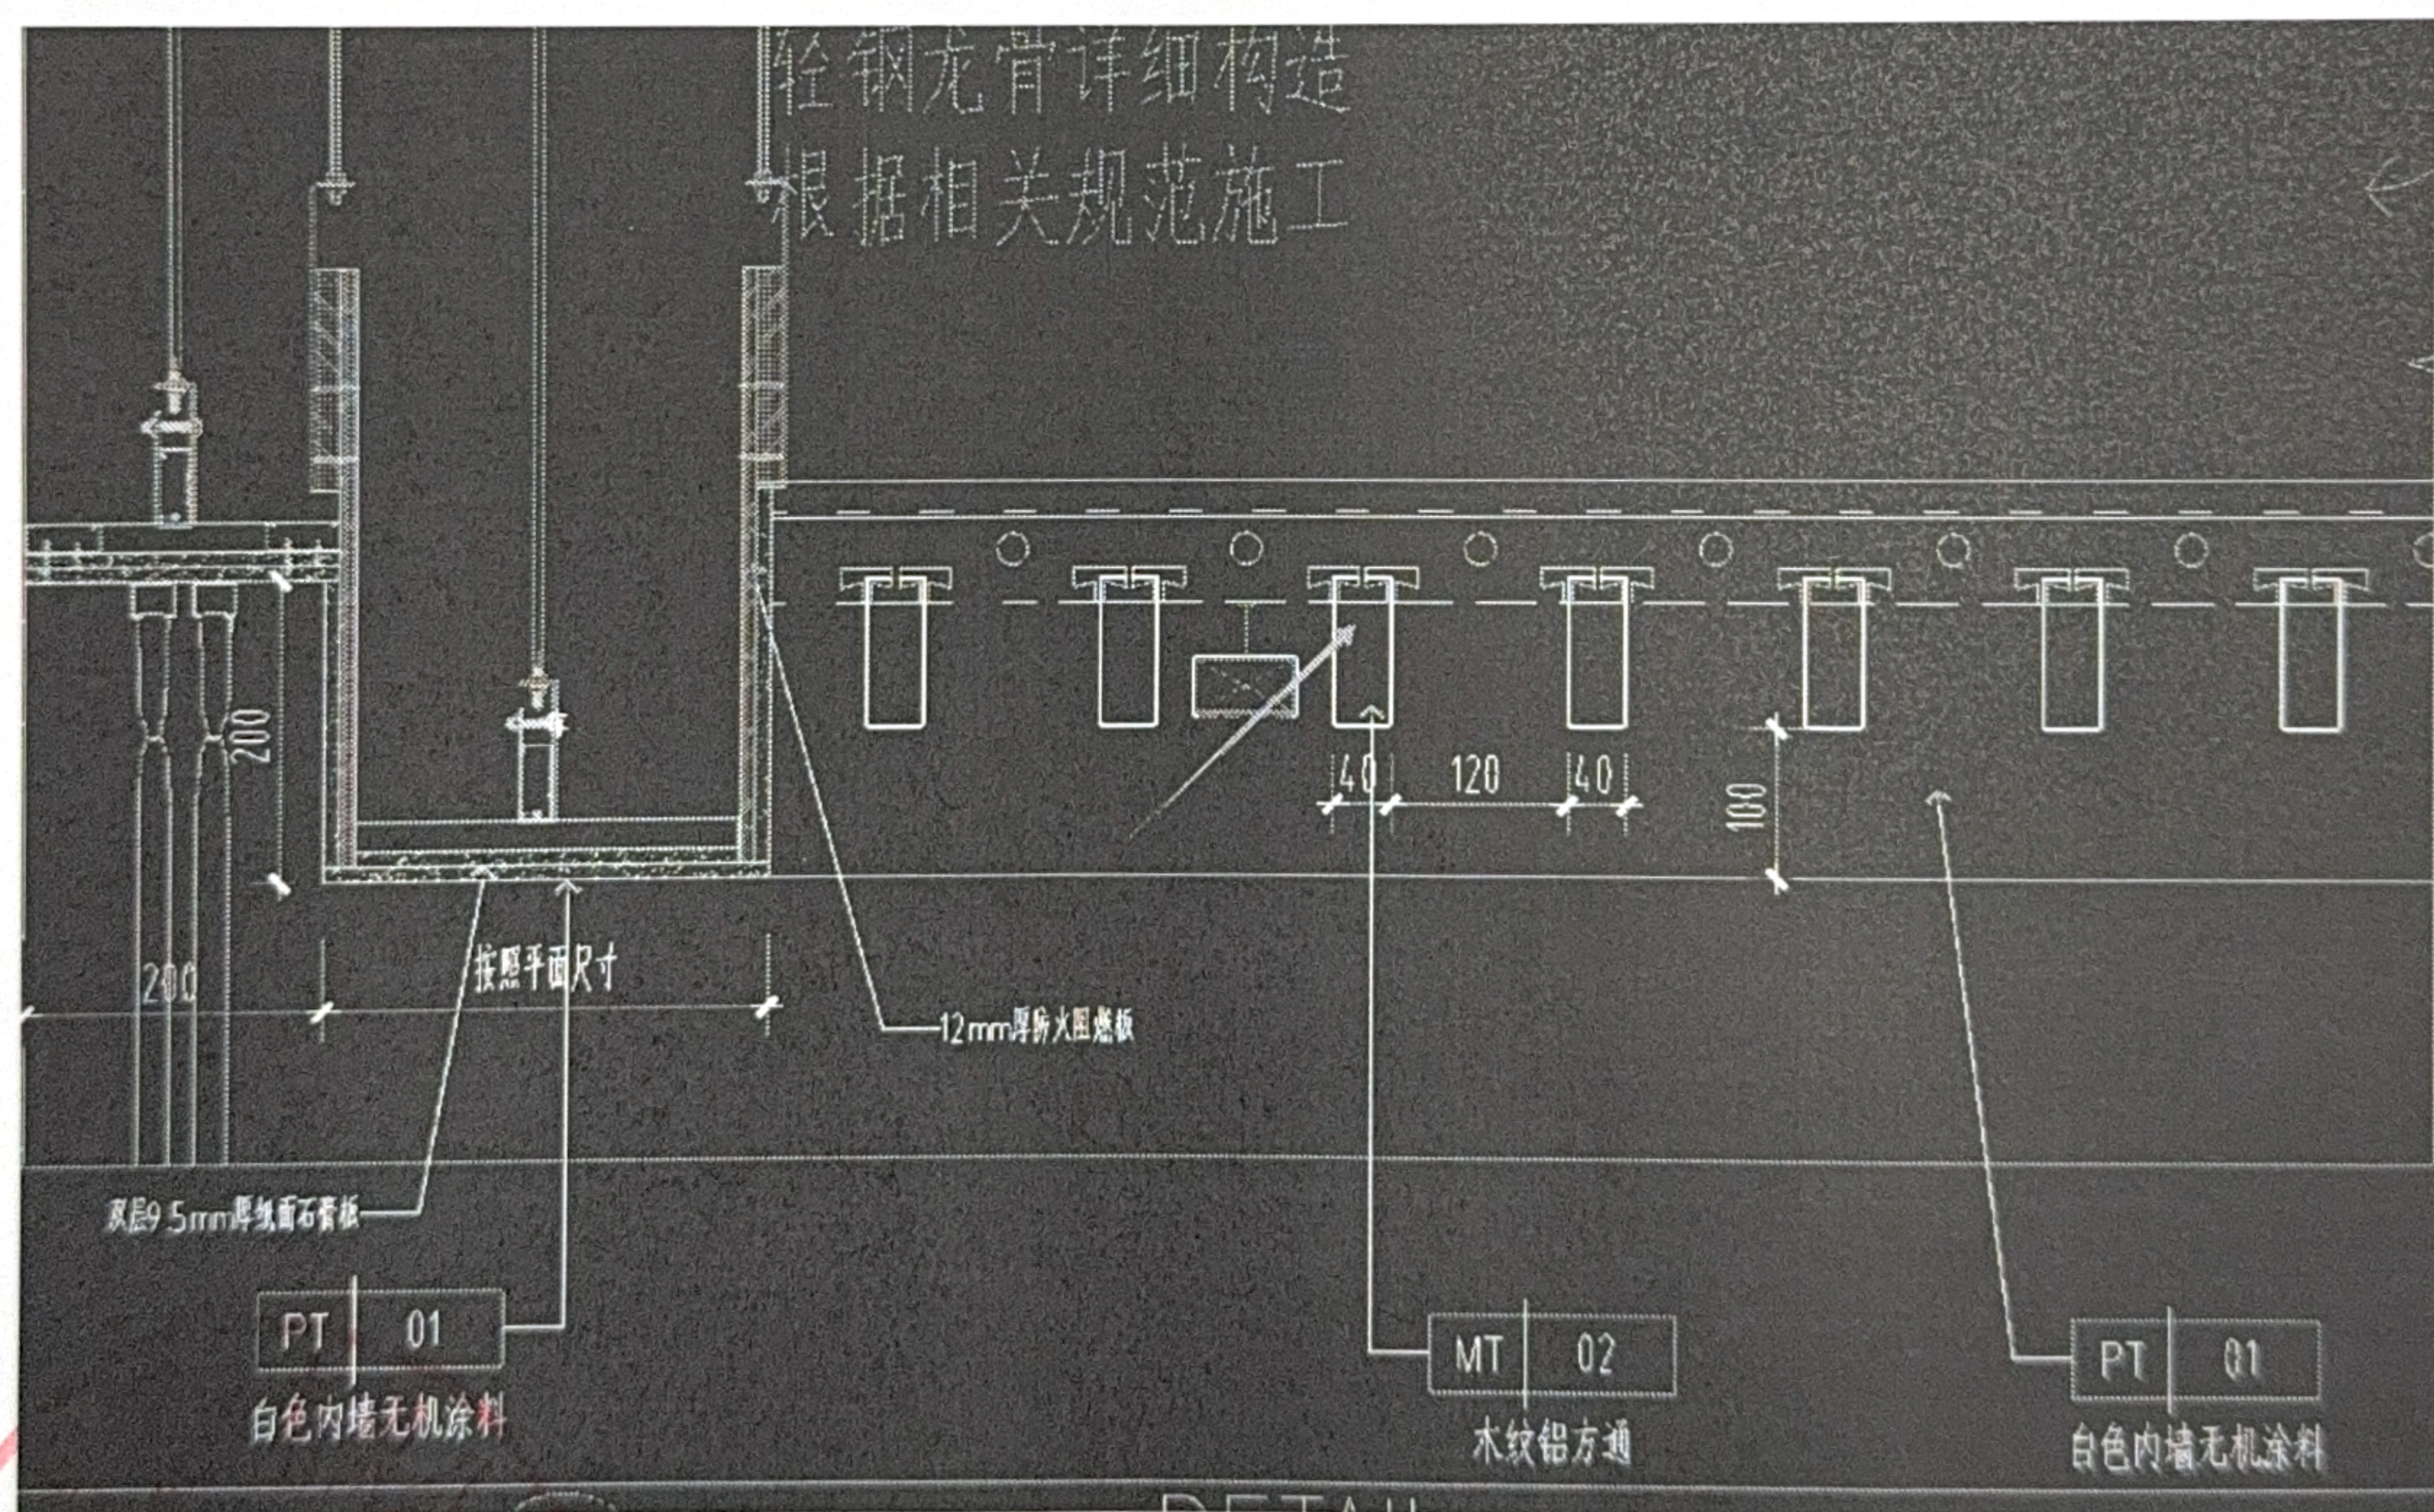

是的，原顶刷白

24、打菜台广告灯箱包含在本次预算内吗？

不包含

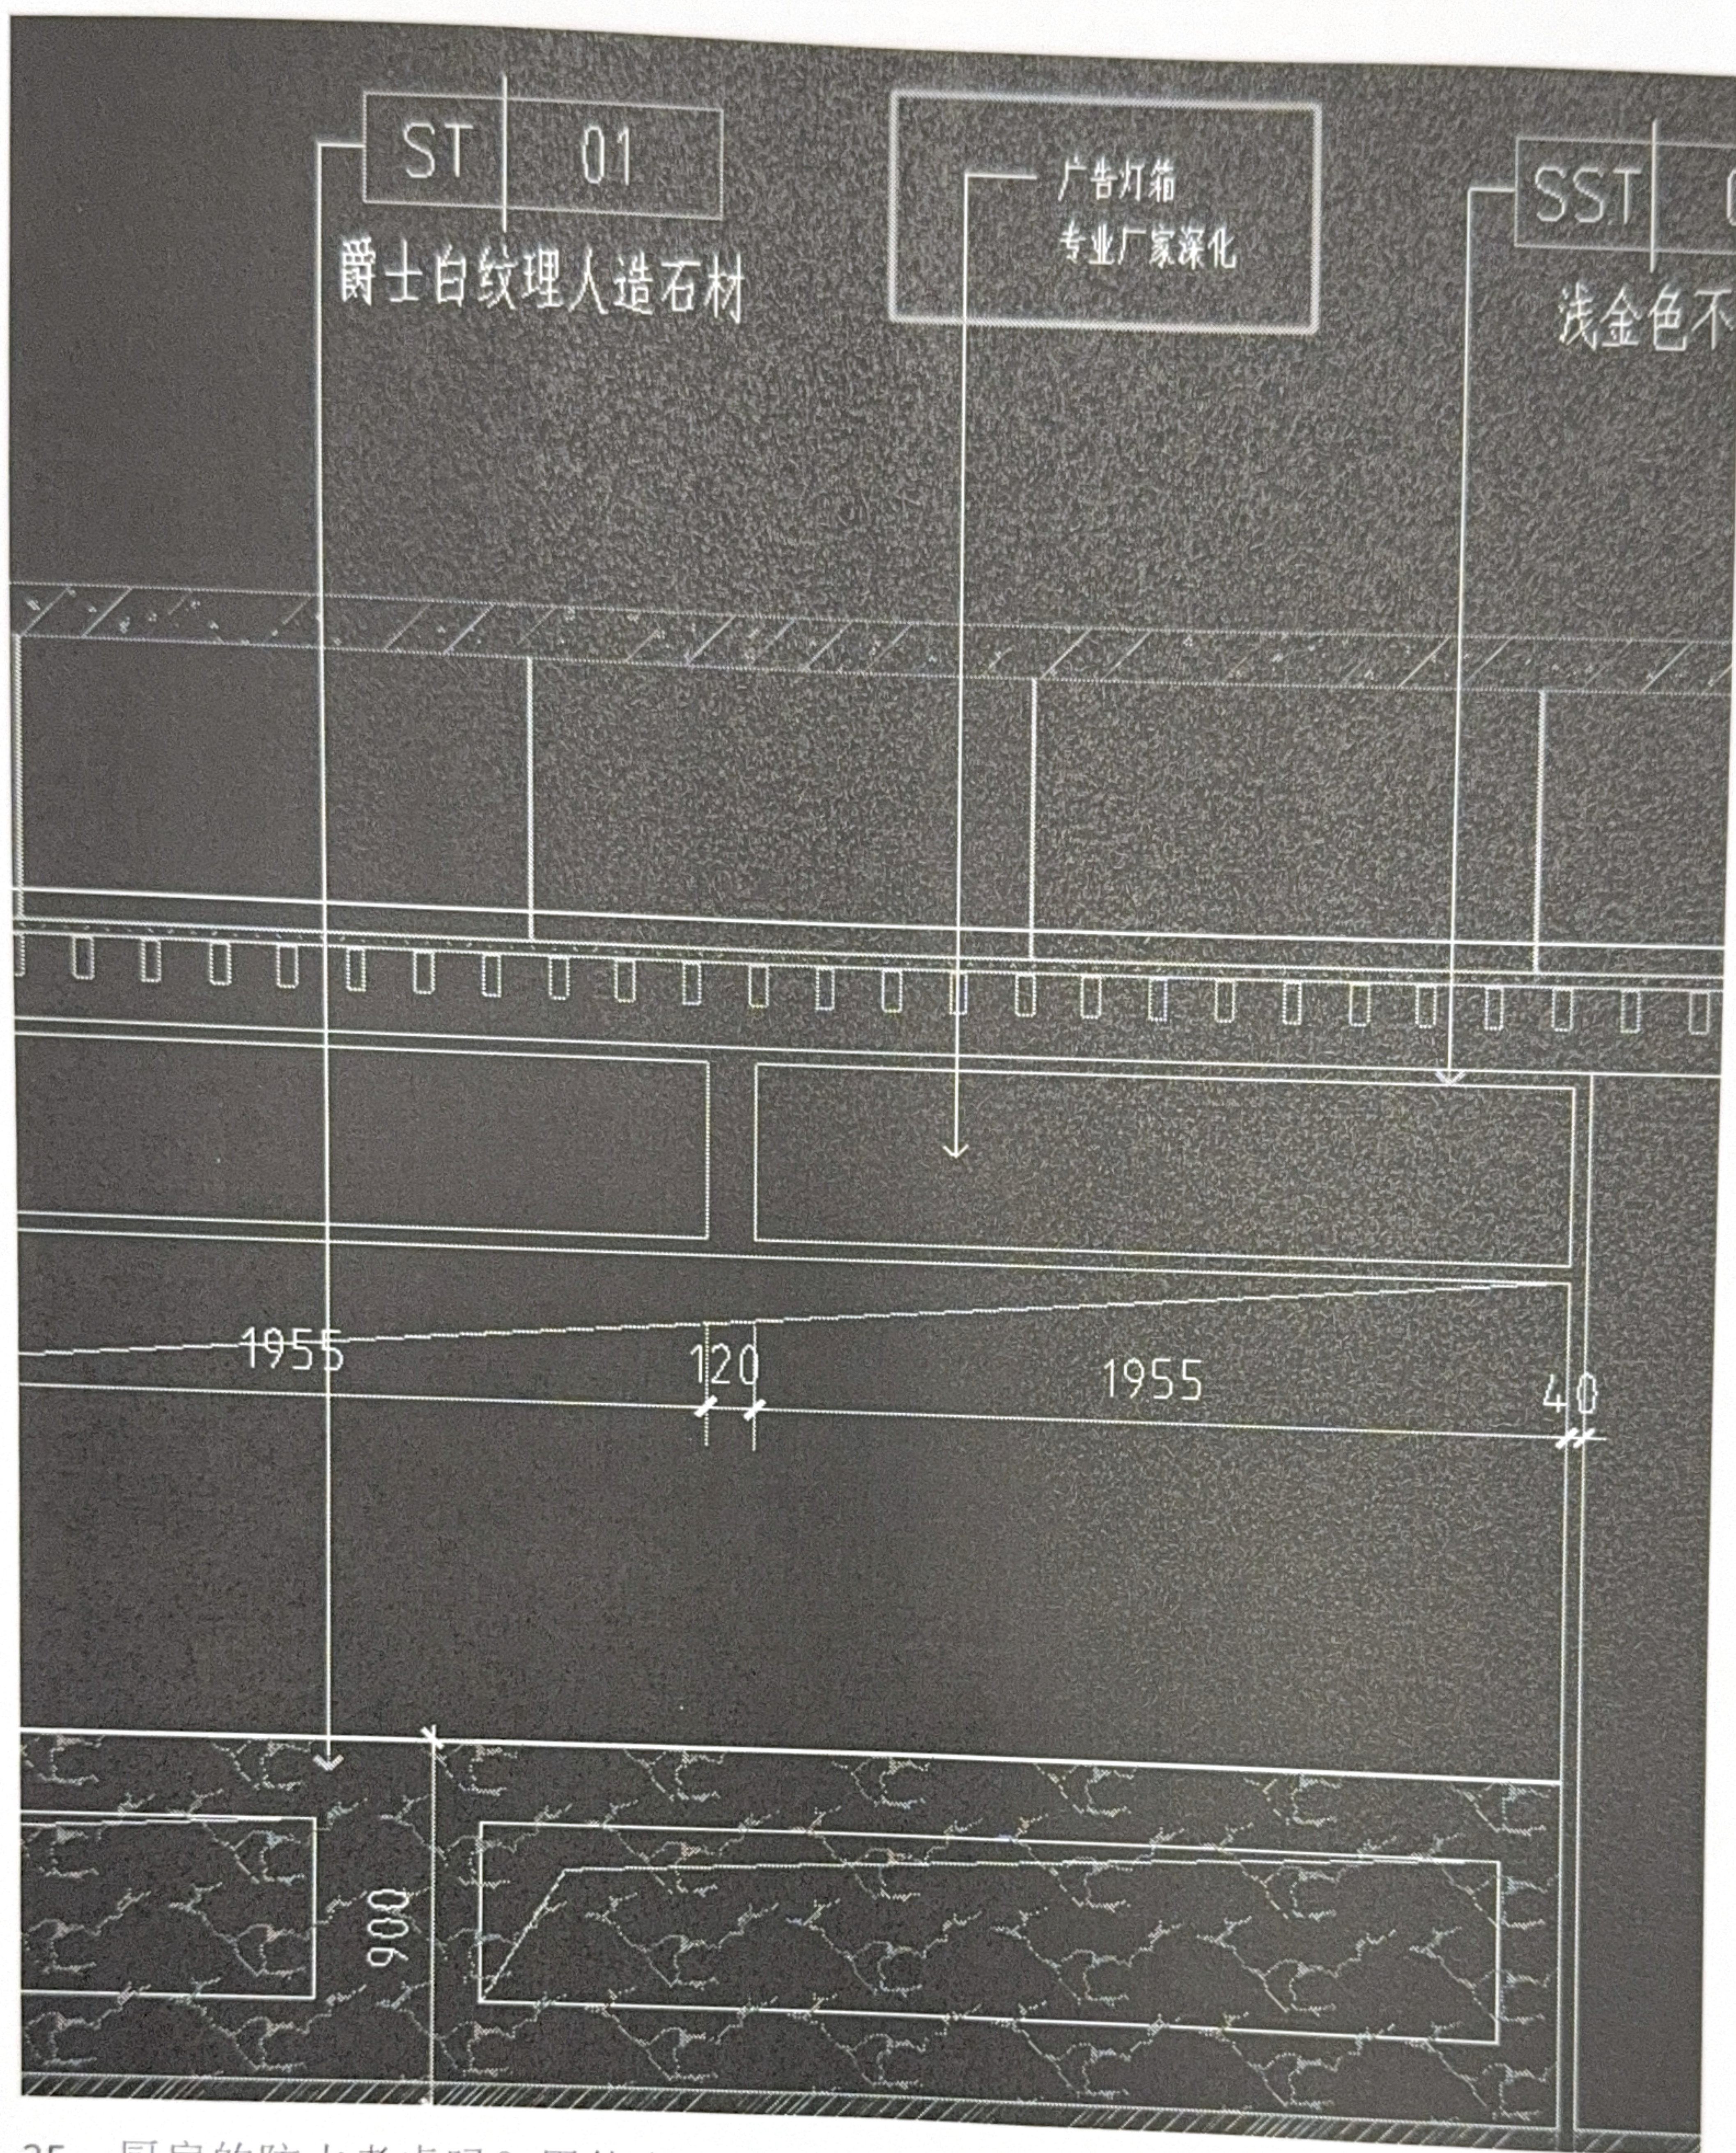

25、厨房的防水考虑吗？用什么防水卷材？做多高？

墙

面


做

法



1. 300*600墙面砖到顶，白水泥擦缝
2. 专用胶粘结层
3. 2厚JS II 型聚合物防水涂料300mm高
4. 12厚DPM10水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
5. 墙体不同材料交界处加订耐碱网格布，沿缝居中宽500


地面-排水沟如下

燃烧性能等级：A

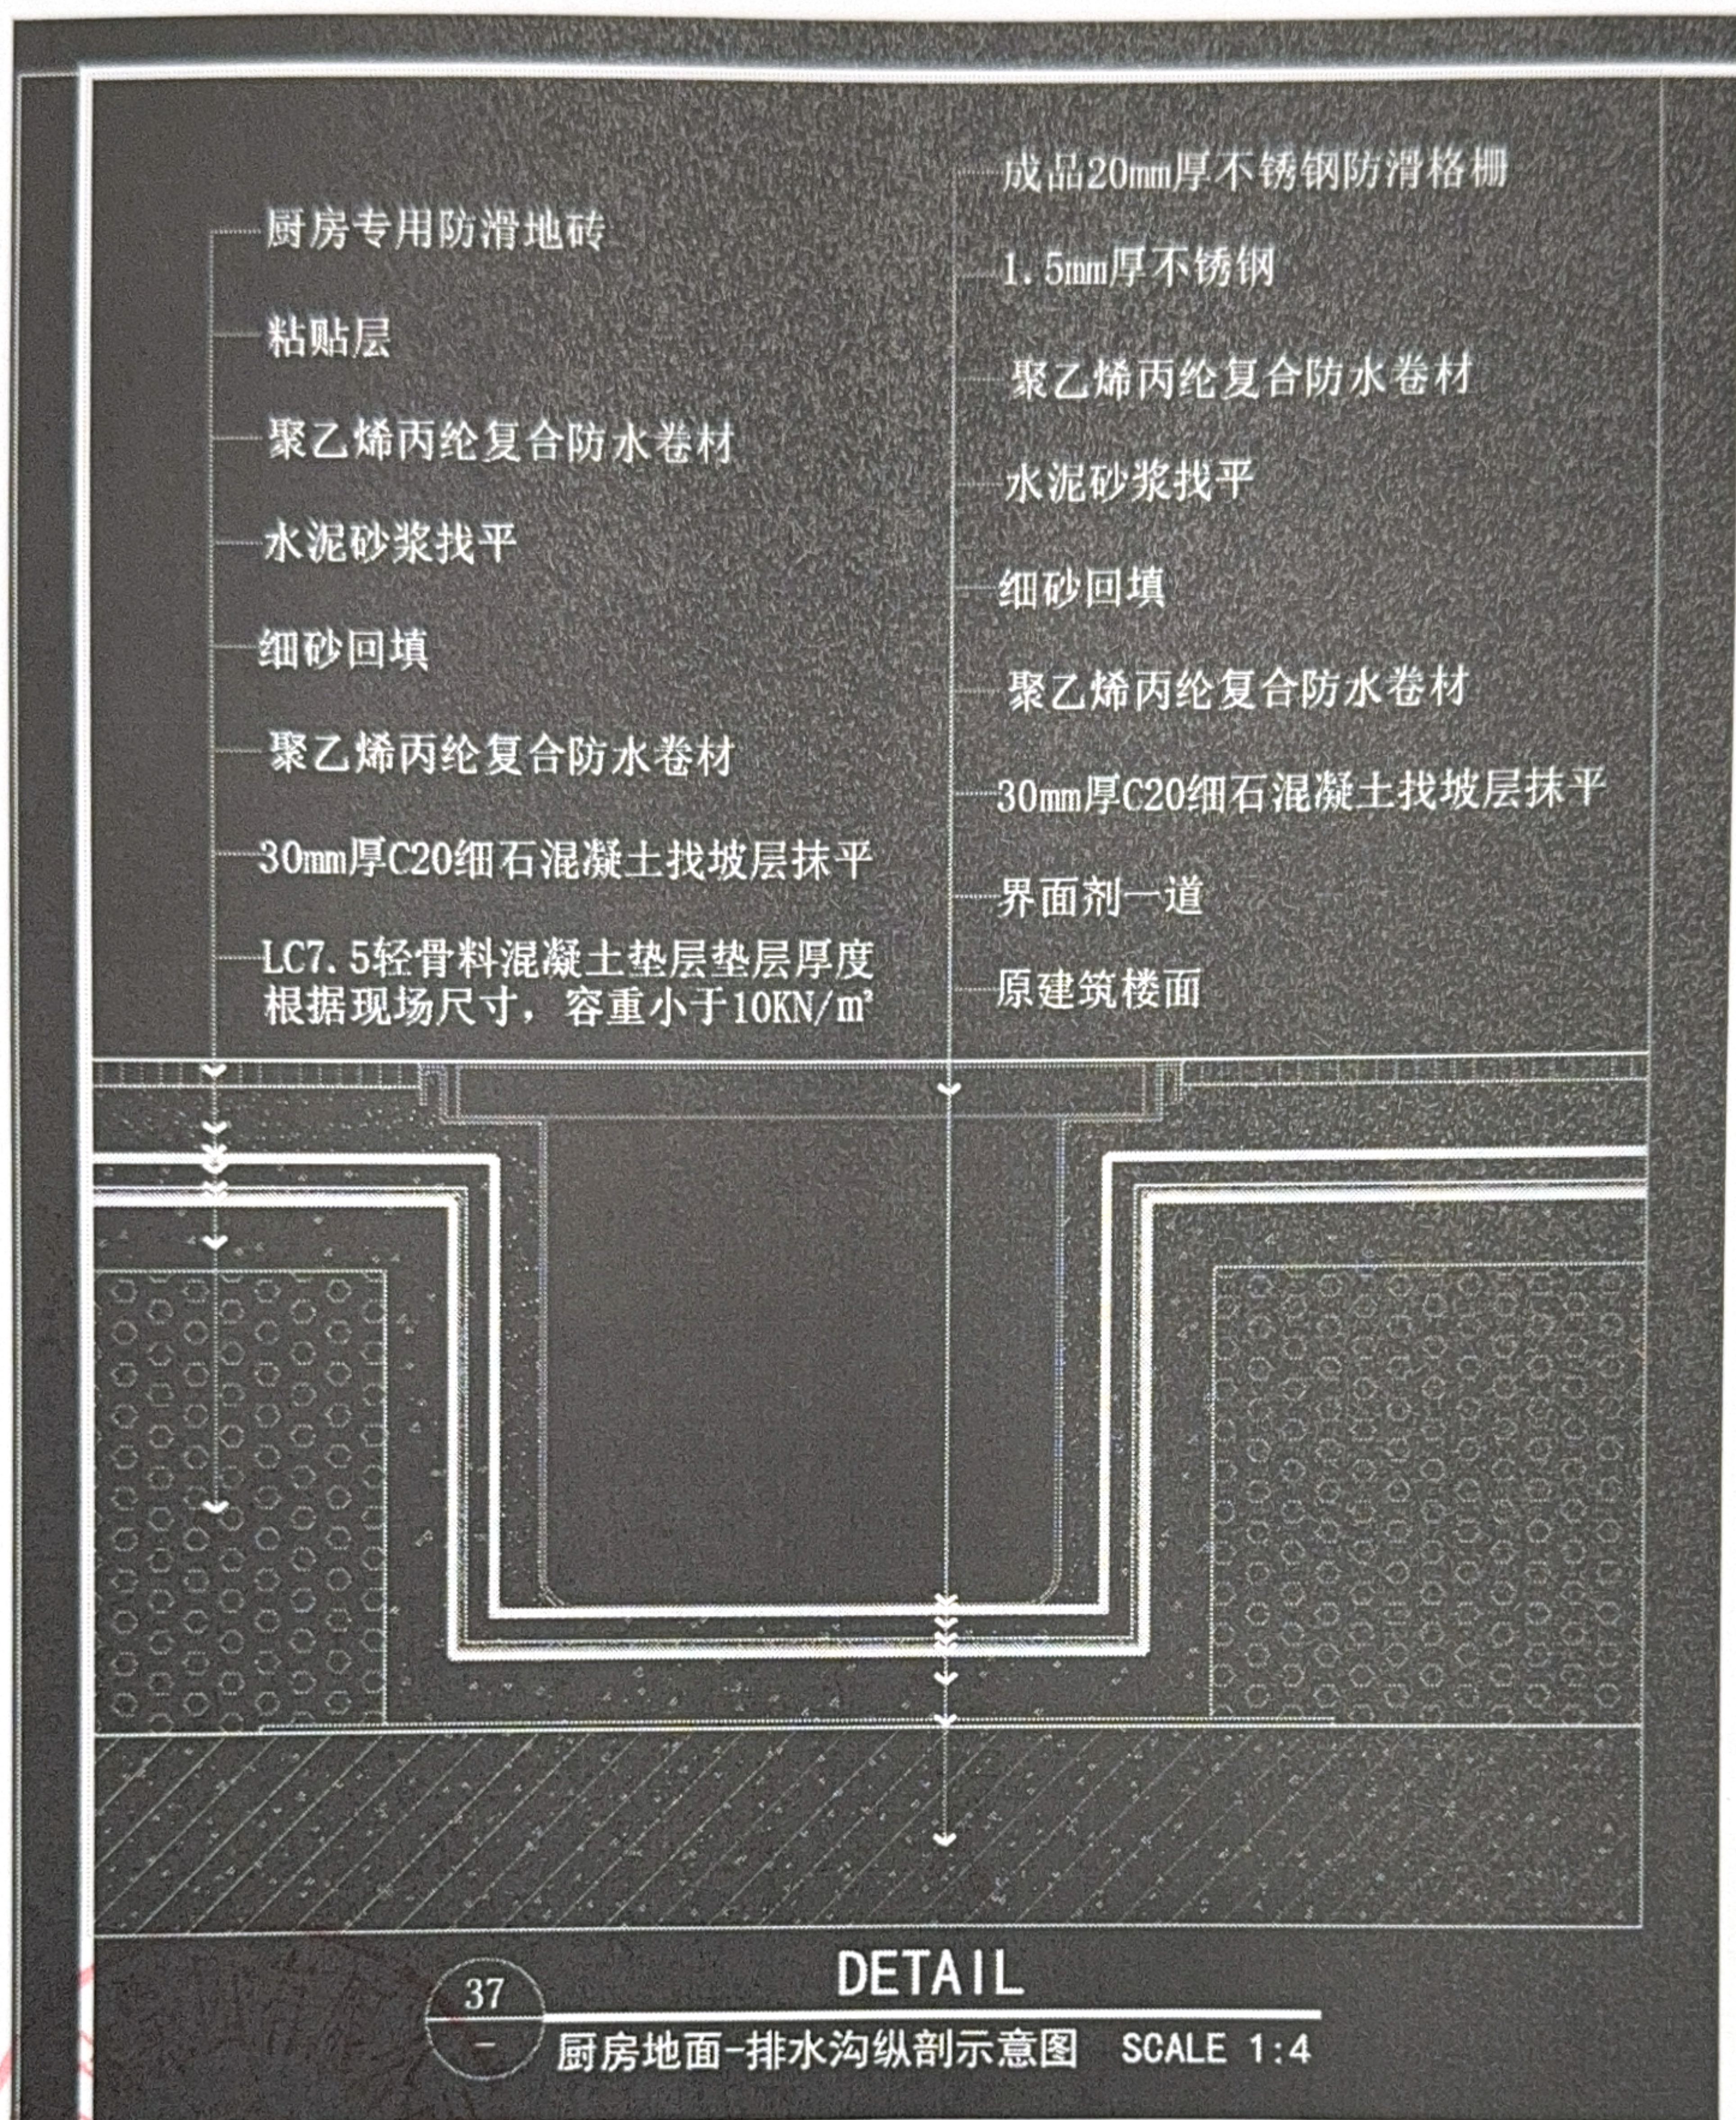


手 请 提 供 图 纸 或 者 照 片

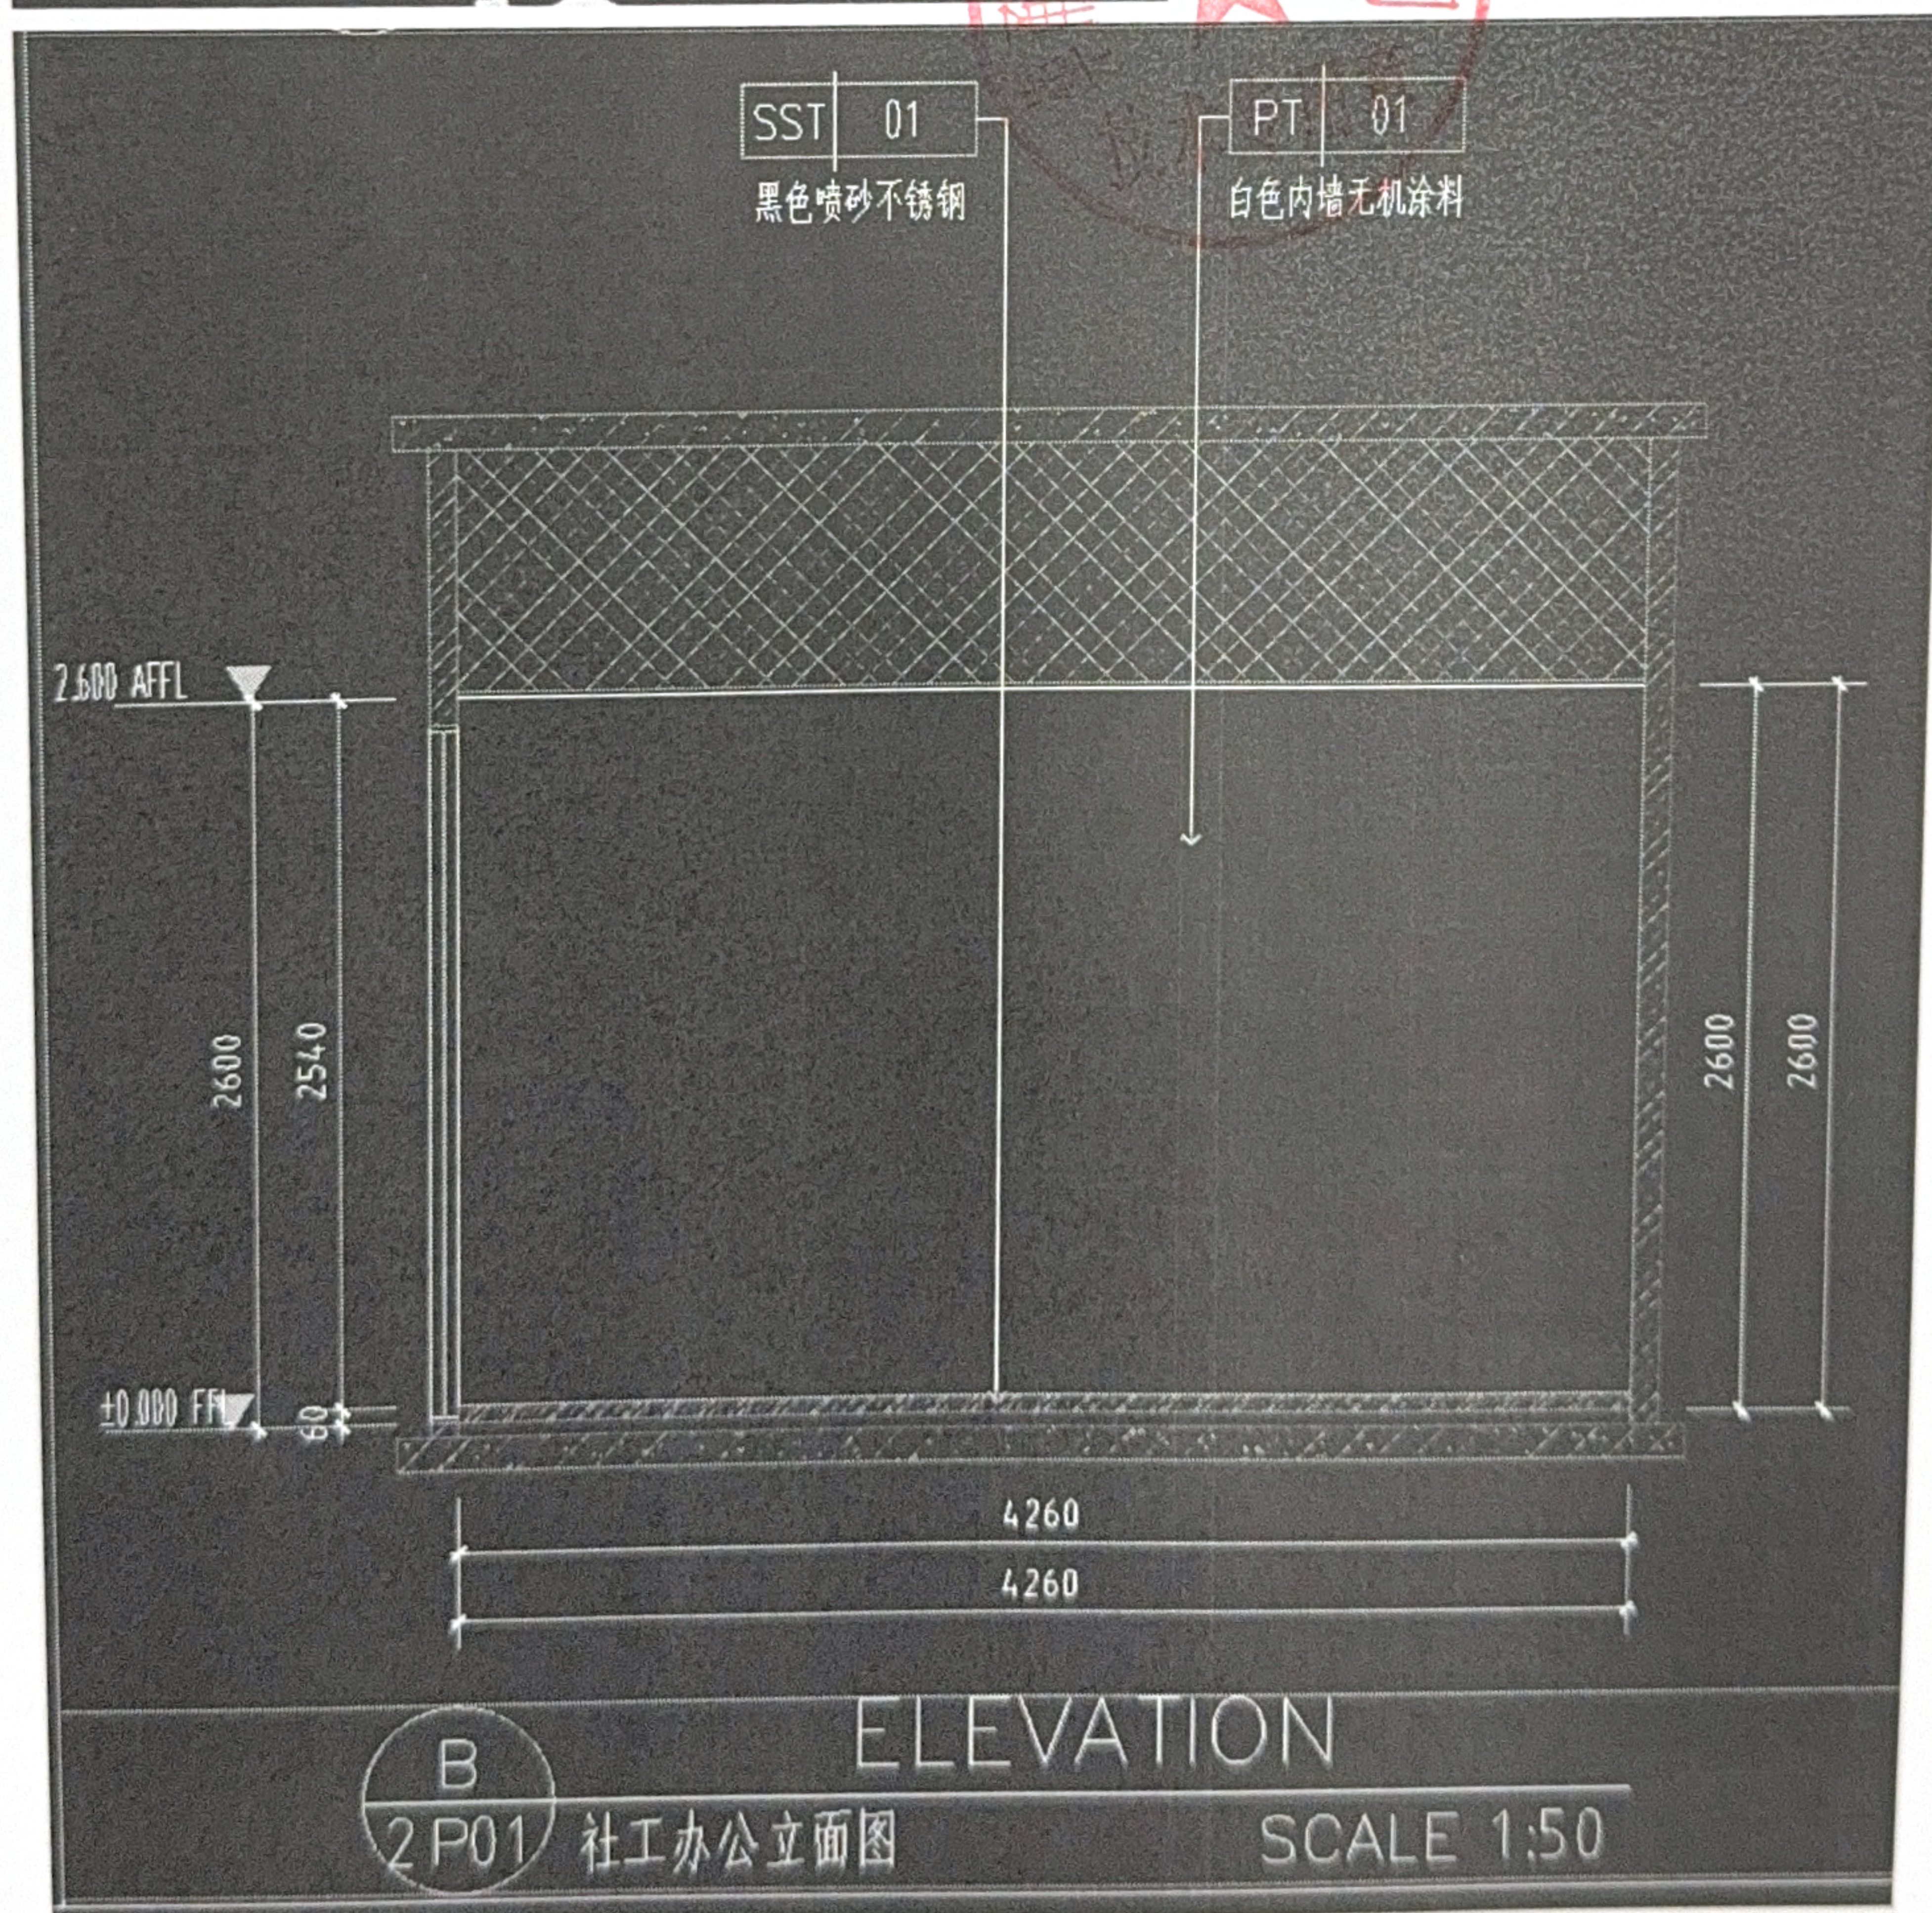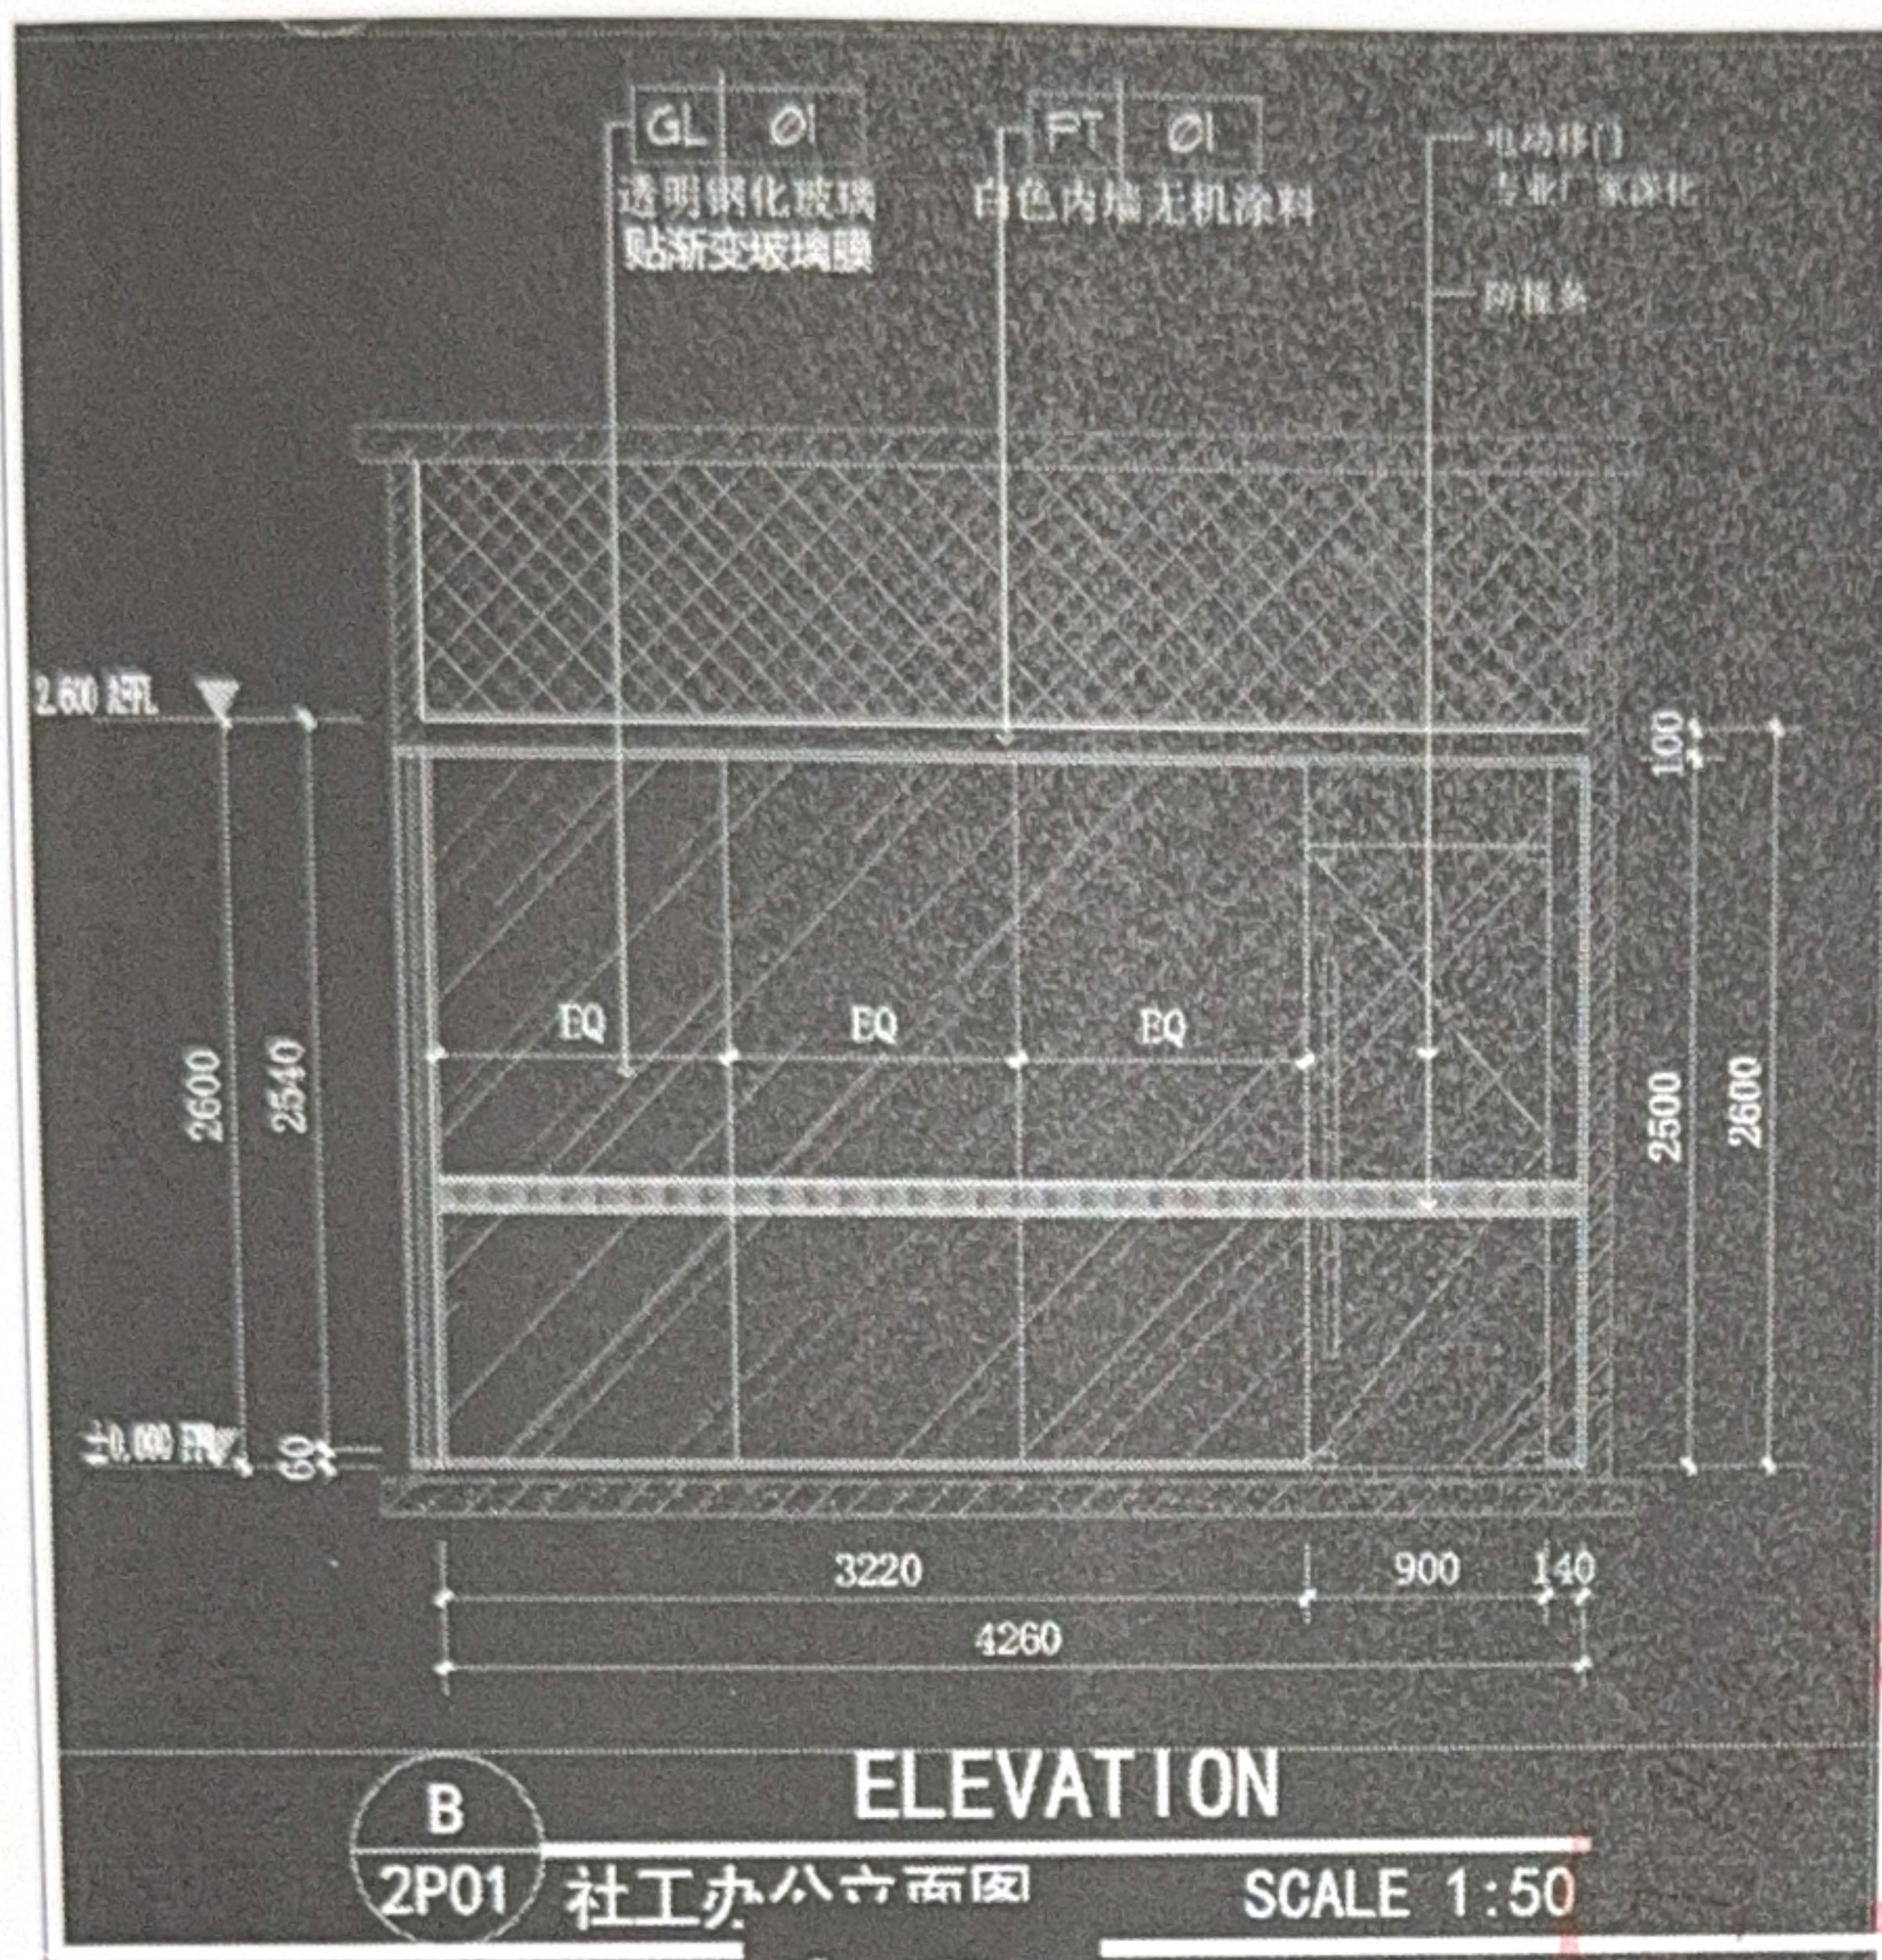


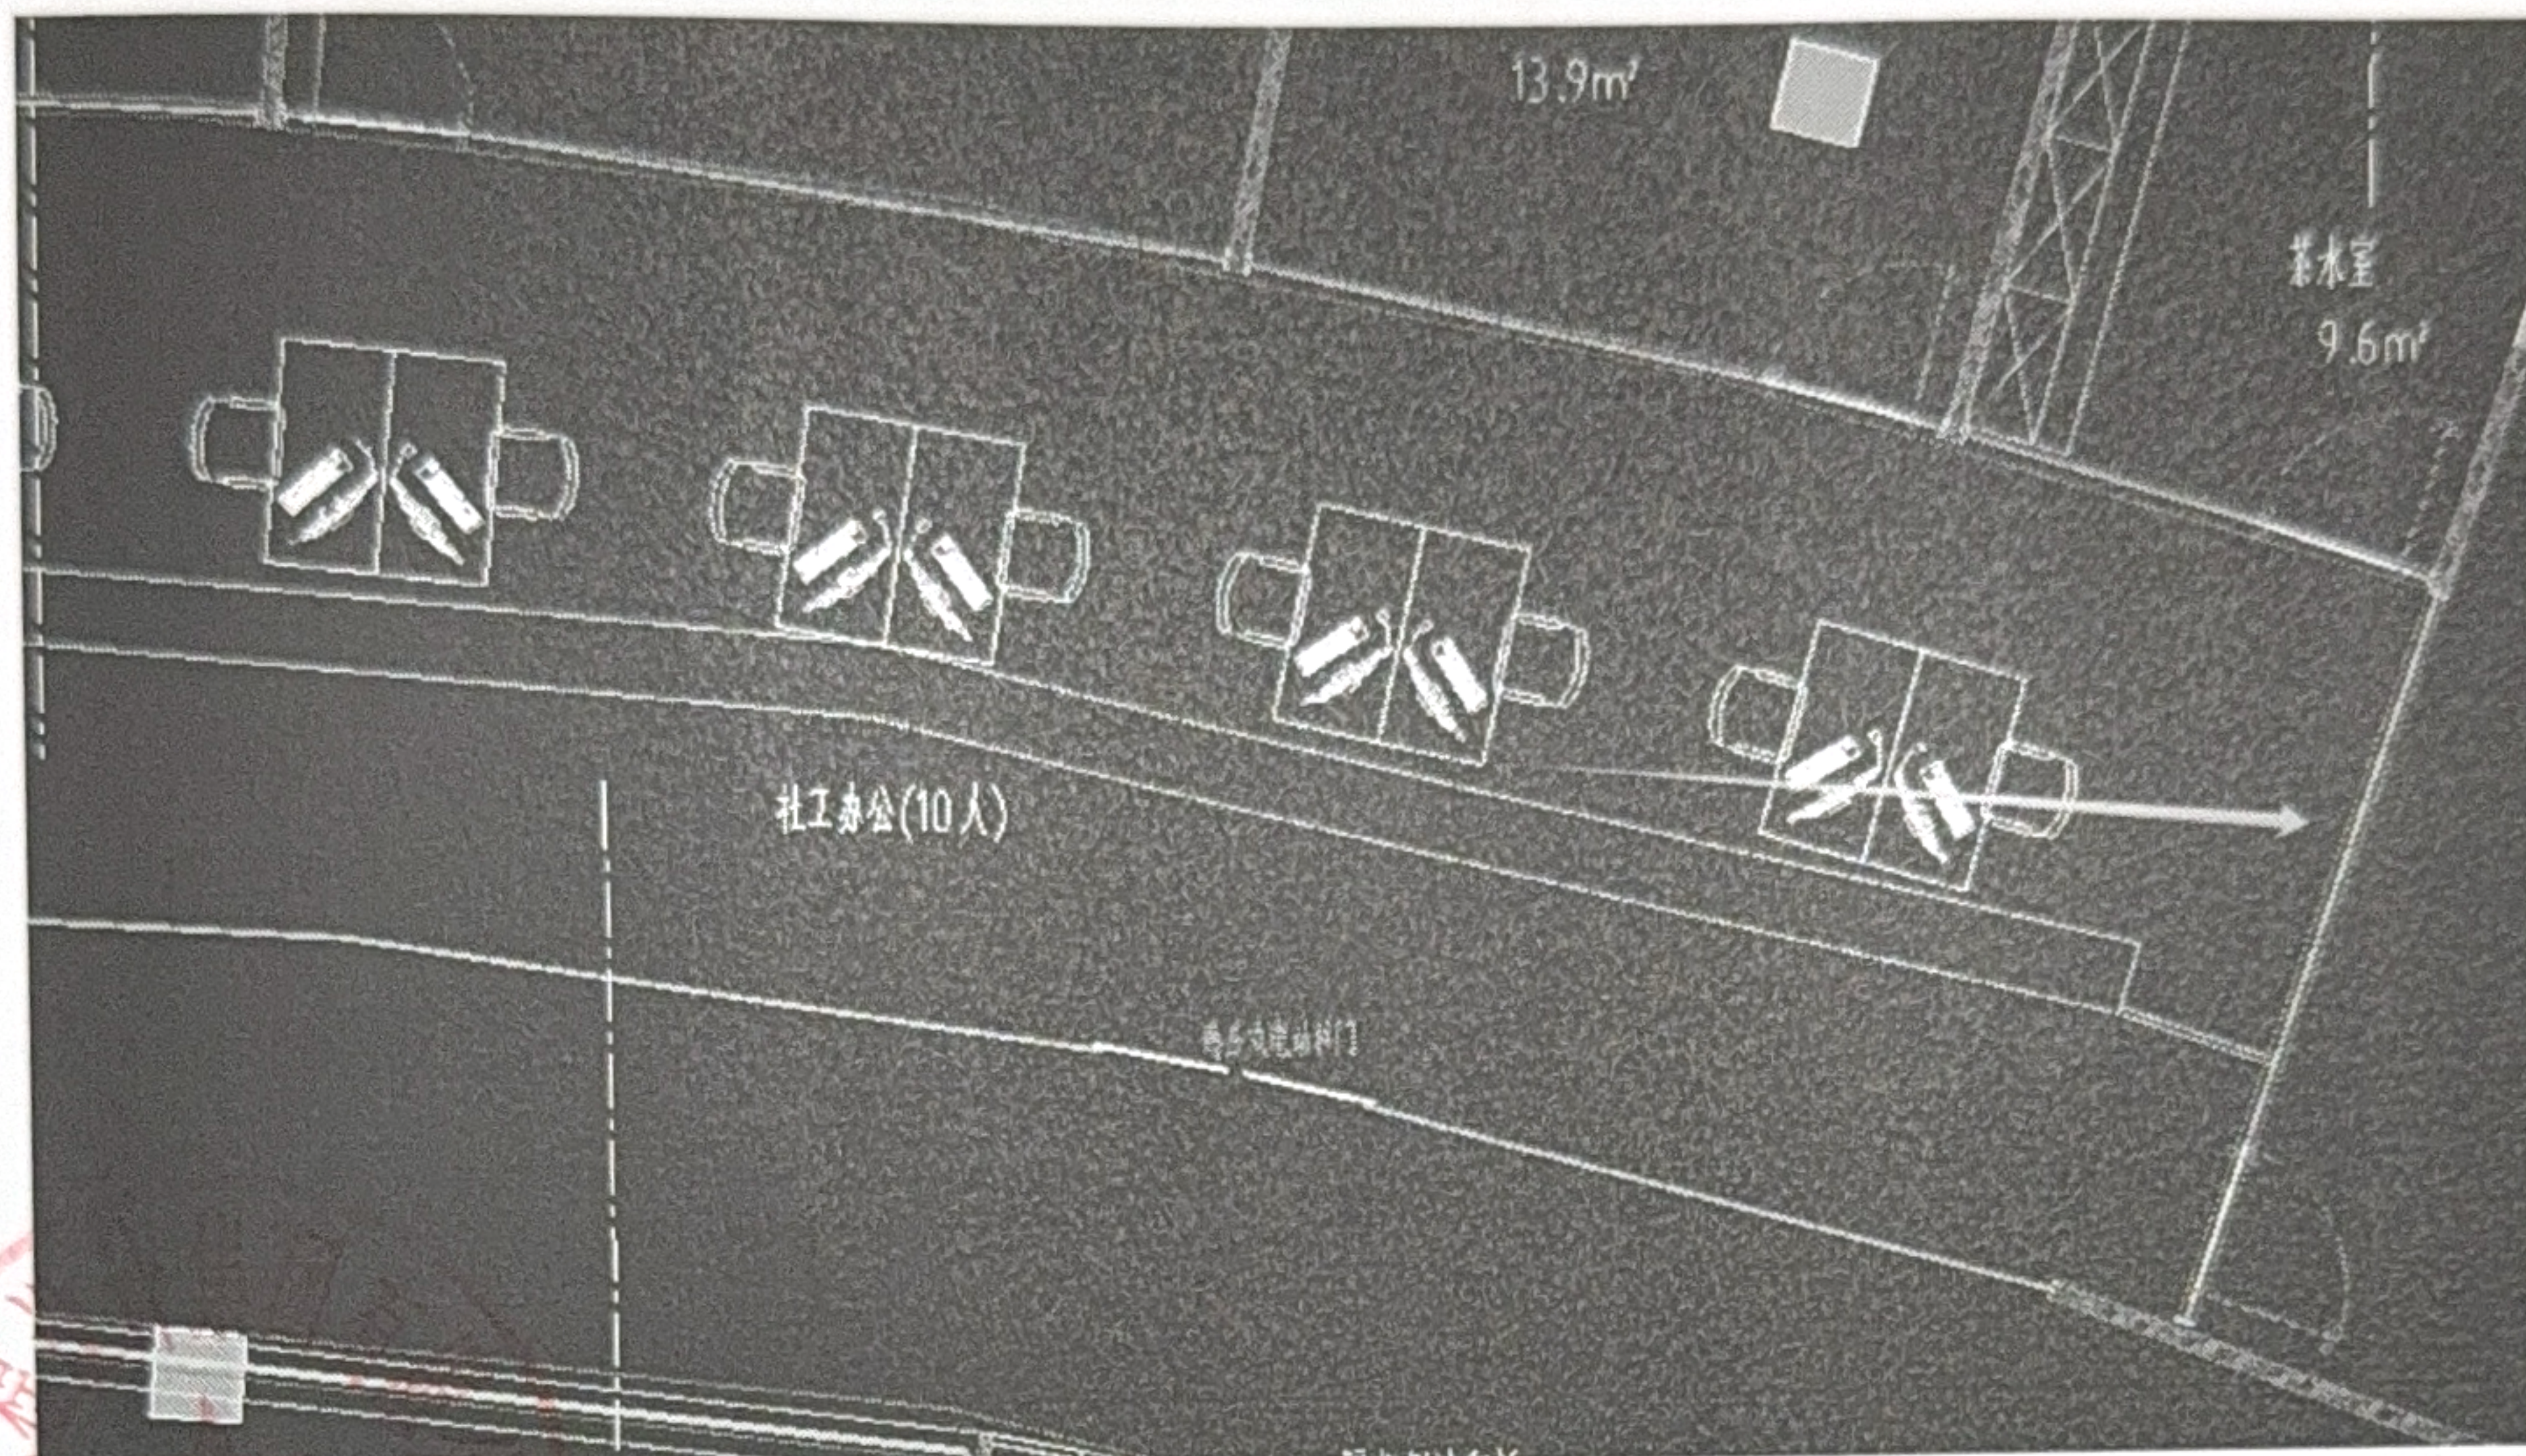



28、四层文体多功能室，地板下面的抬高，基层请明确

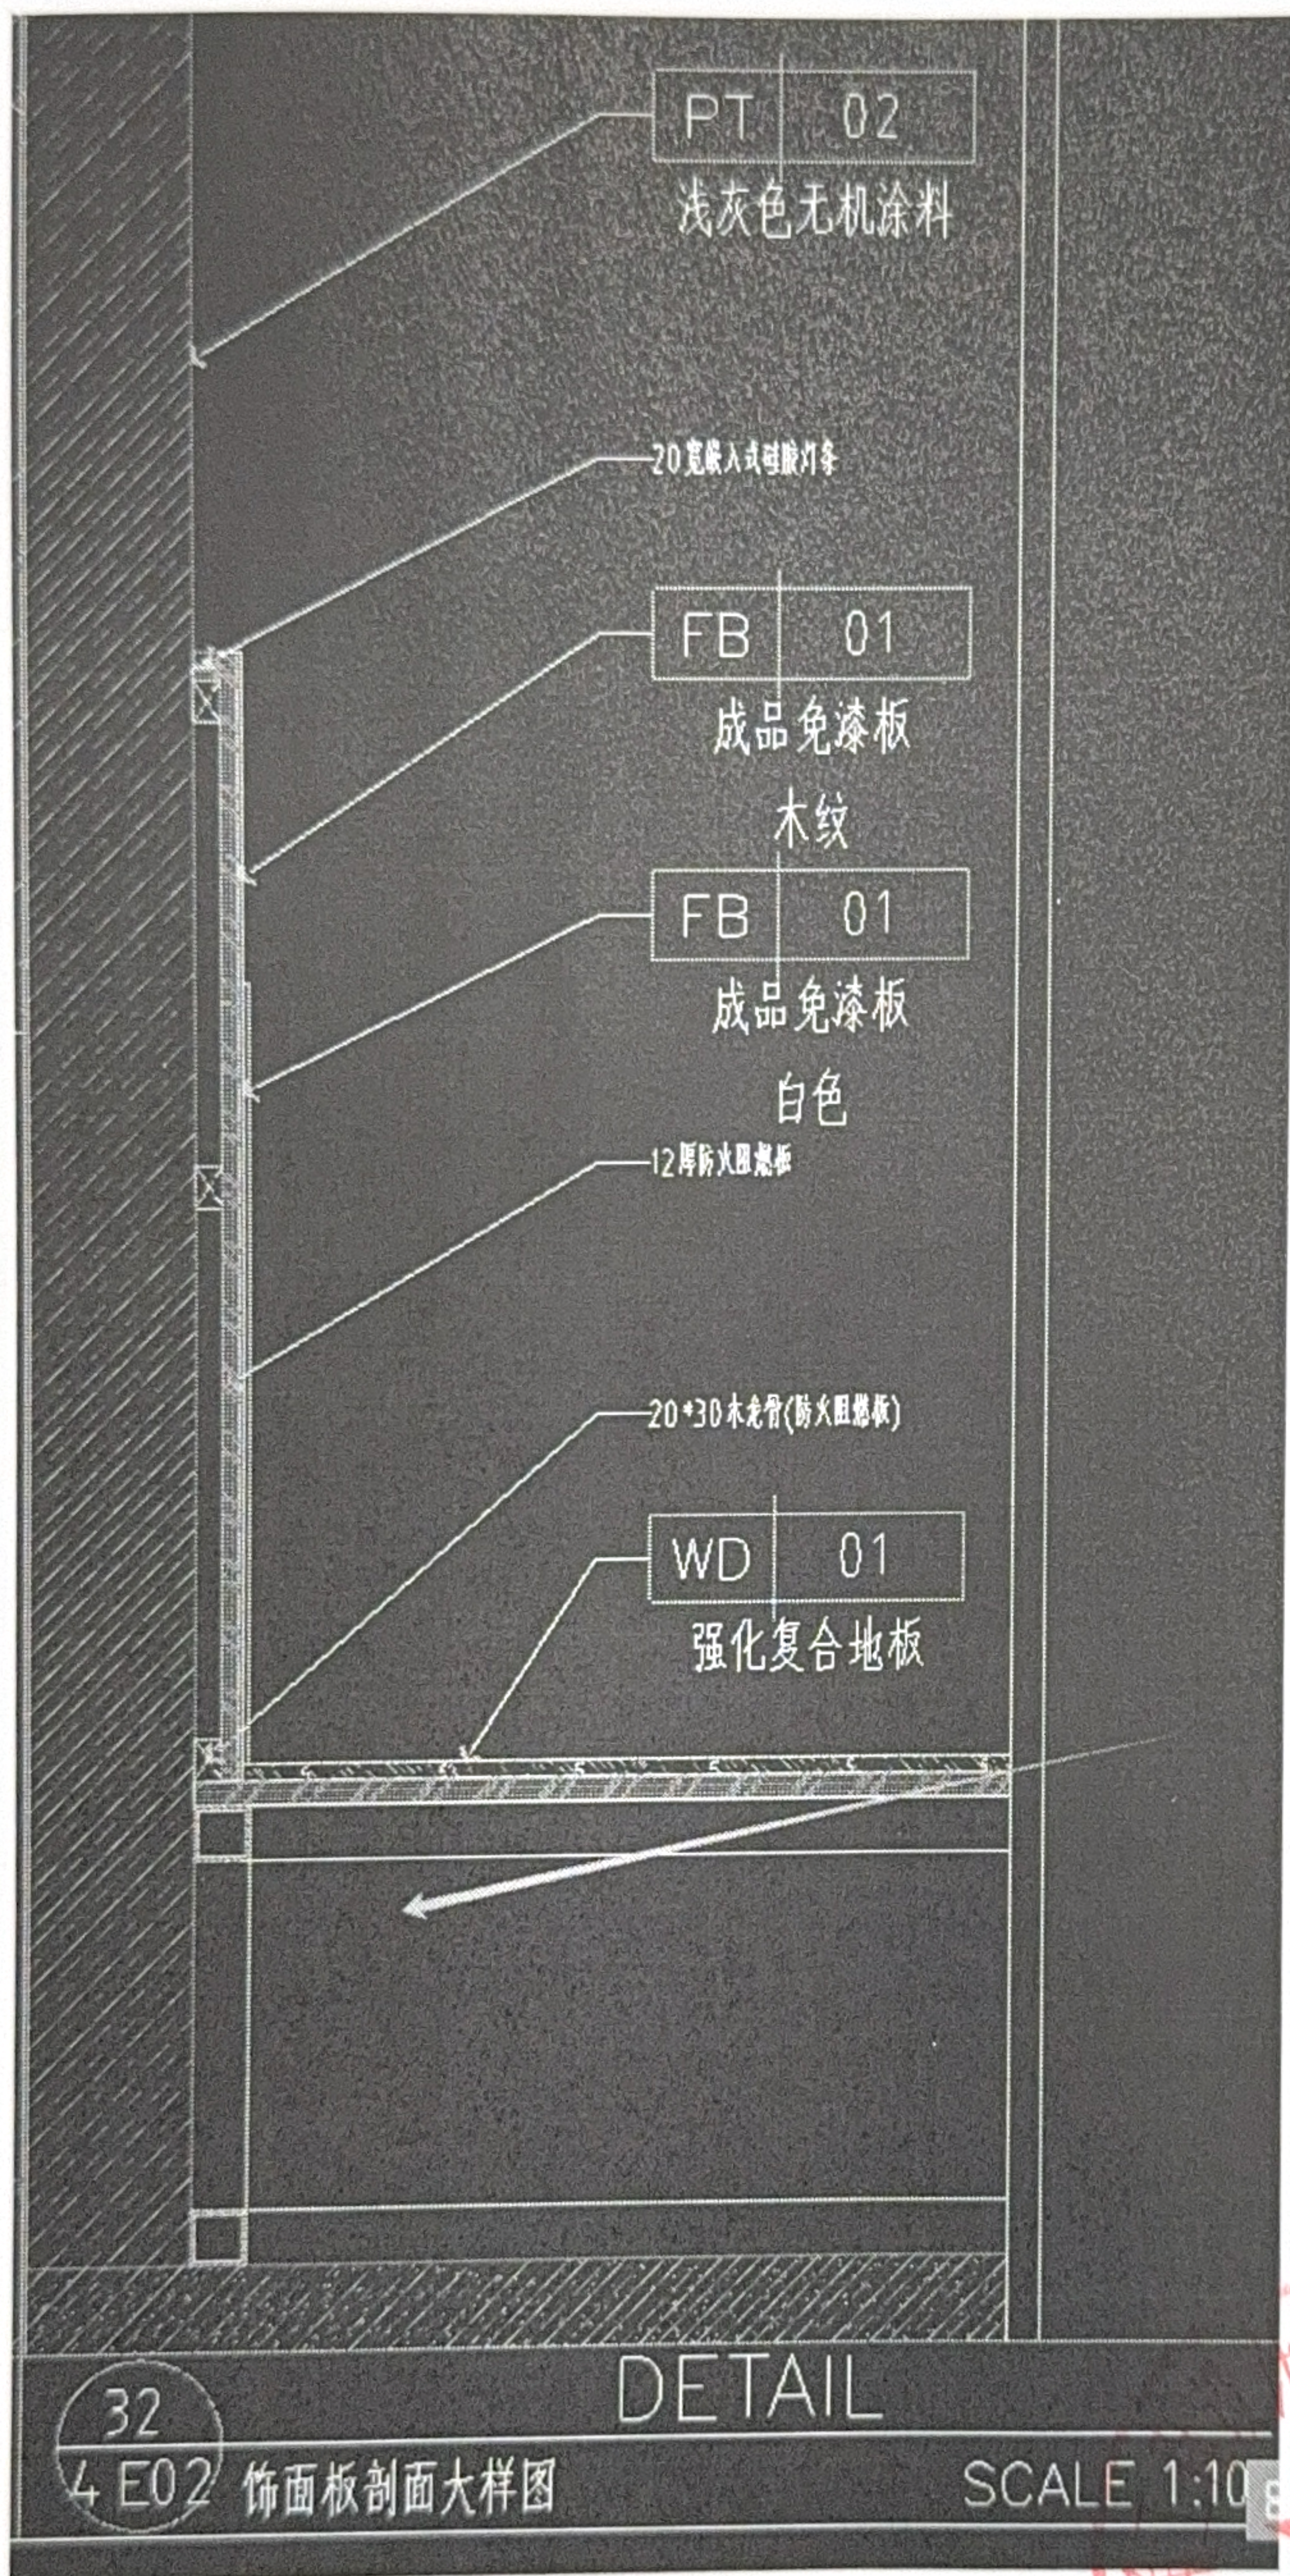


结 合 下 面 地 台 节 点

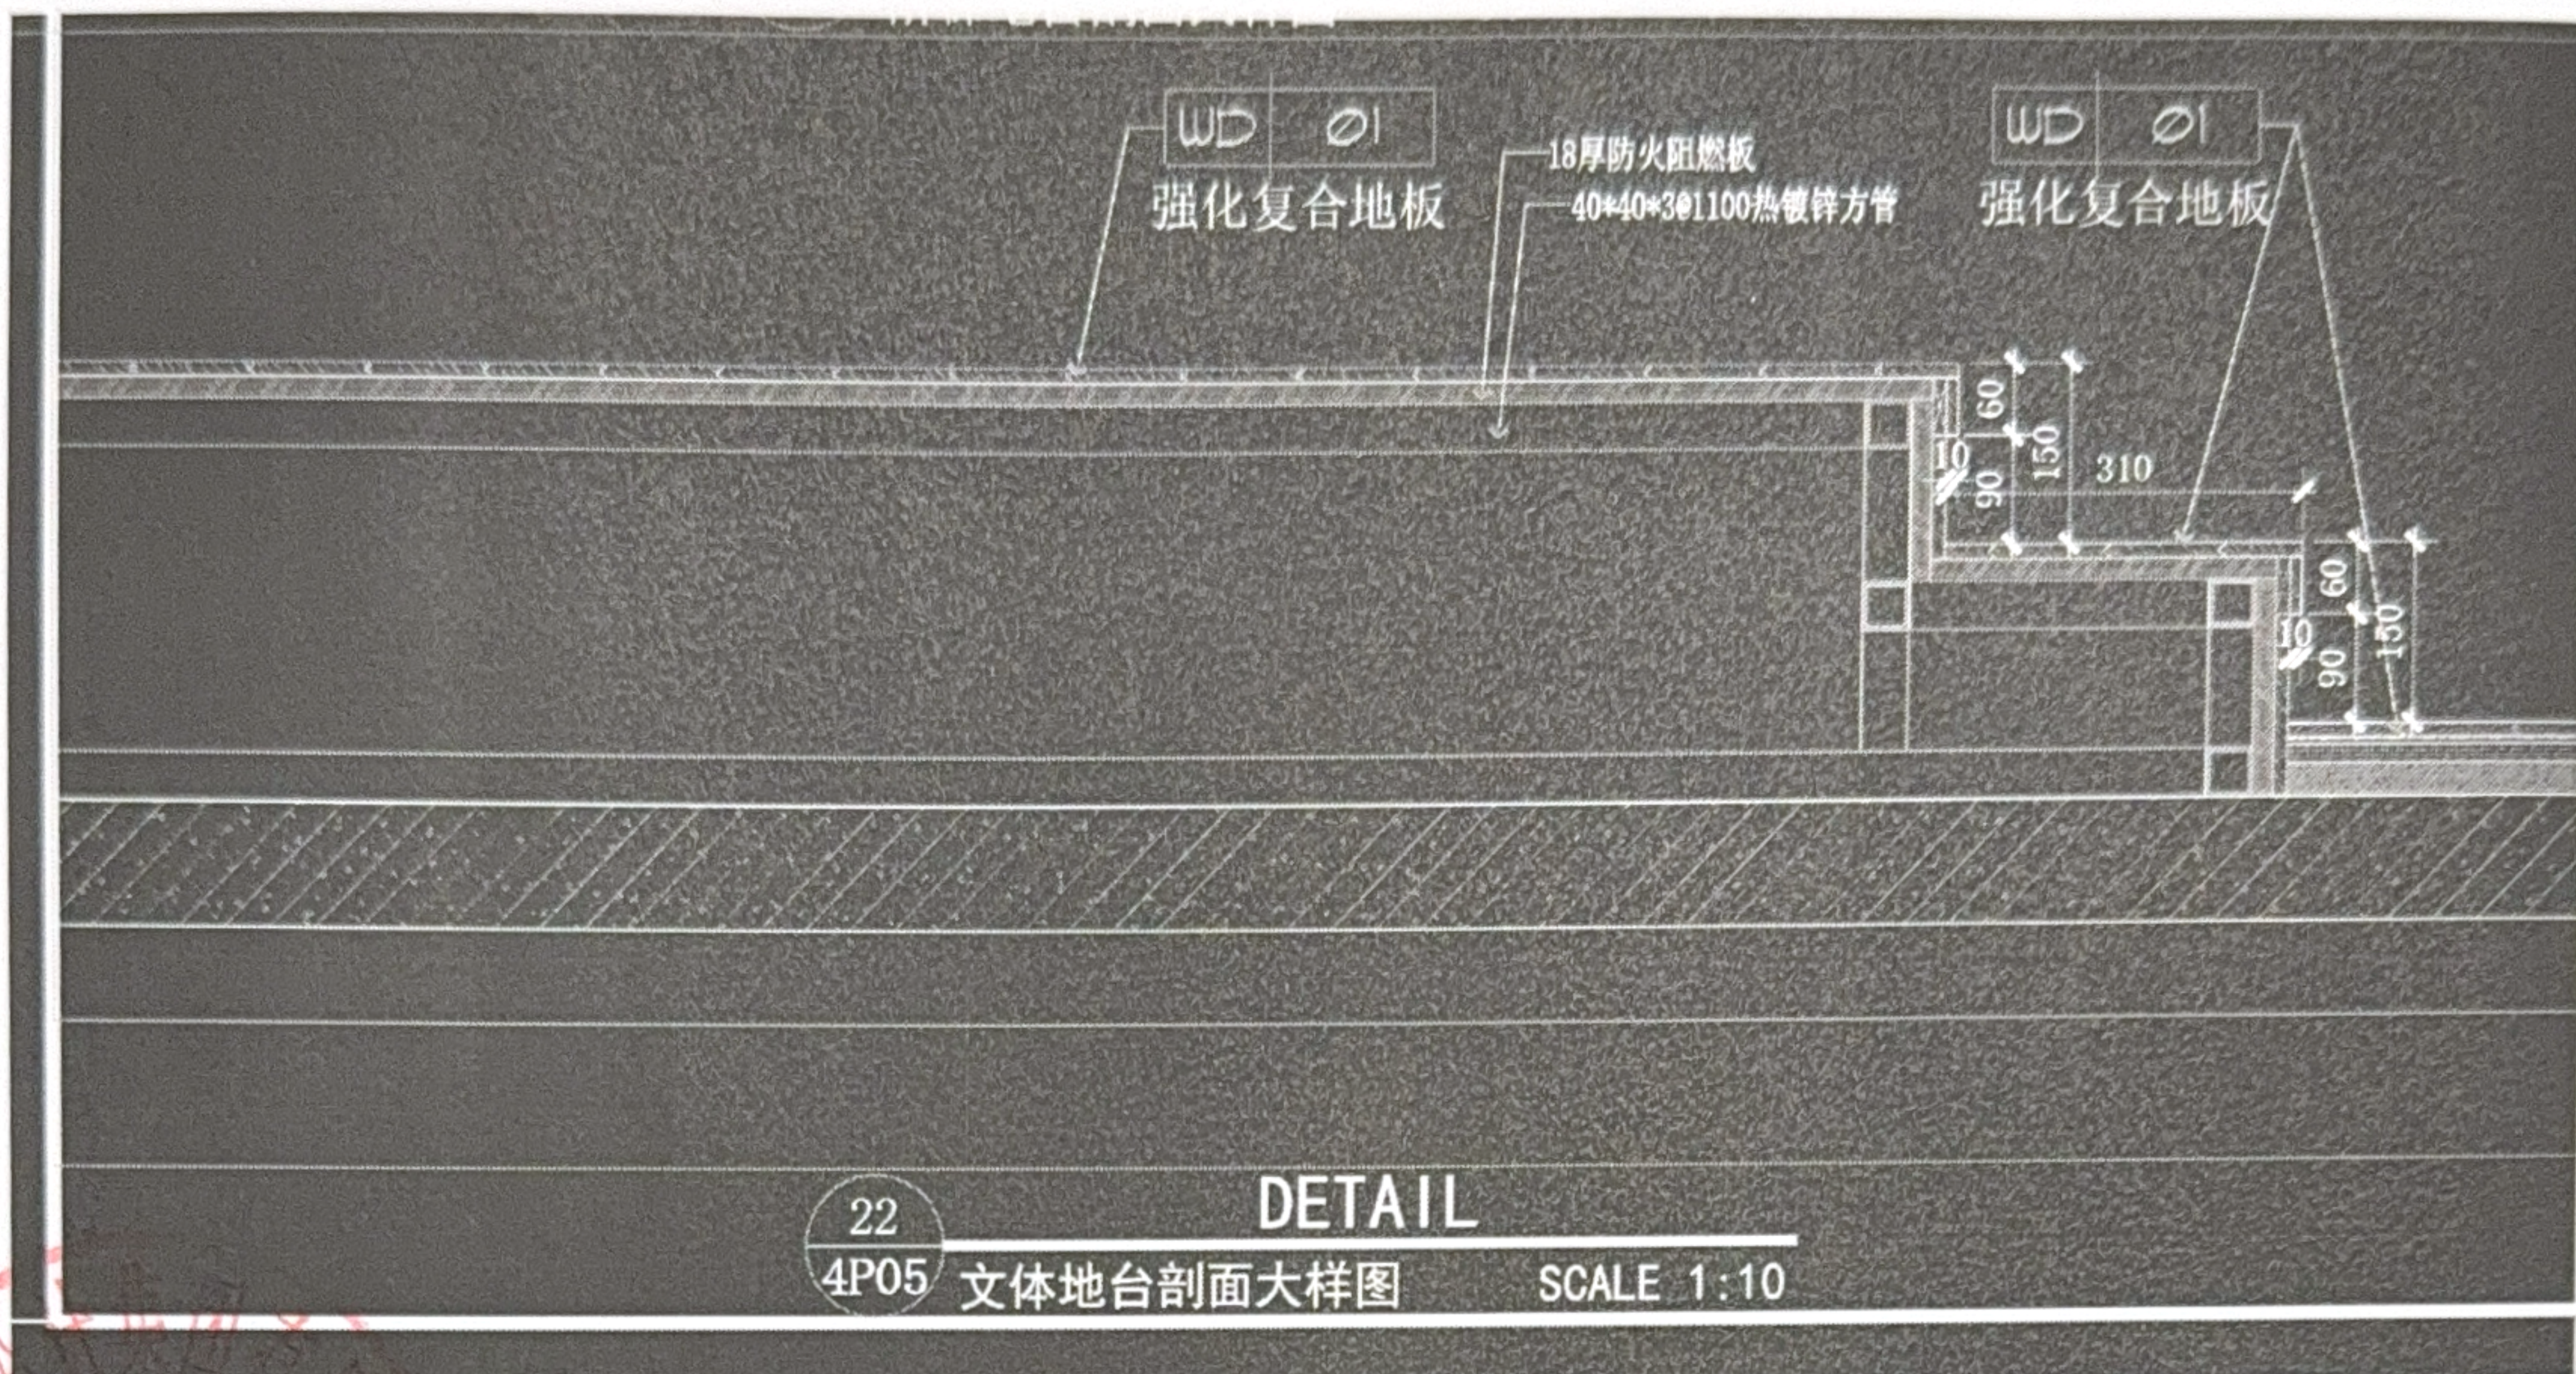

29、四层原来顶面需要涂料翻新，天窗四周打耐候胶（数量详见下图），天窗下侧面顶（尺寸详见下图）也需要重刷白色防水无机涂料，原来涂料铲除

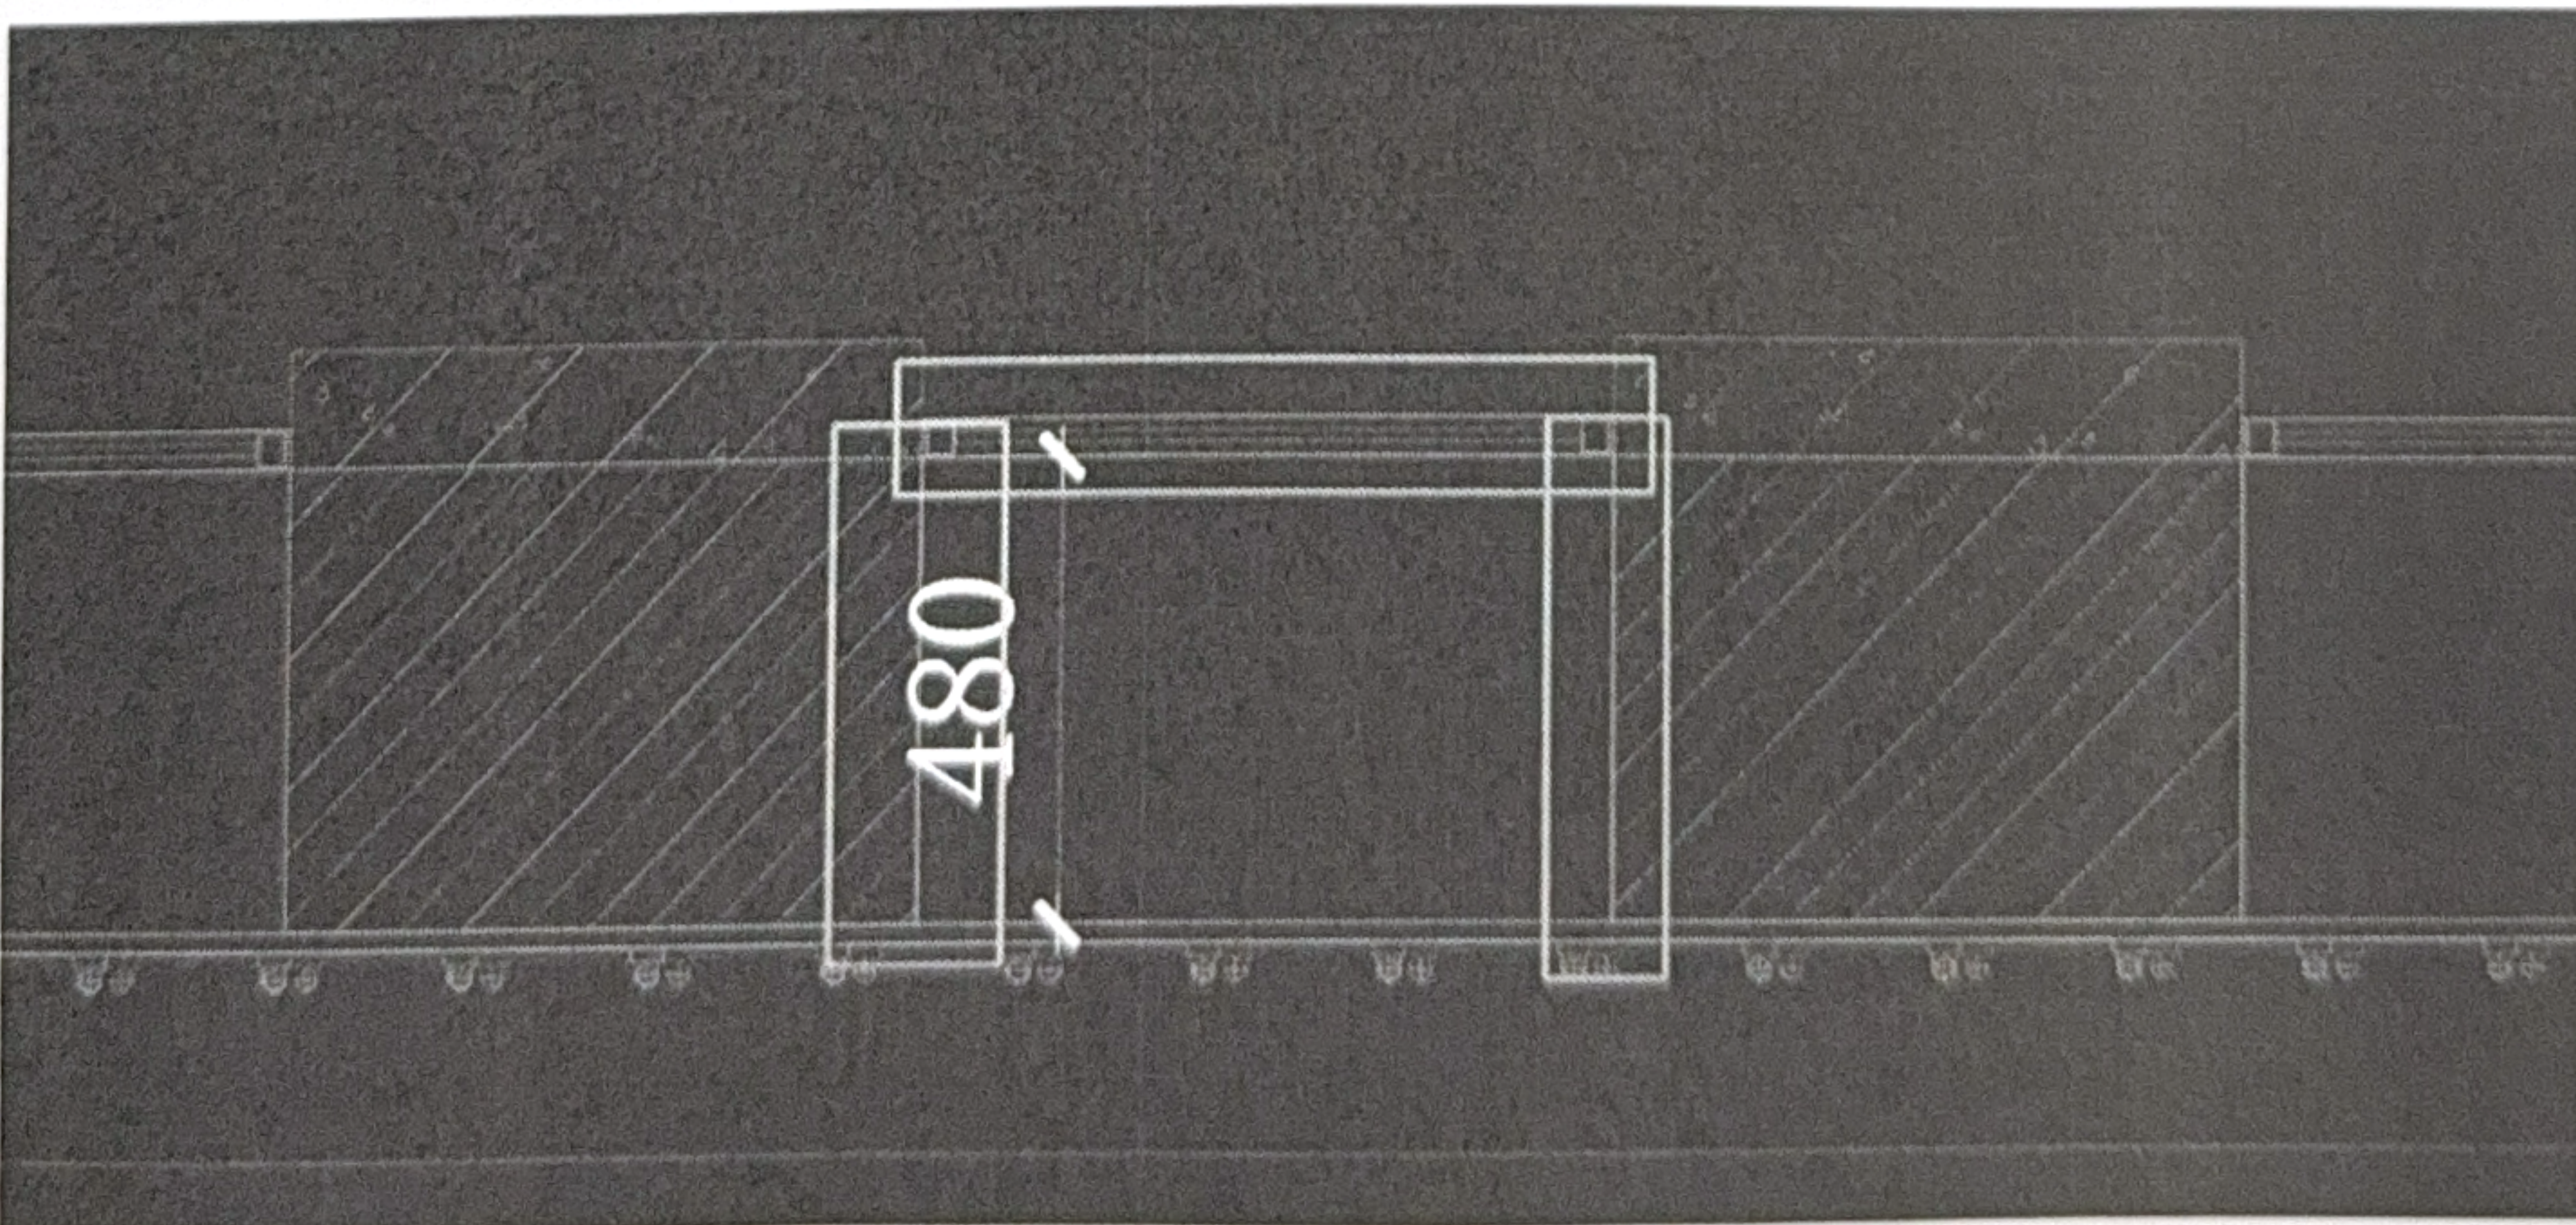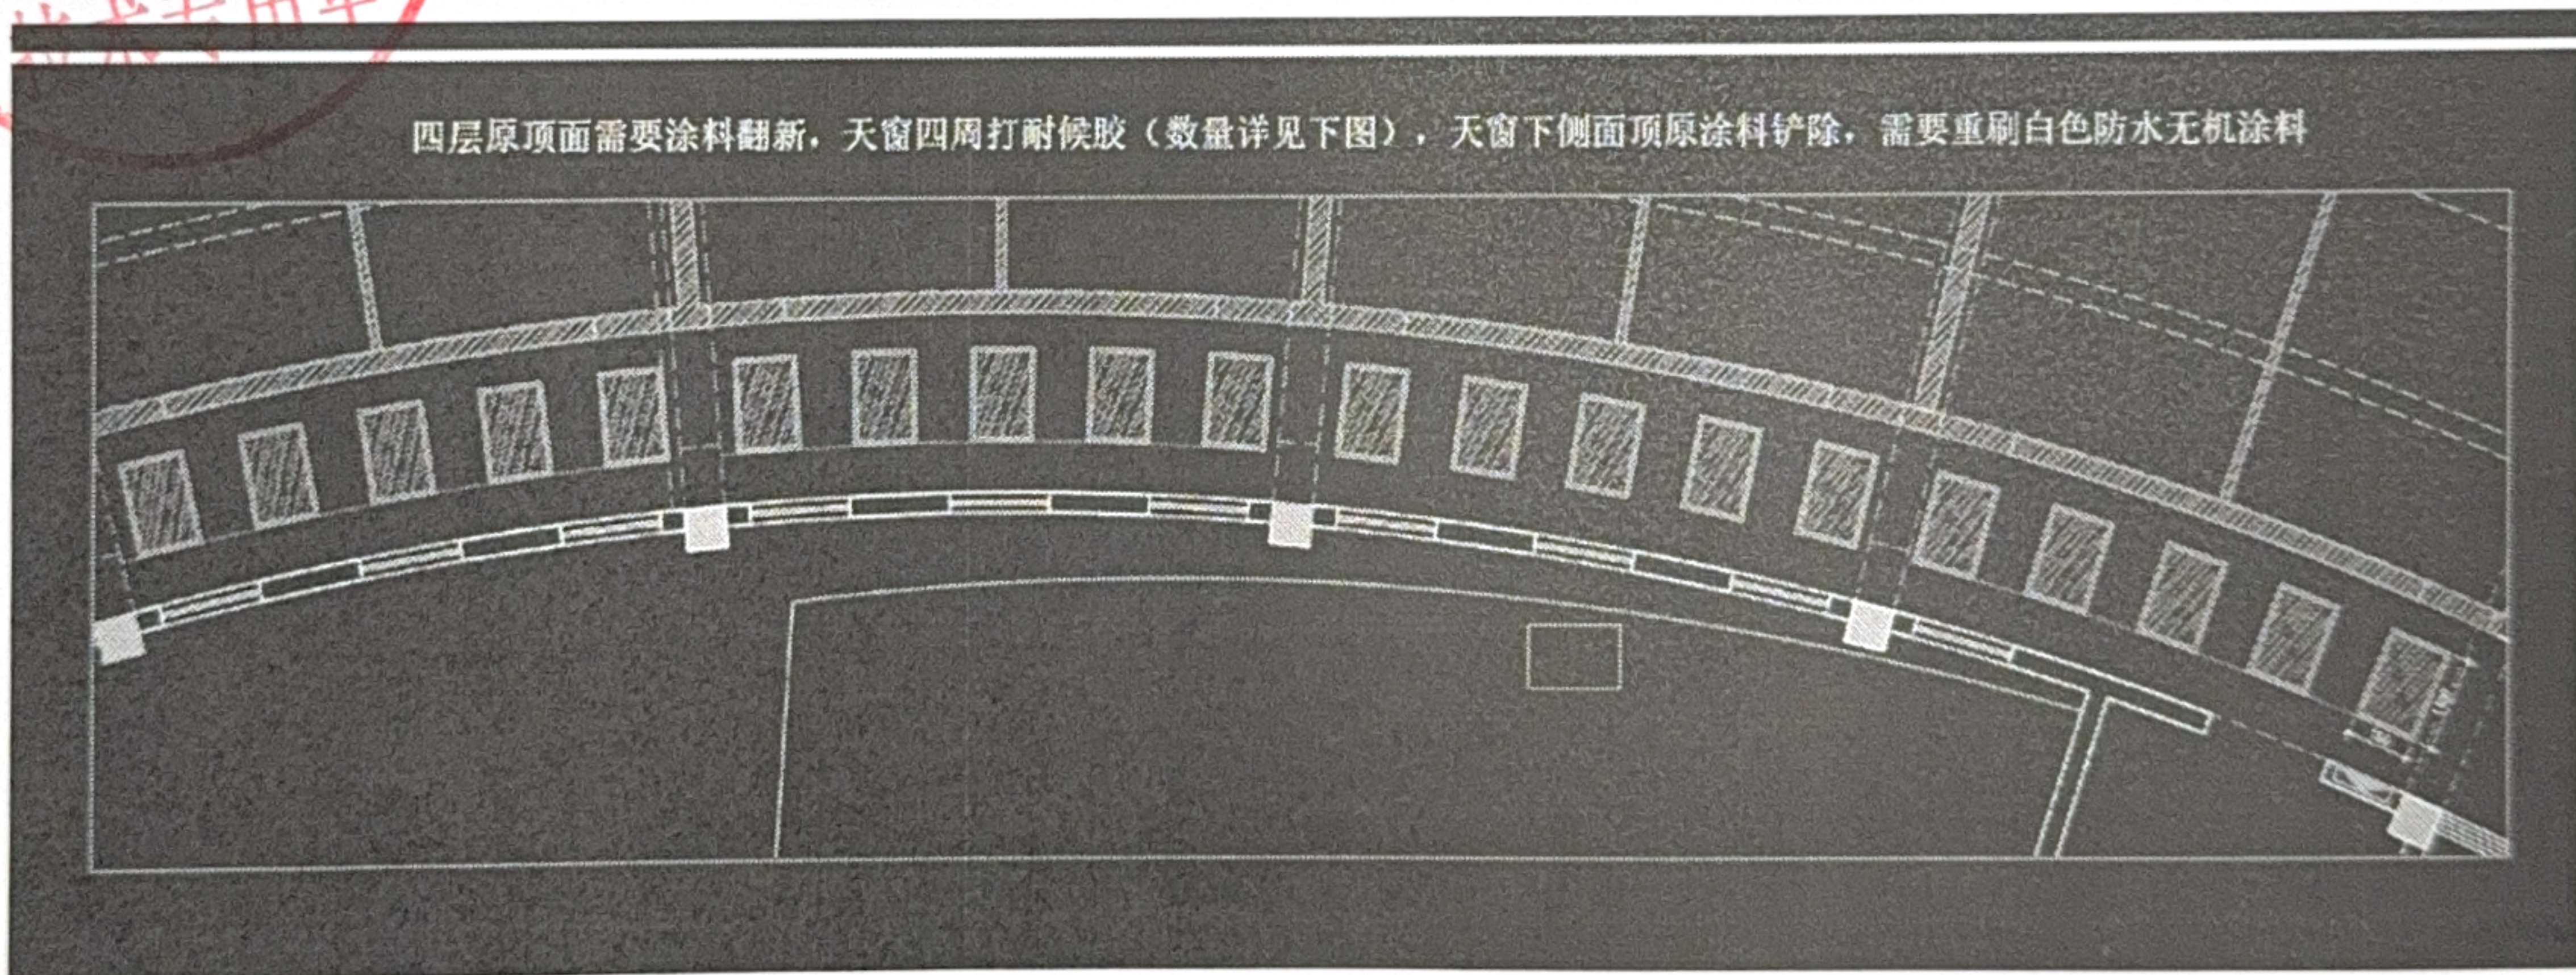

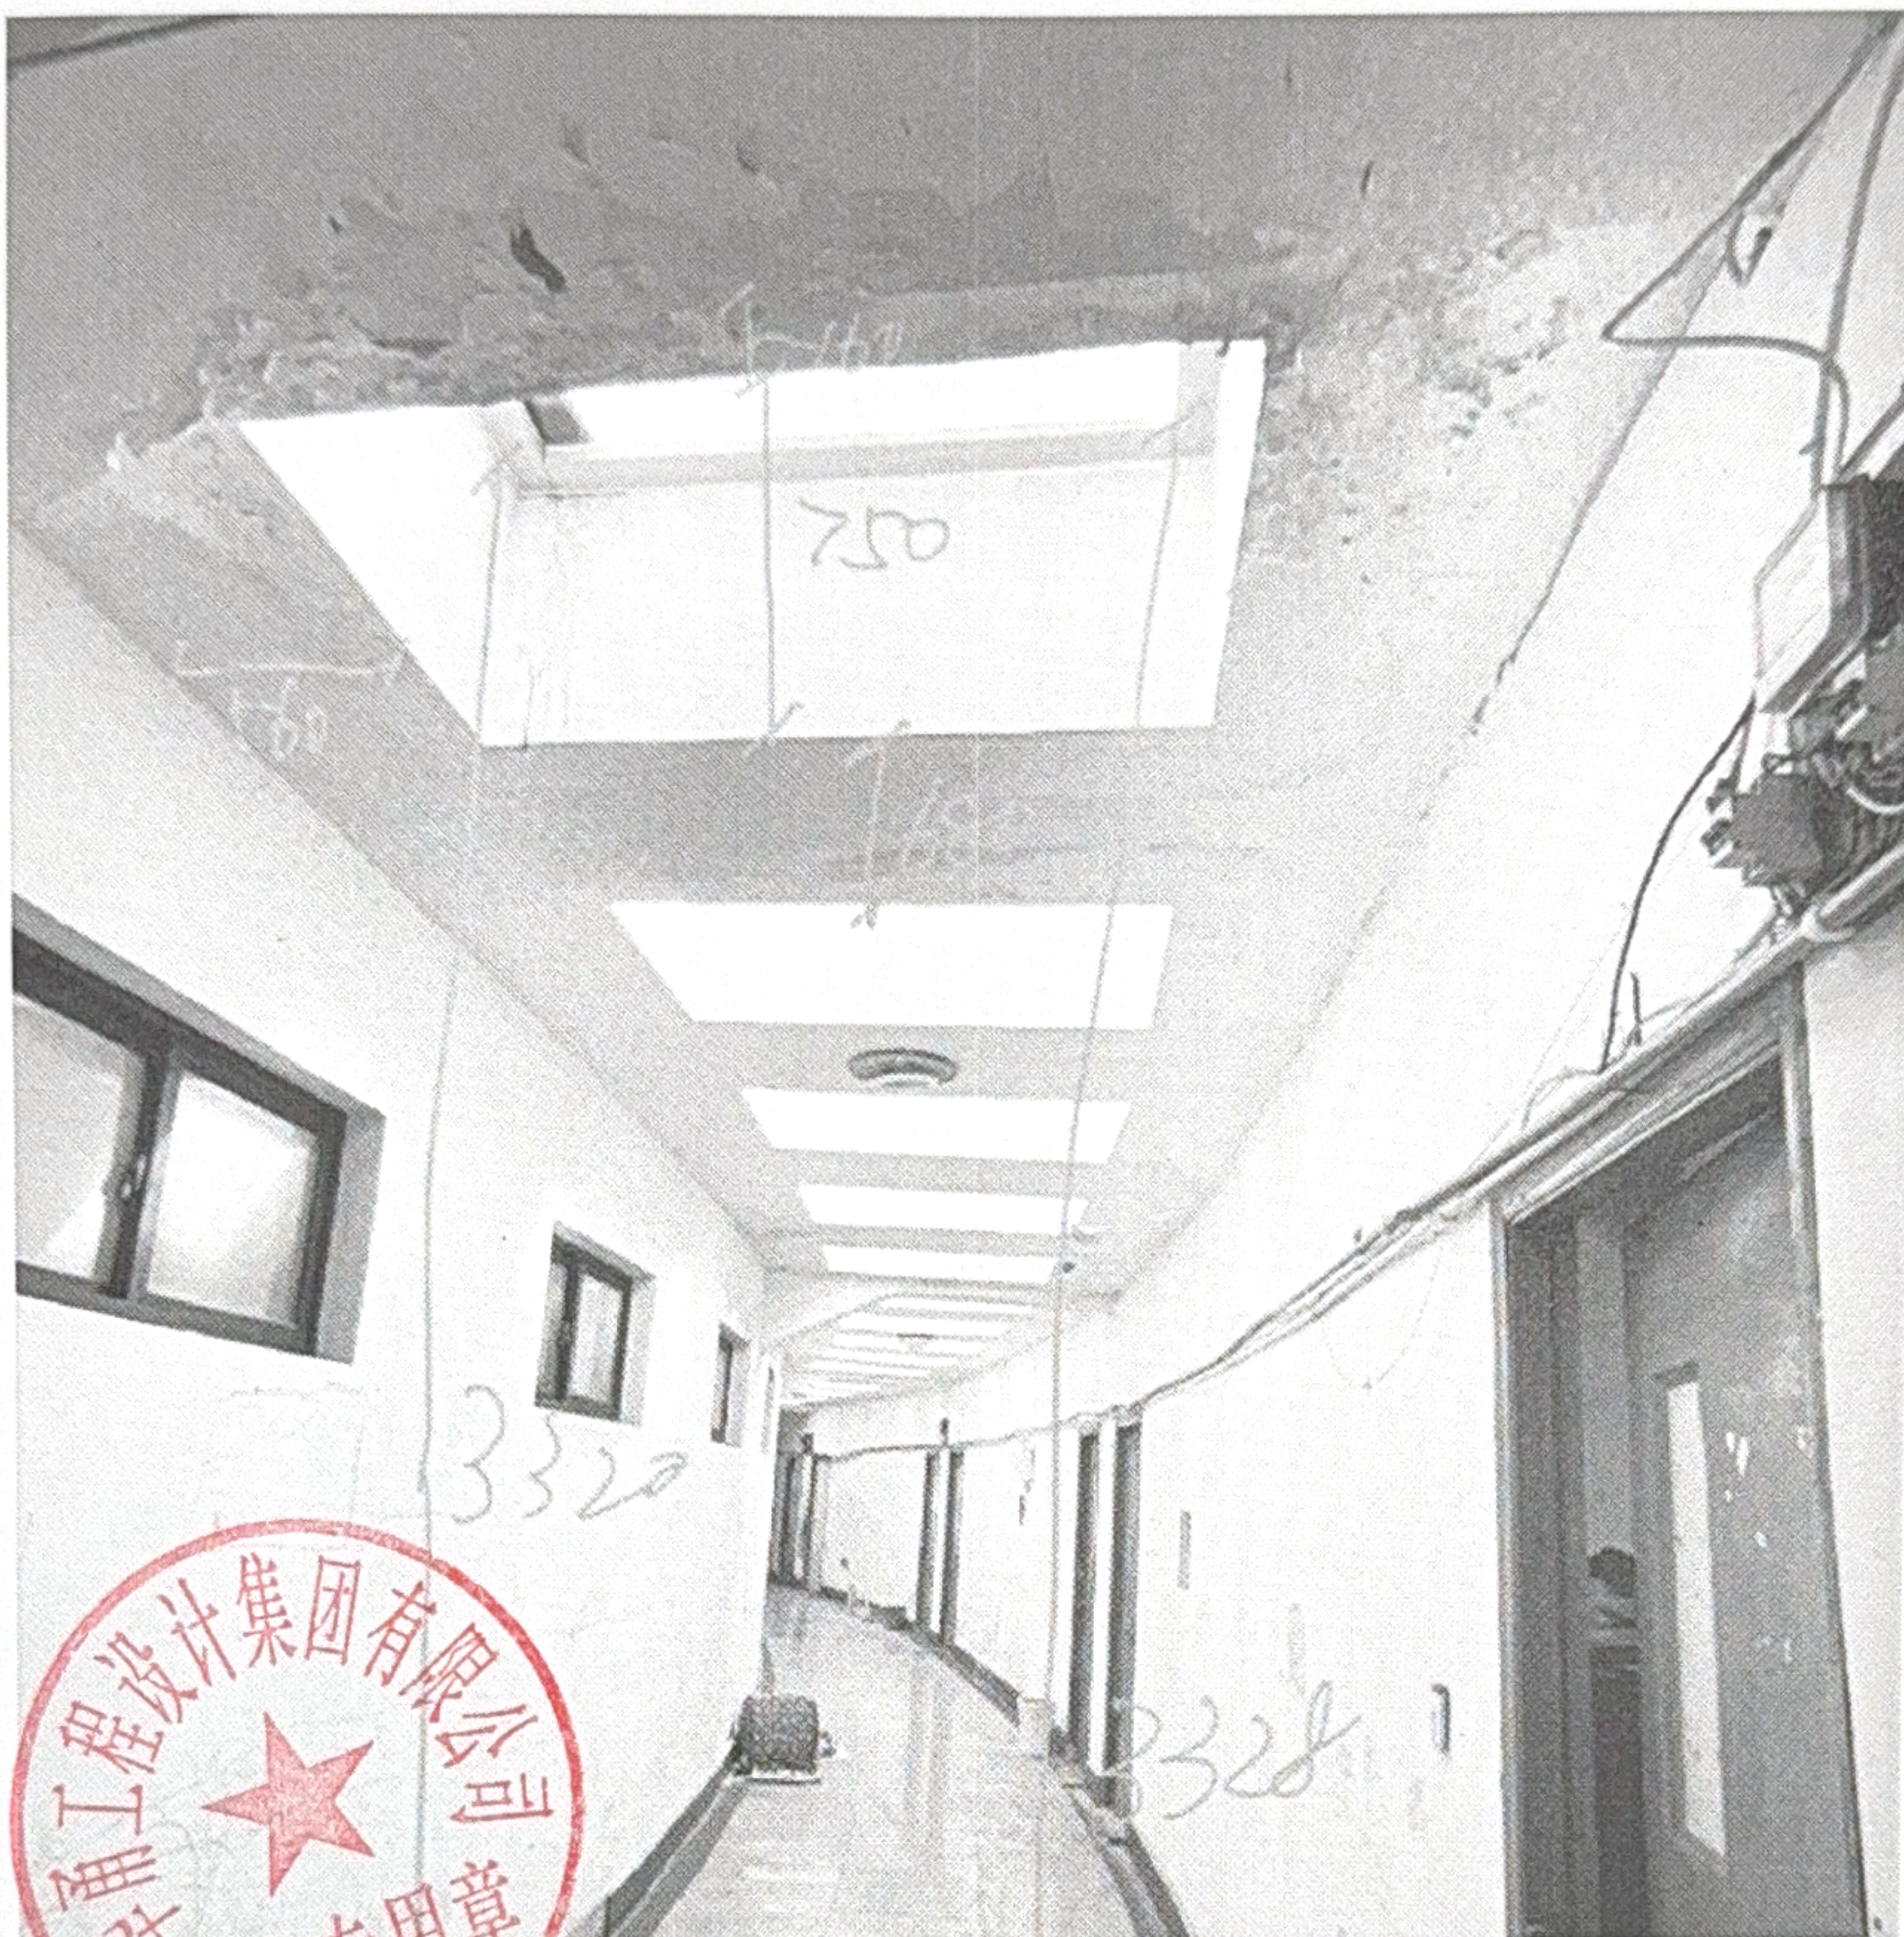

30、食堂卡座取消，改成移动家具
