围栏的选材和制造是保障围栏安全的基础。围栏应当选用坚固耐用的材料，如钢材、铸铁、铝合金等，以保证围栏的强度和耐久性。其次，制造围栏时应严格按照国家标准进行，确保围栏的质量达到标准。

围栏的安装

围栏的安装是围栏保障措施中非常重要的一环。在安装围栏时应注意以下几:

固定基础:围栏的固定基础应当，确保围栏稳固。

围栏高度:围栏高度应当符合国家标准要求，并要根据场所的具体情况进行合理安装，以达到有效的保护效果。

固定方式:围栏的固定方式应当采用专用的螺丝、膨胀管或焊接方式等，确保围栏的连接牢固。

围栏的维护

围栏的维护是围栏保障措施中非常重要的一项措施。围栏在长时间使用后，可能会出现一些质量问题，如锈迹、变形等。为了保障围栏的质量和使用效果，应当及时进行维护，具体措施如下:

定期检查:要定期进行围栏的检查，在发现问题时及时进行维修或更换。

维修更换:在围栏发生质量问题时，应当及时进行维修或更换，并记录维修更换情况。

围栏的警示标识

围栏的警示标识是围栏保障措施中非常重要的一项措施。围栏上应当进行警示标识，以提示人们注意安全，具体措施如下:

1. 警示标识规格:警示标识应当符合国家标准，大小、字体、颜色、内容等应当规范化。

2. 警示标识内容:警示标识上应当标识围栏的作用、警示语句等内容，以便人们注意安全。

3. 安装位置:警示标识应当在围栏上明显位置进行安装，并且定期检查更换。

（四）质量管理措施



阿尼玛卿山脉水源周边的草原作为重要的生态系统，其保护与管理至关重要。草原围栏作为维护草原生态平衡、防止人畜破坏的有效手段，其采购及安装质量直接关系到围栏的使用效果与寿命。本方案在深入探讨草原围栏从采购到安装的全过程质量控制及保证措施，确保围栏能够有效发挥其作用。通过精细化管理与严格的质量控制，我们期望提升草原围栏的整体性能，为草原保护提供坚实保障。同时，本方案也将关

注质量标准的制定与执行，以及质量保证体系的建立，旨在构建一个全面、高效的质量控制体系。

方案概述与目标

本方案是一项针对草原围栏采购与安装流程的全面优化和规范化措施，其核心目标在于确保草原围栏产品的质量达到国家及行业规定的最高标准，以有效提升草原生态保护的效果和持久性。方案中详细规定了从最初的原材料采购环节开始，到围栏生产加工、运输存储、现场安装以及后期验收等全链条的质量控制流程。

在原材料采购阶段，明确提出对钢材、防腐处理、焊接材料等关键原材料的质量要求，并建立严格的供应商评估机制，确保所有原材料均来自具有资质、信誉良好的供应商，保证原材料质量的基础上，还要考虑经济性和环保性。


在围栏生产加工环节，通过引进先进的生产设备和技术，严格执行国家相关生产工艺标准，对每一道工序进行严谨把关，确保产品规格统一、结构稳固、防腐耐用。同时，采用科学合理的防腐及涂装工艺，有效延长围栏使用寿命。

在运输存储环节，制定详尽的操作规范，要求运输过程中避免野蛮装卸，确保围栏成品在运输过程中不受损坏；存储时需做好防潮、防晒、防变形等措施，保持产品完好无损。

在现场安装阶段，根据地形地貌特点编制详细的安装方案，利用专业队伍进行精准施工，并采用先进的安装设备和技术，保证围栏安装精度和稳定性。同时，强调与生态环境相协调，尽可能减少对草原生态的干扰。

在后期验收及维护保养方面，设立严格的验收标准与程序，对围栏工程进行全面细致的验收检查；定期进行维护保养巡查，及时发现并处理可能出现的问题，确保围栏系统长期稳定运行。

最终目标是通过构建一套全面、系统、严谨的质量控制体系，实现草原围栏从源头到终端的全过程质量管理，从而为草原资源的科学合理利用和生态环境的长期保护提供稳固可靠的屏障，促进人与自然和谐共生。

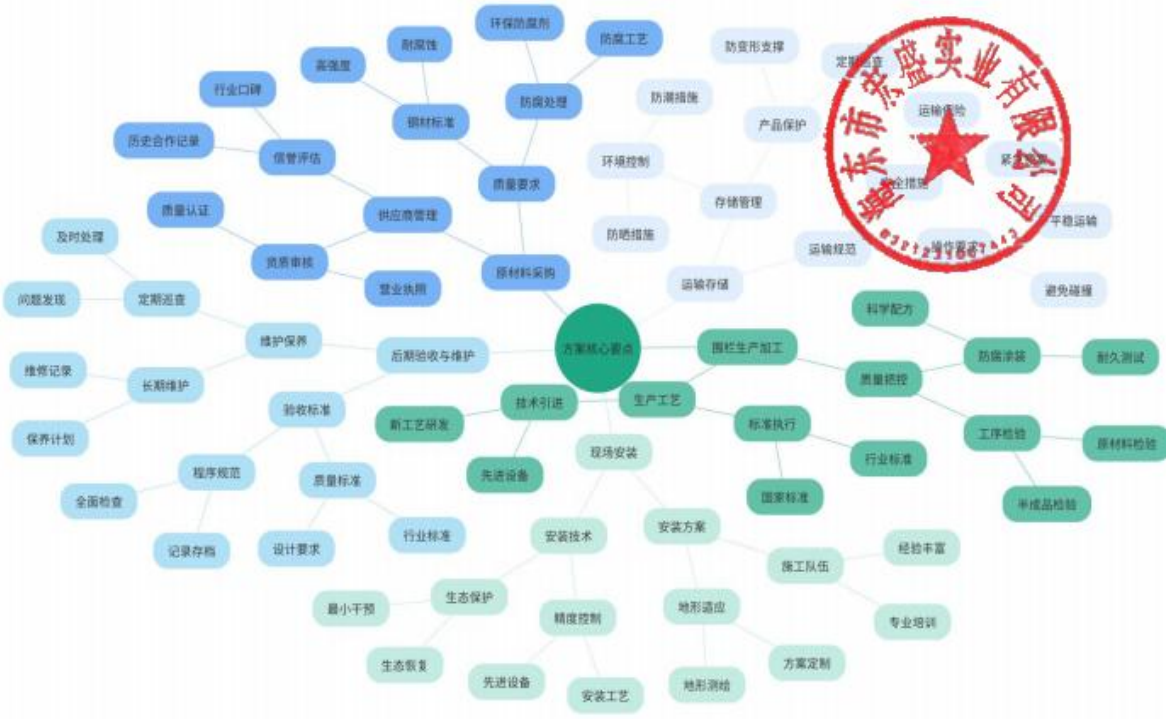

方案核心要点

草原围栏质量标准制定

国家与行业标准遵循

在制定草原围栏质量标准时，严格遵循国家及行业相关标准至关重要。需关注围栏材料的选择，确保所选材料符合国家环保要求，不会对环境和人体健康产生负面影响。需要考虑围栏的物理性能，如抗风压性

能、耐腐蚀性以及使用寿命等，这些方面都有明确的规定。这些规定旨在保障围栏产品的安全性和可靠性，确保在使用过程中能够有效地发挥其防护作用。

企业内部质量标准细化

在遵循国家与行业标准的基础上，结合实际需求，进一步细化企业内部质量标准。我们需要考虑草原围栏的特定应用场景，如地理环境、气候条件、使用频率等因素。这些因素都会对围栏的质量产生影响。为了确保围栏能够适应这些复杂多变的自然环境，我们需要制定更为严格的性能指标和检验方法，确保产品能够在各种情况下都能够保持良好的防护效果。

质量标准宣贯与培训

为确保质量标准得到有效执行，组织全员进行质量标准的宣贯与培训。通过多种形式，如专家讲座、现场演示、操作演练等，提高员工对质量标准的理解和执行能力。同时，建立定期考核机制，检验员工对质量标准的掌握程度，确保质量标准深入人心，成为全体员工共同遵循的行为准则。这样不仅可以提高员工的质量意识，还可以促进企业整体质量管理水平的提升。

安装过程质量控制

运输与存储质量控制

草原围栏产品在运输和存储过程中易受环境因素影响，因此，我们制定详细的运输与存储质量控制方案。采用专用运输车辆和包装材料，确保产品在运输过程中不受损坏。在存储环节，设立专门的仓库，配备

温湿度控制系统，定期检查库存产品状态，确保产品在安装前保持最佳性能。

我们使用专用的运输车辆来运输草原围栏产品，这些车辆具备防震、防潮等功能，以减少产品在运输过程中的损坏风险。同时，我们选择合适的包装材料对产品进行包装，以确保产品在运输过程中不会受到任何损坏。


在仓库方面，我们设立了专门的存储区域，并配备了先进的温湿度控制系统。通过实时监测和调节仓库内的温湿度，确保产品在存储期间不会受到环境因素的影响。此外，我们还定期检查库存产品的状态，及时发现并解决潜在问题，确保产品在安装前保持最佳性能。

安装过程质量控制

安装环节是草原围栏质量控制的最后一环，也是最为关键的一环。我们组建专业的安装团队，严格培训安装人员的操作技能和质量意识。在安装过程中，实施全程监控，确保每一步操作都符合安装规范和质量标准。同时，建立安装质量验收机制，对安装完成的围栏进行全面检查，确保围栏的稳固性和防护效果。

在安装前，我们的专业团队会对施工现场进行详细的勘查和评估，根据现场实际情况制定出最合适的安装方案。为了确保安装过程中的质量可控性，我们严格遵循相关的安装规范和标准，对每一个细节都精心把控。在施工过程中，我们实行全程监控，确保每一步操作都符合既定的规范和质量标准。在关键环节和工序上，我们设立了严格的质量控制点，对施工过程进行实时监控和检查。

在安装完成后，我们会进行全面的质量验收工作。通过验收工作来确保草原围栏的质量达到预期的标准。验收工作包括对围栏的稳固性、防护效果、外观质量等方面的全面检查。同时验收过程中发现的问题会及时进行整改和处理以确保草原围栏的质量安全可靠。

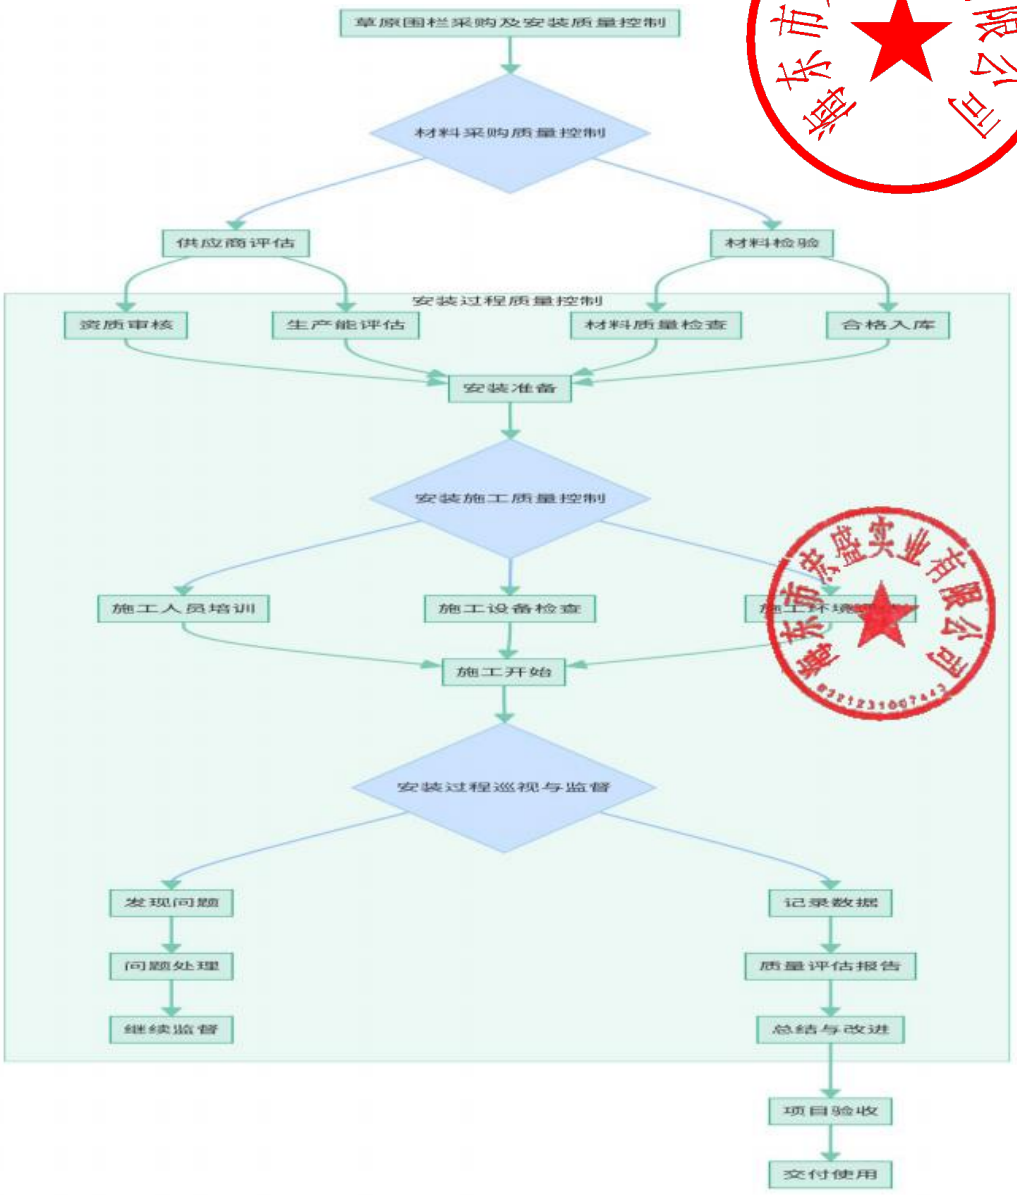

安装过程质量控制流程

质量保证措施与监督机制

质量保证体系建立

为确保草原围栏采购及安装过程中的质量控制有效且持续，我们构建了一个全面而严密的质量保证体系。这一体系从最初的供应商资质审查、原材料采购过程中的质量把控，到中间环节的质量检验与检测，再到最后的安装效果验收，形成了完整的链条，实现了全过程、全方位的质量管理。我们坚持定期进行内部审核，对各个环节的操作规范和质量标准进行严格核查，同时辅以管理评审机制，对整体质量管理体系进行持续优化和升级。通过这种闭环管理模式，我们旨在不断提升整体质量管理水平，确保草原围栏项目的每一处细节都能达到甚至超越预期标准。

质量监督与检查机制


基于已建立的质量保证体系，我们进一步强化了质量监督与检查机制。设立了专职的质量监督员，他们负责全程跟踪和监控采购、运输、存储以及安装等关键环节，确保每一步操作都符合既定规范和标准。监督过程采取定期或不定期相结合的方式，以适应不同阶段的质量控制需求。同时，我们引入了先进的检测技术和手段，如无损检测、精密测量等，确保监督检查结果的客观性和准确性，对于发现的质量问题，我们将迅速采取行动，及时纠正，防止问题扩大化。

不合格品处理流程

针对在检验、安装等环节中发现的不合格品，我们制定了一套严格而完善的不合格品处理流程。首先，对不合格品进行严格的标识、隔离

和记录管理，确保其不会误入下一道工序或环节，从而避免潜在的质量隐患。其次，深入分析不合格品产生的原因，这包括但不限于原材料质量问题、生产设备故障、操作过程失误等因素。通过深入调查和细致分析，找出问题的根源所在，为制定针对性的纠正措施和预防措施提供科学依据。最后，对制定的纠正措施的实施效果进行跟踪验证。这一环节至关重要，它能够确保不合格品得到有效处理，真正防止类似问题再次发生。只有在验证过程中确认纠正措施有效且得到切实执行后，我们才能确认不合格品问题得到了妥善解决。

质量保证措施框架

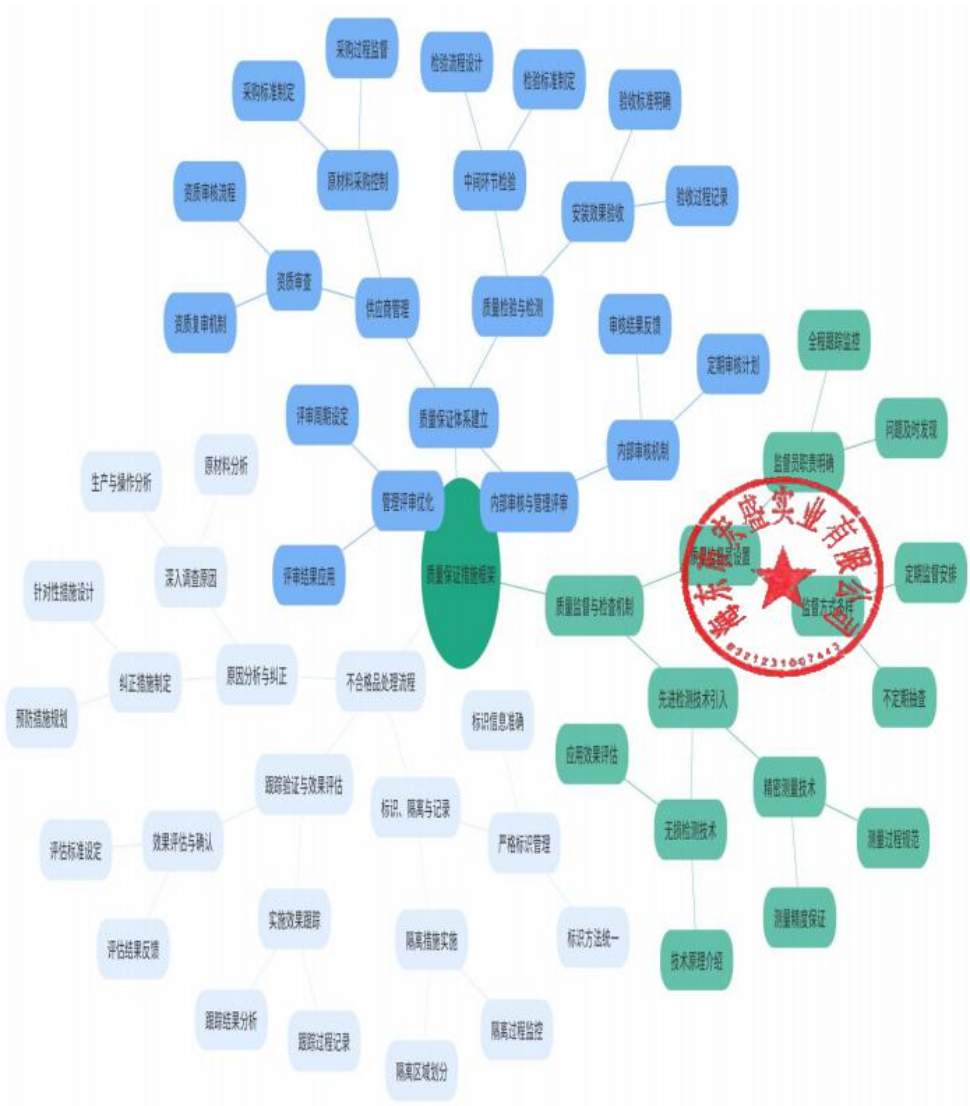

（五）环境保护措施

一、环境保护管理体系

（一）管理目标

本项目以维护和提升项目区域生态环境质量为核心目标，在网围栏施工作业过程中，严格遵循国家和地方环境保护相关法律法规，确保项目实施不对周边生态系统造成不可逆的破坏，实现生态效益、经济效益与社会效益的协调统一。具体目标包括：有效保护生物多样性，维持区域内野生动植物的生存环境；严格控制水土流失，使项目区土壤侵蚀模数降低至规定标准以下；减少项目施工对大气、水、土壤等环境要素的污染，确保周边环境质量符合相应环境功能区要求。

（二）组织架构与职责分工

成立环境保护领导小组：由项目经理担任组长，项目技术负责人、各施工队队长及专职环保人员为成员。领导小组全面负责项目实施过程中的环境保护管理工作，制定环境保护政策、目标和计划，协调解决环境保护工作中的重大问题，监督各项环保措施的执行情况。

职责分工

项目经理：作为项目环境保护的第一责任人，对项目的环境保护工作负总责。负责组织制定和实施项目环境保护计划，确保环保工作所需的人力、物力和财力投入，定期组织召开环保工作会议，协调解决环保工作中的重大问题。

项目技术负责人：负责制定项目环境保护技术方案，对项目施工过程中的环保技术问题进行指导和把关。组织开展环保技术培训，推广应

用先进的环保技术和工艺，监督检查施工过程中环保技术措施的执行情况。

施工队队长：负责本施工队施工区域内的环境保护工作，严格按照项目环境保护计划和技术方案组织施工。加强对施工人员的环保教育和管理，确保施工人员遵守环保规定，及时发现和处理施工过程中出现的环境问题，并向环境保护领导小组报告。

专职环保人员：负责项目施工现场的日常环境监督检查工作，对施工过程中的环境违法行为进行制止和纠正。定期对项目区环境质量进行监测，收集、整理和分析环境监测数据，及时向环境保护领导小组汇报环境状况，提出环境保护建议和措施。

（三）管理制度

环境影响评价制度：在项目实施前，按照国家相关规定委托有资质的单位对项目进行环境影响评价，编制环境影响评价报告，并报环境保护行政主管部门审批。严格按照环境影响评价报告及批复要求，落实各项环保措施。

环保培训制度：定期组织项目管理人员和施工人员参加环境保护培训，学习国家和地方环境保护法律法规、政策以及项目环境保护技术要求等知识，提高人员的环保意识和技能水平。培训内容包括环保基础知识、生态保护、污染防治、环境应急等方面，确保每位参与项目的人员都能充分认识到环境保护的重要性，并掌握相应的环保措施和操作方法。

环境监测制度：制定详细的环境监测计划，委托专业环境监测机构对项目区的大气、水、土壤、噪声等环境要素进行定期监测。监测频率根据项目特点和环境敏感程度确定，一般情况下，大气环境质量监测每季度进行一次，水环境质量监测每月进行一次，土壤环境质量监测每年进行一次，噪声监测每周进行一次。根据监测结果，及时分析评估项目实施对环境的影响，如发现环境问题，及时采取措施进行整改。

环保奖惩制度：建立健全环保奖惩机制，对在环境保护工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励；对违反环境保护规定，造成环境污染或生态破坏的部门和个人，依法依规进行严肃处理，并追究相关责任。奖惩措施与个人绩效挂钩，激励全体人员积极参与环境保护工作。

二、环境保护措施

（一）生物多样性保护措施

施工前生物多样性调查：在项目施工前，组织专业技术人员对项目区及周边的生物多样性进行详细调查，包括野生动植物种类、分布范围、生态习性等信息。建立生物多样性数据库，为项目实施过程中的生物多样性保护提供科学依据。

划定生物多样性保护区域：根据生物多样性调查结果，在项目区内划定重要生物多样性保护区域，如珍稀濒危野生动植物栖息地、野生动物迁徙通道等。在保护区域设置明显的标识牌，严禁在保护区域内进行任何破坏生物多样性的施工活动。

野生动植物保护措施：在施工过程中，加强对野生动植物的保护，严禁捕杀、猎捕野生动物，严禁砍伐、破坏野生植物。如在施工过程中

发现珍稀濒危野生动植物，应立即停止施工，并采取保护措施，及时报告当地林业主管部门和环境保护行政主管部门。

生态廊道建设：结合项目区地形地貌和生态系统特点，规划建设生态廊道，连接不同的生态斑块，为野生动植物提供迁徙和扩散的通道。生态廊道内种植适宜的本地植物，营造良好的生态环境，促进生物多样性的恢复和发展。

（二）水土流失防治措施

植物措施

植被恢复：在项目施工结束后，及时对施工迹地进行植被恢复，选择适宜当地生长的乡土植物进行种植，提高植被覆盖率，减少水土流失。植被恢复应根据不同的立地条件和生态功能要求，采用乔、灌、草相结合的方式进行配置，形成稳定的生态群落。

临时防护措施

覆盖措施：在施工过程中，对裸露的地面、堆土场等采用防尘网、苫布等进行覆盖，减少雨水对土壤的直接冲刷，防止水土流失。覆盖材料应具有良好的抗风、防雨性能，确保覆盖效果。

拦挡措施：在堆土场、弃渣场等周边设置临时拦挡设施，如沙袋墙、土工格栅等，防止土石滚落和流失。拦挡设施应根据堆土高度和坡度进行合理设计和设置，确保其稳定性和防护效果。

（三）大气污染防治措施

施工扬尘控制

洒水降尘：在施工场地内保持地面湿润，减少扬尘产生。

车辆运输管理：加强对施工车辆的管理，运输物料时，必要时采用密闭式车辆或加盖篷布，防止物料遗撒。

机械废气排放控制：选用符合国家排放标准的施工机械设备，并定期对其进行维护保养，确保设备处于良好运行状态，减少废气排放。对于老旧、高污染的机械设备，应进行升级改造或淘汰更新。在施工过程中，合理安排施工机械的作业时间和作业强度，避免长时间怠速运转，降低机械废气排放。

（四）水污染防治措施

生活污水处理：在施工营地设置生活污水处理设施，如化粪池、一体化污水处理设备等，对施工人员产生的生活污水进行处理。生活污水经处理达到排放标准后，可用于场地绿化或周边农田灌溉，实现水资源的循环利用。定期对生活污水处理设施进行维护和管理，确保其正常运行。

保护地表水体：在项目施工过程中，严禁向河流、湖泊、水库等地表水体排放施工废水和生活污水，严禁倾倒垃圾、废渣等废弃物。加强对施工场地周边地表水体的监测，如发现水体污染，应及时采取措施进行治理，并追究相关责任。

（五）土壤污染防治措施

施工过程土壤保护：在施工过程中，尽量减少对土壤的扰动和破坏，避免随意堆放施工材料和废弃物。对于可能造成土壤污染的施工活动，如油漆、涂料的使用，应采取有效的防护措施，防止物料泄漏污染土壤。施工结束后，及时清理施工场地，恢复土壤原状。

土壤污染监测与修复：定期对项目区土壤环境质量进行监测，重点监测土壤中的重金属、有机物等污染物含量。如发现土壤污染，应及时分析污染原因，制定土壤污染修复方案，采用物理、化学或生物修复等方法进行治理，确保土壤环境质量符合相关标准要求。

（六）环境风险防范措施

制定环境应急预案：结合项目特点和可能存在的环境风险，制定详细的环境应急预案，明确应急组织机构、职责分工、应急响应程序、应急处置措施等内容。环境应急预案应定期进行演练和修订，确保其科学性和有效性。

环境风险源管理：对项目实施过程中的环境风险源进行识别和评估，如易燃易爆物品储存区、危险化学品使用场所等。针对不同的环境风险源，制定相应的风险防范措施，加强管理和监控，防止环境风险事故的发生。

应急物资储备：配备必要的应急物资和设备，如灭火器、消防沙、急救药品、防护用品、监测仪器等，并定期进行检查和维护，确保应急物资和设备处于良好状态，随时可投入使用。

应急培训与演练：定期组织项目管理人员和施工人员参加环境应急培训，学习环境风险防范知识和应急处置技能。按照环境应急预案要求，定期开展应急演练，检验和提高应急响应能力，确保在发生环境风险事故时能够迅速、有效地进行处置，减少环境污染和生态破坏。

通过建立完善的环境保护管理体系和实施有效的环境保护措施，本项目将在实现林业草原生态保护恢复目标的同时，最大限度地减少对环

境的影响，为区域生态环境的可持续发展做出积极贡献。在项目实施过程中，我们将不断总结经验，持续改进环境保护工作，确保项目的环境效益得到充分发挥。

（六）安全保护措施

草原围栏安装安全管理体系



草原围栏作为维护草原生态平衡、防止牲畜过度啃食的关键设施，其安装过程中的安全管理至关重要。一个健全的草原围栏安装安全管理体系，不仅能够保障施工人员的生命安全，还能确保围栏的稳固性和持久性，从而有效保护草原资源。该体系涵盖了从管理制度的完善到管理人员岗位责任的明确，再到安全教育制度的健全，以及运输和实施现场的安全技术管理等多个层面。通过全面而细致的管理措施，旨在构建一个无死角的安全防护网，为草原围栏的安装工作提供坚实的保障。

安全管理体系健全

在草原围栏安装过程中，构建一套健全的安全管理体系至关重要。这一体系不仅涵盖了全面的安全管理制度，而且融入了严谨的安全监督

与评估机制，以及具备持续改进与优化的能力。只有确保这三个方面的健全与完善，才能为草原围栏安装工作提供强有力的安全保障。

安全管理制度的完善

安全管理制度在草原围栏安装安全管理体系中扮演着基石的角色。它不仅涵盖了针对草原围栏安装工作的特定安全操作规程，还建立了明确的安全责任制度，确保每一位参与者都清楚自己的安全职责。此外，还包括定期的安全检查制度，以确保围栏安装过程中的安全隐患能够得到及时发现和消除。这些制度的制定必须基于草原围栏安装的实际需求和潜在风险进行量身定制，既要符合行业规范，又要具备实际操作性。这样，才能在确保工作顺利进行的同时，最大限度地保障人员的安全。

安全监督与评估机制

为确保草原围栏安装过程中的安全管理制度得到有效执行，必须建立一套完善的安全监督与评估机制。这一机制通过多种方式，如定期进行现场检查、随机抽查以及专项审计等，对围栏安装过程中的安全状况进行全面、细致的监督。这些监督方式不仅能够及时发现和纠正存在的问题，还能够为持续改进提供有力的依据。同时，通过建立有效的安全评估机制，可以及时发现并纠正存在的安全隐患，确保草原围栏安装工作的顺利进行。

表格：安全管理体系评估表（基础框架）

评估项目	评估内容	评估标准	现状评估	改进建议
安全管理制度	安全操作规程	符合行业规范，具备实际操作性	_	_
安全监督与评估	现场检查	定期进行，全面细致	_	_
机制	随机抽查	随机进行，确保制度执行	_	_
持续改进与优化	制度修订	定期修订，适应变化	_	_

表格：安全管理体系评估表（示例填充）

评估项目	评估内容	评估标准	现状评估	改进建议
安全管理制度	安全操作规程	符合行业规范，具备实际操作性	完善，操作性强	定期复审，保持更新
	安全责任制	明确各参与者安全职责	明确，责任到人	加强培训，提高责任意识

	度			
	安全检查制度	定期检查，隐患及时发现与消除	执行良好，隐患少	增加突击检查，确保无死角
安全监督与评估	现场检查	定期进行，全面细致	频次适中，效果显著	引入第三方评估，增加客观性
机制	随机抽查	随机进行，确保制度执行	抽查频繁，执行有力	扩大抽查范围，提高覆盖面
	专项审计	对关键环节进行深入审计	审计深入，问题发现及时	加强审计结果的应用，促进整改
持续改进与优化	制度修订	定期修订，适应变化	修订及时，适应性强	关注新技术、新法规，及时融入
	安全管理理念	引入先进理念，提升管理水平	理念先进，管理高效	加强内部交流，分享最佳实践
	安全技术	引入先进技术，提升安全性能	技术先进，效果显著	持续关注新技术发展，保持领先

	手段			
	人员专业素养	提升管理人员专业素养	素养较高，能力较强	加强培训，提高专业技能和管理能力

持续改进与优化

草原围栏安装安全管理体系并非一成不变，而是需要随着技术进步、环境变化以及管理经验的积累而持续改进与优化。这包括定期修订安全管理制度，引入先进的安全管理理念和技术手段，以及提升安全管理人员的专业素养。只有这样，才能确保草原围栏安装工作在安全、高效的环境中进行。通过不断优化安全管理流程和提升安全管理水平，可以进一步提高草原围栏安装工作的质量和效率，为相关企业和机构创造更多的经济效益和社会效益。

管理人员岗位责任明确

在草原围栏安装的安全管理体系中，管理人员岗位责任的明确与落实具有举足轻重的地位

。这一体系的有效运作，离不开管理人员对各自岗位职责的深刻理解和充分履行。为了确保草原围栏安装过程的安全、规范和高效，管理人员需要承担多重关键责任。

岗位责任划分与界定

针对草原围栏安装工作的特点，包括但不限于工程规模、复杂程度、地理环境等因素，科学合理地划分管理人员的岗位责任。例如，安全监督岗位负责全程监督围栏安装作业的安全规程执行情况，确保所有操作符合国家相关安全标准；技术指导岗位需对安装人员进行专业技能培训和技术支持，保证工程质量；现场管理岗位则需负责施工

进度、物料调配、人员协调等工作，保障工程顺利进行；而应急处理岗位则需预先制定应急预案，并在遇到突发情况时迅速响应，有效解决各种可能出现的风险和问题。同时，要对各个岗位的责任进行明确界定，避免职责模糊带来的管理漏洞和推诿现象，确保每个岗位都有清晰的责任边界和工作内容。

责任落实与考核机制

为了确保管理人员能够切实履行各自的职责，必须建立健全责任落实与考核机制。首先，要制定详细且可操作性强的岗位职责清单，明确规定每个岗位的具体任务和预期成果。其次，实施严格的定期检查制度，通过实地考察、文档审查、员工访谈等方式，对管理人员的工作表现进行客观公正的评估。再者，建立完善的绩效考核体系，将岗位职责履行情况与个人薪酬、晋升机会紧密挂钩，激励管理人员积极投入工作。此外，针对工作中出现的重大失误或违法行为，要坚决实行责任追究制度，确保每位管理人员都能为其决策和行为承担应有的责任。

岗位培训与能力提升

面对日新月异的草原围栏安装技术和行业要求，管理人员必须不断更新知识技能以适应新挑战。因此，定期开展岗位培训和能力提升活动至关重要。这些培训活动应涵盖广泛的主题，包括但不限于最新的安全操作规程、先进的管理理念和方法、应急处理技能等。通过邀请行业专家授课、分享成功案例、模拟实战演练等多种形式，不断提升管理人员的专业素养和管理能力。同时，鼓励管理人员自主学习和深造，提供充足的学习资源和时间支持，让他们可以通过参加各类专业研讨会、进修课程等途径持续提升自身的综合素质。此外，还可以通过建立激励机制促进管理人员对学习的热情和投入度，如设立奖学金、提供职业发展机会等措施，促使管理人员不断追求卓越，为草原围栏安装安全管理体系的持续优化和完善贡献力量。



管理人员岗位责任框架

安全教育制度健全有效

安全教育制度在草原围栏安装作业中扮演着至关重要的角色，它构成整个安全管理体系的基石。该制度的核心理念在于通过系统化、科学化的培训方式，不断提升全体围栏安装人员以及相关从业者的安全防范意识和实际操作技能，从而切实降低安全事故发生的可能性，保障生产作业的安全有序进行。只有当每个人的安全意识得到普遍提高，才能从根本上预防各类安全事故的发生，确保草原围栏安装工作的可持续发展。

安全教育培训内容

安全教育培训内容应涵盖草原围栏安装过程中的各个方面。首先，需要深入浅出地讲解国家及地方关于草原围栏安装的安全法规，确保每一位参与者都清楚了解并遵守相关规定。其次,针对具体的操作流程和规程进行详细解读，让每位学员明确每一步操作的目的、方法以及可能存在的风险点，提高他们的操作规范性，减少因误操作导致的事故。同时，分享草原围栏安装中的典型事故案例，通过对这些案例的深度剖析，揭示事故发生的原因、造成的危害，并从中提炼出宝贵的经验教训，让学员从中汲取教训，增强安全防范意识。针对草原围栏安装过程中可能遇到的各种突发状况，组织进行模拟演练，使学员掌握应急处理技能，提高应对突发事件的能力。

教育培训方式与频率

为了确保安全教育培训的效果达到最佳状态，必须采用灵活且多元化的培训方式，适应不同学员的需求和特点。集中授课是一种高效、系统的培训方式，可以定期组织专家或经验丰富的工作人员进行集中讲解，确保学员能够全面、准确地理解课程内容。现场示范是一种直观、生动的培训方式，通过实地操作演示，让学员亲眼见证正确的操作方法和安全防护措施，加深印象。模拟演练是一种实践性强、互动性高的培训方式，通过模拟实际工作场景，让学员亲身体验并掌握应急处理技能。在线学习是一种灵活、便捷的培训方式，学员可以根据自己的时间和节奏进行自主学习，反复学习课程内容，加深理解。同时，根据岗位特点制定针对性的培训计划，确保不同岗位的人员都能够得到最适合自己的培训内容和方式。建立合理的培训频率也是非常重要的。根据实际情况，制定长期的培训计划，确保培训工作的持续性和有效性。同时,根据学员的反馈和需求变化及时调整培训计划，确保培训内容始终保持与时俱进。

教育效果评估与反馈

安全教育培训结束后，必须对培训效果进行全面、深入地评估与反馈。通过组织考试、考核、问卷调查等多种方式，全面了解参训人员对所学内容的掌握情况以及培训效果。对于考试或考核不合格的人员，应及时进行再次培训或辅导，确保他们真正掌握所需知识和技能。针对培训过程中发现的问题和不足，应及时进行总结和反馈。通过分析问题原因和影响范围，提出相应的整改措施和建议。同时将反馈结果及时传递给相关部门和人员，督促他们落实整改措施并持续改进培训工作。为了确保安全教育培训的效果达到最佳状态并不断提升培训质量。定期开展跟踪评估与反馈工作是非常重要的。通过定期跟踪评估与反馈工作对参训人员的安全意识和操作技能进行持续跟踪观察和评估更新培训内容和方法使培训工作始终保持与时俱进同时建立有效的反馈机制鼓励参训人员及时反馈培训过程中的问题和建议

以便对培训工作进行持续改进和提升从而更好地服务于草原围栏安装安全管理工作为企业的可持续发展提供有力保障

运输安全技术管理

在草原围栏安装项目中，运输环节的安全管理是不可或缺的重要组成部分。为了确保整个围栏安装项目的顺利进行，必须对运输车辆和设备进行全面细致的安全检查，合理规划运输路线并进行风险评估，同时制定应急预案与紧急响应措施，以应对可能出现的各种突发状况。以下是对这些关键环节的具体阐述：

运输车辆与设备安全检查

在草原围栏安装前，对运输车辆和设备进行全面深入的安全检查至关重要。这一步骤旨在确保所有运输车辆均处于良好的工作状态，包括但不限于车辆的制动系统、转向系统、灯光系统、轮胎磨损状况以及油液水位等关键部件。此外，对于承载围栏材料的运输车辆，特别需要核实其装载能力是否满足运输要求，避免因超载导致的安全隐患；检查车辆的安全防护措施是否完备，如防护网、警示灯、反光条等，以提醒其他车辆注意避让，降低交通事故的风险。对于发现的存在安全隐患的车辆和设备，必须立即停止使用并进行维修或更换，确保运输过程的安全可靠。

运输路线规划与风险评估

在草原围栏安装过程中，运输路线的选择和规划是一项至关重要的任务。需要充分考虑草原地形的复杂多变、气候条件的多样性以及交通状况的实时动态等因素，以科学合理地规划出一条既满足运输需求又确保安全可靠的运输路线。同时，仅仅依赖单一的路线选择并不足够，更重要的是对规划出的运输路线进行详尽而全面的风险评估。这一步骤旨在深入识别和分析可能存在的安全隐患和风险因素，如复杂地形导致的通行困难、恶劣气候条件对运输的影响、交通状况的拥堵或不畅等，为后续制定针对性的防范措施提供科学依据，从而确保运输过程的安全可控。

应急预案与紧急响应措施

为了确保运输过程的安全可控，必须制定应急预案与紧急响应措施。这些措施涵盖了运输车辆在行驶过程中出现故障时的故障处理流程、发生交通事故时的应急处理方案，以及面对突发事件如突发公共卫生事件、自然灾害或其他紧急情况下的紧急疏散预案等。通过定期进行演练和培训，不仅可以提高全体人员对突发事件的应对能力和快速反应速度，还能增强团队成员之间的协同配合能力，从而最大限度地降低潜在风险和损失。

实施现场安全技术管理

草原围栏安装现场是安全管理的重点区域，为了确保现场安全可控，需要采取一系列措施来加强现场安全技术管理。

现场安全布局与标识

草原围栏安装现场应进行合理布局，确保人员、设备、材料的有序摆放和流动。人员应该佩戴明显的安全防护用品，如安全帽、防护服等，以避免在狭窄的工作区域发生碰撞和挤压事故。还应设置明显的安全标识和警示标志，如安全警示牌、警示灯等，提醒人员注意安全事项和操作规程。这些标识应该醒目、清晰，能够引起人员的注意和重视。

安全操作规程与监督

为了确保草原围栏安装现场的安全，必须制定详细的安全操作规程，包括工作前的准备、工作中的注意事项、工作后的清理等各个环节。规程应该明确规定人员的行为规范和操作要求，如如何正确使用工具、如何避免电气危险等。为了确保规程的有效执行，必须建立监督机制。

通过定期检查、随机抽查等方式，对现场人员的操作行为进行全面监督。对于违反操作规程的行为，应及时进行纠正和处罚，确保现场安全的有序进行。同时也要对人员进行安全培训和教育，提高他们的安全意识和操作技能。

安全隐患排查与整改

草原围栏安装现场应定期开展安全隐患排查工作。通过全面检查、专业评估等方式，及时发现并整改存在的安全隐患。在排查过程中，应注意发现的问题和隐患，及时采取措施加以整改。对于不能立即整改的隐患，应制定整改计划和措施，明确整改时间和责任人，并加强监督和跟踪。同时建立隐患排查与整改的长效机制，确保隐患排查工作的持续改进和提升。

防护防范措施

在草原围栏安装过程中，必须采取严密的防护防范措施，以保障施工现场人员和周边环境的安全。这些措施涵盖了个人防护装备的配置与使用、环境防护策略以及紧急救援与医疗支持等多个层面。

个人防护装备的配置与使用

根据草原围栏安装的工作特点和需求，为所有现场人员配备齐全的个人防护装备。这包括但不限于安全帽、防护服、防护手套、防护眼镜以及防尘口罩等。安全帽可以有效防止头部受伤，防护服能够保护身体免受刺伤、割伤或化学物质的侵害，防护手套则能防止手部受伤，而防护眼镜则能防止飞溅物或尘埃进入眼睛。此外，还应加强对个人防护装备使用的培训，确保每一位现场人员都能正确佩戴和使用这些装备，从而最大限度地降低潜在的安全风险。

环境防护措施

在草原围栏安装过程中，应采取一系列有效的环境防护措施。这包括减少噪音污染、防止扬尘污染、保护草原植被等方面。为了减少噪音污染，可以尽量选择低噪音的施工设备和工艺，并合理安排施工时间，避免对周边居民造成影响。为了防止扬尘污染，可以在施工现场铺设防尘网、定期洒水降尘等措施，避免因施工导致扬尘污染。为了保护草原植被，可以在施工过程中采取避免破坏草原植被的措施，如合理规划施工路线、选择合适的施工设备等。同时，加强植被恢复工作，对破坏的草原植被进行修复和重建。

紧急救援与医疗支持

为了确保草原围栏安装过程中的紧急救援和医疗支持能力，应建立完善的救援体系和医疗支持机制。这包括配备专业的救援人员和设备、建立紧急联络渠道、制定救援预案等方面。专业的救援人员可以在紧急情况下迅速反应，采取有效的救援措施，降低事故损失。同时，与当地医疗机构建立合作关系，确保在紧急情况下能够及时获得医疗支持和救治。此外，还应定期组织救援演练和培训，提高救援人员的应急救援能力。

（七）售后服务计划措施

阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态系统围栏安装项目售后服务计划



阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态系统，作为一片广袤而重要的生态区域，其围栏安装项目的成功不仅关乎草原的保护与利用，更直接影响到当地生态平衡与牧民生活。为了确保这一关键项目在完成后能够持续稳定运行，一个全面、高效的售后服务计划显得尤为重要。该计划旨在通过一系列精心设计的措施，从响应时间、服务质量、质保与维护期承诺，到实施与保障策略，全方位覆盖项目售后的每一个环节，确保围栏设施在任何时候都能发挥最佳效能。这不仅是对项目

本身负责，更是对阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态系统生态及牧民福祉的深远考量。

售后服务计划与承诺概述

阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态系统围栏安装项目，作为一项具有深远意义的基础设施建设工程，其售后服务计划的制定与执行显得尤为关键。本售后服务计划不仅涵盖了常规的维修保养、技术支持等核心内容，更针对项目的特性进行了深度定制和优化设计，旨在构建一套全面、高效、专业的售后服务体系，确保整个围栏设施长期稳定、安全可靠地运行，并有效提升客户满意度。

在阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态系统围栏安装项目的售后服务计划中，我们详细规划了定期巡查检测、快速应急响应、维修保养服务、技术支持与培训、质量保证与持续改进等关键环节。我们将严格按照计划执行各项任务，确保围栏设施始终保持良好的运行状态，及时发现并解决潜在问题。同时，我们将秉持客户至上的服务理念，始终站在客户的角度思考问题，积极响应客户的需求和反馈，致力于提供超越期待的服务体验。

我们郑重承诺，在项目顺利完成并交付使用后，将持续关注并保障围栏设施的正常运行，不断优化和完善售后服务流程，以确保阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态系统围栏安装项目的长期稳定与高效运行。我们坚信，只有通过持续的努力和不断的改进，才能真正实现客户满意度的持续提升，为项目的成功实施奠定坚实的基础。

表格：售后服务计划与承诺概览表

售后服务环节	描述	执行计划
定期巡查检测	对围栏设施进行全面检查，确保设施无损坏、无松动	每月一次全面巡查，记录并及时处理异常情况
快速应急响应	在设施出现故障或异常情况时，迅速响应并处理	24小时内响应，48小时内到场处理
维修保养服务	对围栏设施进行必要的维修和保养，确保设施运行良好	定期检查并更换损坏部件，进行必要的保养工作

技术支持与培训	提供技术指导和培训，确保客户能够正确使用和维护设施	提供操作手册，定期举办培训课程，解答客户疑问
质量保证	对围栏设施的质量进行保证，确保设施符合相关标准和要求	承诺设施质量符合国家标准，提供质量保修服务
持续改进	不断优化和完善售后服务流程，提升客户满意度	定期收集客户反馈，分析并改进服务流程

表格：售后服务承诺细节表

承诺内容	具体措施	达成目标
保障设施运行	定期巡查、快速响应、专业维修	确保围栏设施长期稳定运行
提升服务质量	提供专业培训、优化服务流程	提高客户满意度，增强客户信任
保证设施质量	严格质量控制，提供质量保修	确保设施符合国家标准和客户需求
持续改进服务	定期收集反馈，分析改进	不断优化服务，提升竞争力
客户至上服务	站在客户角度思考，积极响应需求	提供超越期待的服务体验，建立良好客户关系

售后服务响应时间保障


快速响应机制建立

为确保售后服务的高效性，我们建立了快速响应机制。该机制包括设立专门的售后服务热线，确保24小时不间断接听客户咨询与报修电话。同时，我们还将通过电子邮件、在线客服等多种渠道，为客户提供便捷的反馈途径。一旦收到客户反馈，我们将立即启动响应程序，确保在最短时间内为客户提供解决方案。

应急响应流程与标准

针对可能出现的紧急情况，我们制定了详细的应急响应流程与标准。当围栏设施发生严重故障或事故时，我们将立即启动应急预案，组织专业人员进行现场抢修。同时，我们还将根据故障情况，及时调

配备用设备或材料，确保围栏设施在最短时间内恢复正常运行。此外，我们还将对故障原因进行深入分析，制定有效的预防措施，避免类似问题的再次发生。

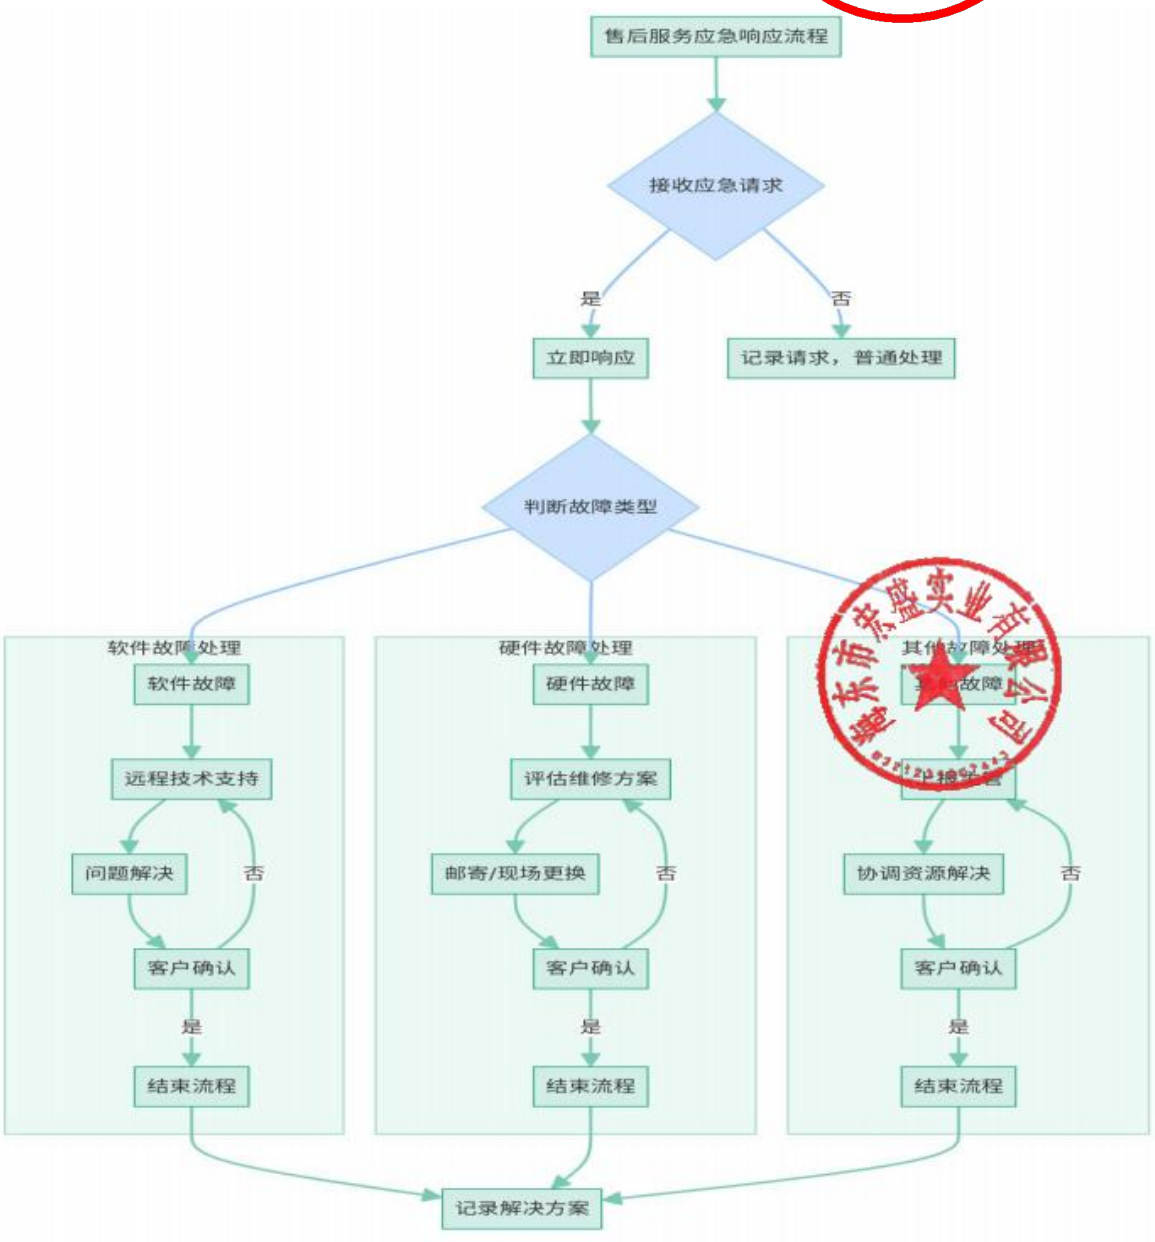

售后服务应急响应流程

售后服务质量保障措施

服务质量标准制定


为提高售后服务质量，我们制定了严格的服务质量标准。该标准不仅明确了售后服务人员应遵循的行为准则，还规定了具体的服务响应时间、服务态度、问题解决效率等关键指标。这些标准的设定，旨在确保售后服务人员能够为客户提供专业、高效的服务。同时，我们还会定期对服务质量进行评估与考核，通过客户的反馈和评价，及时发现并改进服务中的不足之处，持续优化服务流程，提升客户满意度。

服务人员培训与考核

为确保售后服务人员的专业水平和服务能力，我们建立了完善的培训与考核机制。我们定期组织售后服务人员参加专业培训课程，涵盖产品知识、售后服务流程、沟通技巧、问题解决能力等方面。这些培训课程旨在提升服务人员的专业技能和服务意识，使其能够更好地满足客户的需求。同时，我们还会通过定期考核，对服务人员的服务质量进行评估，确保其能够胜任售后服务工作。考核结果将作为晋升、奖励的重要依据，激励服务人员不断提升自己的服务水平。

服务质量监督与反馈

为提高售后服务质量，我们建立了完善的服务质量监督与反馈机制。我们定期对售后服务过程进行监督检查，确保服务人员能够严格按照服务标准进行操作。监督内容包括服务响应时间、服务态度、问题解决效率等方面，以确保服务质量的稳定性和可靠性。同时，我们还会积极收集客户的反馈意见，通过调查问卷、电话回访等方式，了解客户对售后服务的满意度和需求，对服务中的问题进行及时整改，不断提升服务质量。我们还会对客户的反馈意见进行深入分析，找出问题的根源和解决方案，进一步完善售后服务体系。

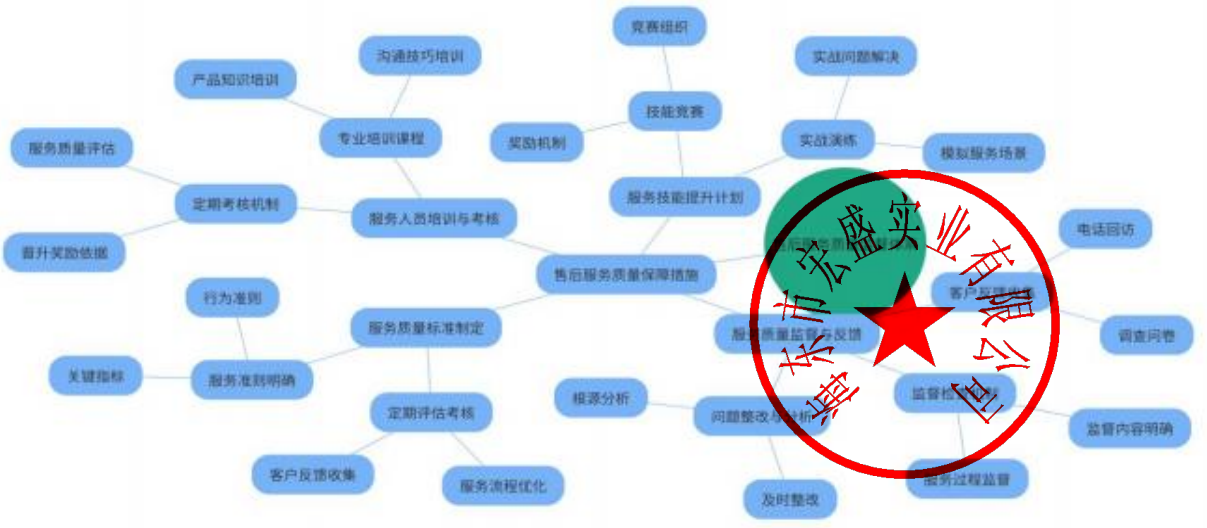

售后服务质量监督体系

质保期与维护期服务承诺

质保期服务内容

在质保期内，我们将为客户提供全方位、无死角的围栏设施维修与保养服务。具体而言，若因围栏设施生产或安装过程中的质量问题，导致设施出现故障或损坏，我们承诺将进行免费维修与更换。为确保围栏设施始终保持最佳性能，我们还将定期安排专业团队进行设施检查与维护，确保其稳定、高效地运行。在此期间，我们的技术服务团队全天候待命，一旦发生任何质量问题或故障，都将迅速响应并采取有效措施解决，提供全方位、无死角的保障。

维护期服务安排

在维护期内，我们继续秉承专业、高效的服务理念，为客户的围栏设施提供全面而细致的维修与保养支持。根据围栏设施的实际使用情况，我们将制定针对性强、操作性强的维护计划，并严格按照计划执行，确保围栏设施在全生命周期内都能保持优良的运行状态。同时，我们致力于为客户提供超越预期的技术支持与培训服务，涵盖围栏设施的基本操作、日常维护方法以及常见故障排查等内容，帮助客户更熟练地使用和维护设施，有效提升其使用效率和满意度

服务期限

我们致力于为客户提供持续、稳定的售后服务保障，并承诺在一定的服务期限内提供优质的售后服务。

售后服务实施与保障策略

售后服务团队建设

为确保售后服务的顺利实施，我们组建了一支专业且高效的售后服务团队。该团队汇聚了众多经验丰富、技术精湛的技术人员和客服人员，他们不仅具备扎实的专业知识，还拥有丰富的实践经验，能够为客户提供包括技术咨询、故障排除、维修保养等在内的全方位售后服务支持。为了确保团队的服务水平与时俱进，我们还将定期对团队成员进行系统化、专业化的培训，并设置严格的考核机制，让每一位团队成员都能不断提升自身的业务能力和服务水平。

售后服务资源调配

为确保售后服务的及时响应和高效处理，我们构建了一套完善的售后服务资源调配体系。针对可能出现的突发状况，如设备故障、系统异常或大规模维修需求等，我们能够在第一时间启动应急预案，并依据实际情况迅速调配由专业人员、必备工具和备用部件等组成的应急服务团队。我们会根据客户需求和故障情况，及时调配专业人员、设备和材料等资源，确保售后服务的高效实施。

售后服务持续改进机制

为持续提升售后服务质量并满足不断变化的市场需求，我们制定了严密的售后服务持续改进机制。这一机制的核心在于对售后服务过程进行系统化的总结与反思，通过对过往服务案例的深度剖析，识别出服务中的短板和待改进环节，并针对性地制定出一系列切实可行的优化措施。同时，我们主动出击，积极收集并分析客户的反馈意见和建议，以此作为优化服务流程、改进服务质量的重要依据。通过这一持续改进的过程，我们不断调整和完善服务标准与操作规程，旨在为客户提供更加贴心、高效且优质的售后服务保障。

附件20：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（一）单位负责人不为同一人声明

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

我公司郑重承诺：我公司单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系，我公司不同时参加同一合同项下的政府采购活动，如有虚假，我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明。

单位名称：海东市宏盛实业有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025年07月15日

（二）承诺函

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

我公司郑重承诺：我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不参加该采购项目的其他采购活动。如有虚假，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺

单位名称：海东市宏盛实业有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025年07月15日

（三）非联合体承诺书

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

我公司郑重承诺针对：**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育）（采购项目编号为：青海鼎新公招（货物）2025-017**项目中，我公司不以联合体方式参与投标。如有虚假，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺

单位名称：海东市宏盛实业有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025年07月15日

（四）人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力承诺

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

我公司郑重承诺针对：**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育）（采购项目编号为：青海鼎新公招（货物）2025-017**项目中，我公司具备建筑工程施工总承包贰级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。如有虚假，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺

单位名称：海东市宏盛实业有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025年07月15日

（五）材料真实性承诺

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

我公司郑重承诺针对：青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育）（采购项目编号为：青海鼎新公招（货物）2025-017项目中，我公司提供的所有材料真实、客观、准确、可靠，无伪造、编造和隐瞒。如有虚假，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺

单位名称：海东市宏盛实业有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025年07月15日

（投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查部分）

采购项目编号：青海鼎新公招（货物）2025-017

采购项目名称：青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育）

投 标 包 号：包六

投标单位：青海泽标建设工程有限公司（盖章）

2025 年 07 月 15 日

目录

附件 1：投 标 函……1

附件 2：法定代表人证明书……2

附件 3：法定代表人授权书……4

附件 4：投标人承诺函……5

附件 5：投标人诚信承诺书……6

附件 6：投标人资格证明文件……7

附件 7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……68

附件 8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……114

附件 9：无重大违法记录声明……227

附件 10：投标保证金证明（若为保函格式自拟）……286

附件 1：投 标 函

投标函

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

我们收到青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复 项目(2024-2025)退化草原修复工程(围栏封育)(采购项目编号为:青海鼎新 公招(货物)2025-017;投标包号：（包六）的招标文件，经研究，法定代表人**李积英、总经理**（姓名、职务）正式授权**李积英、总经理**（委托代理人姓名、职务）代表投标人**青海泽标建设工程有限公司、青海省西宁市城中区南川东路 85 号 40 号楼 2 单元 261 室**（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2. 投标有效期自开标之日起 60 天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签订合同时的，将承担法律后果。

3. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：**青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室**

邮编：**810000**

电话：**0971-6249989**　　传真：**0971-6249989**

法定代表人姓名：**李积英**　　职务：**总经理**

投标单位：青海泽标建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李积英(签字或盖章)

2025 年 07 月 15 日

附件 2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

李积英（法定代表人姓名）现任我单位 总经理 职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别： 女 年龄： 31 岁 民族： 汉族

地址： 青海省乌兰县柯柯镇西村一社 162 号

身份证号码： 632822199311280022

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件



投标单位： 青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

建筑施工企业主要负责人

安全生产考核合格证书

编号:青建安A（2022）0002974



姓　　名:李积英

性　　别:女

出 生 年 月:1993年11月28日

企 业 名 称:青海泽标建设工程有限公司

职　　务:总经理(代总裁)

初次领证日期:2022年07月05日

有 效 期:2025年07月01日　　至 2028年07月05日

发 证 机 关:青海省住房和城乡建设厅

发 证 日 期:2025 年 07 月 01日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

附件 3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

青海泽标建设工程有限公司（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址**青海省西宁市城中区南川东路 85 号 40 号楼 2 单元 261 室**（公司地址）。**李积英**（法定代表人姓名）特授权**李积英**（委托代理人姓名）代表我单位全权办理青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育）（采购项目编号为：青海鼎新公招（货物）2025-017；投标包号：（包六）针对项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自 2025 年 07 月 15 日起至 2025 年 09 月 30 日止。

被授权人联系电话：18797097950

被授权人（委托代理人）签字或盖章：李积英 职务：**总经理**

授权人（法定代表人）签字或盖章：李积英 职务：**总经理**

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件





投标单位：青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

附件 4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

关于贵方 2025 年 07 月 15 日青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育）（采购项目编号为：青海鼎新公招（货物）2025-017；投标包号：（包六）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表**青海泽标建设工程有限公司**（投标人名称），在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2. 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与招标人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3. 我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4. 我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5. 针对本项目，我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6. 在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

7. 若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：青海泽标建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李积英（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

附件 5：投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加政府采购活动。

二、参加青海鼎新工程项目管理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标单位：青海泽标建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李积英（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

附件 6：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

资格证明材料包括：


（1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

公司组织机构框图

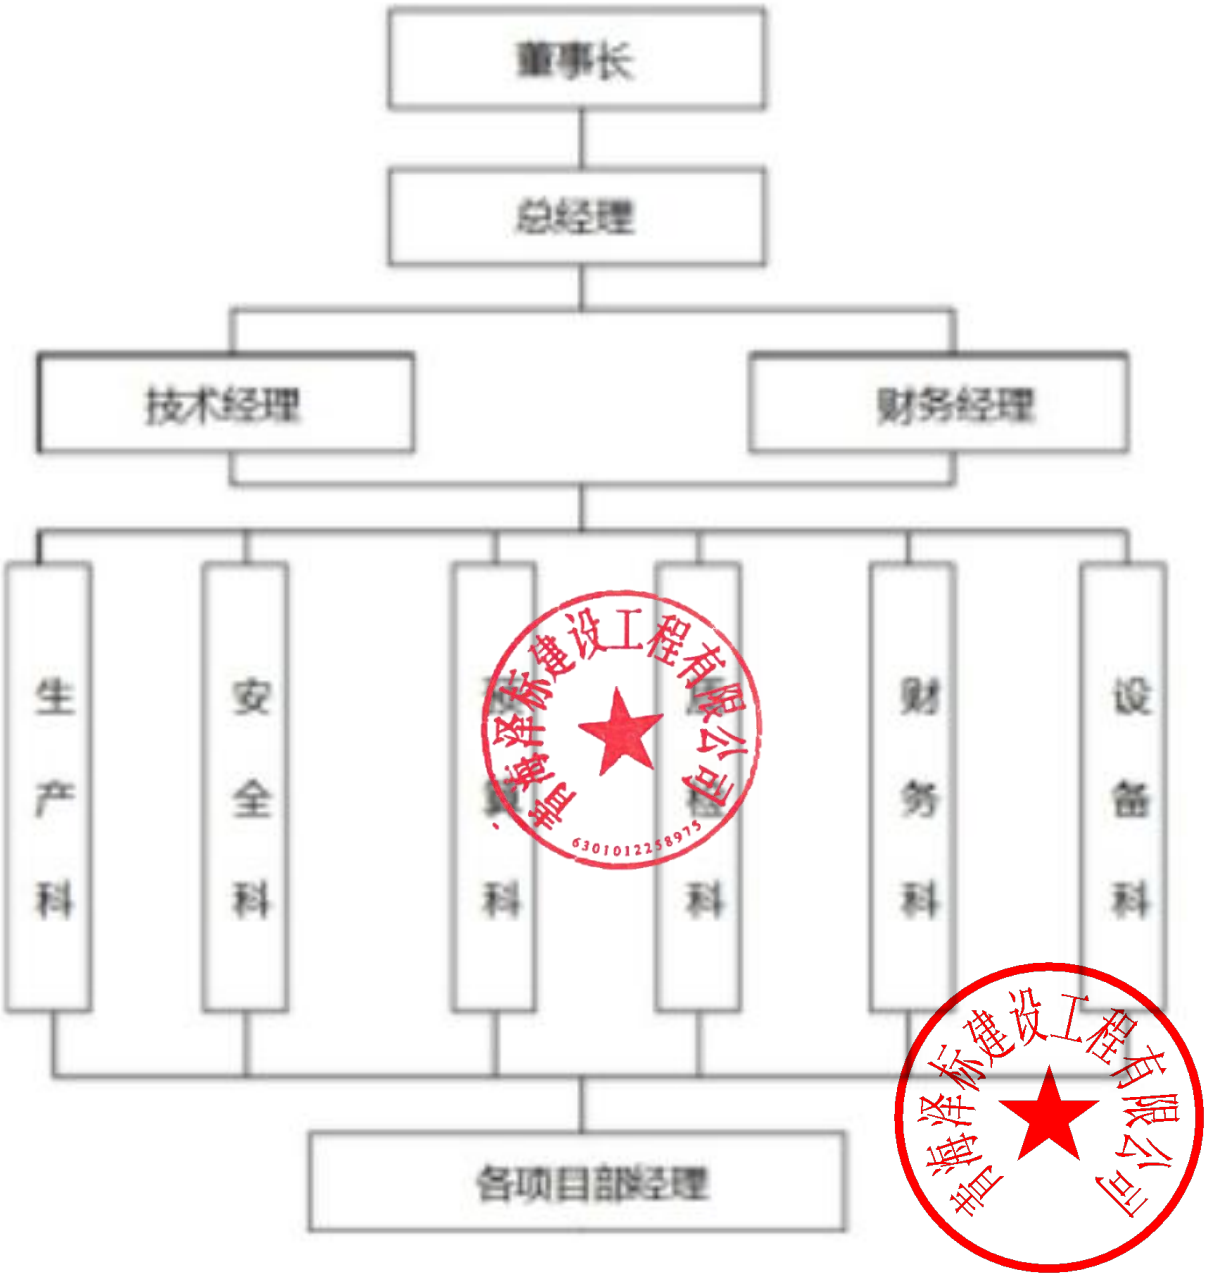

统一社会信用代码

91630100MA759T5Q75

营业执照

（副 本）

(1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　青海泽标建设工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　李积英

经营范围　许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；舞台工程施工；林木种子生产经营；草种生产经营；文物保护工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；五金产品零售；市政设施管理；城乡市容管理；机械设备销售；智能农机装备销售；人工造林；广告制作；节能管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；水环境污染防治服务；太阳能热利用产品销售；土壤污染治理与修复服务；建筑材料销售；水污染治理；玩具销售；水土流失防治服务；白蚁防治服务；日用品销售；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；汽车销售；停车场服务；花卉种植；礼品花卉销售；城市绿化管理；草种植；病虫害防治服务；房屋拆迁服务；牲畜销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；肥料销售；饮料销售；农用薄膜销售；塑料制品销售；充电桩销售；机动车充电销售；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；金属制品销售；消防器材销售；体育用品及器材零售；照相机及器材销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；饲料原料销售；饲料生产专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；办公用品销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；自然生态系统保护

注　册　资　本　伍仟万元整

成　立　日　期　2020年04月07日

住　　所　青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

登记机关　西宁市行政审批服务局

年　月　日

2023　11　02

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

营业执照复印件

登记通知书

（宁政批局）登字[2023]第 000635 号

青海泽标建设工程有限公司（市场主体名称）：

你单位提交的经营范围变更、章程备案登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

（登记机关盖章）

2023 年 11 月 02 日

注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

登记通知书

（宁政批局）登字[2023]第 000072 号

青海泽标建设工程有限公司（市场主体名称）：

你单位提交的经营范围变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

（登记机关盖章）

2023 年 07 月 14 日

注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

登记通知书

（宁市监）登字[2023]第 000743 号

青海泽标建设工程有限公司（市场主体名称）：

你单位提交的注册资本、股东出资额、经营范围、执行董事、经理、法定代表人变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

（登记机关盖章）

2023 年 03 月 31 日

注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

资质证书



建筑业企业资质证书

企业名称：青海泽标建设工程有限公司

详细地址：青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

统一社会信用代码：91630100MA759T5Q75　法定代表人：李积英

注册资本：5000万人民币　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D263040979　有效期：至2029年12月06日

资质类别及等级：

机电工程施工总承包贰级（2024/12/06至2029/12/06）
市政公用工程施工总承包贰级（2024/12/06至2029/12/06）
古建筑工程专业承包贰级（2024/12/06至2029/12/06）
钢结构工程专业承包贰级（2024/12/27至2029/12/06）
城市及道路照明工程专业承包贰级（2024/12/06至2029/12/06）
环保工程专业承包贰级（2024/12/06至2029/12/06）
建筑工程施工总承包贰级（2024/12/06至2029/12/06）
* * * * * *

发证机关：

2024年 12 月27 日

证书信息通过微信搜索“青海省建设云个人服务平台”小程序扫描二维码查询

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址http://jzsc.mohurd.gov.cn

统一社会信用代码：91630100M A759T5Q 75

安全生产许可证

编号：（青）JZ安许证字[2020]000038

企　业　名　称：青海泽标建设工程有限公司

法 定 代 表 人：李积英

单　位　地　址：青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

经　济　类　型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2023年05月30日　至 2026年06月04日

发证机关：青海省住房和城乡建设厅

发证日期：2023 年 05 月 30 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本存款账户信息

基本存款账户信息

账户名称：青海泽标建设工程有限公司

账户号码：63050137360700000179

开户银行：中国建设银行股份有限公司西宁上尕庄支行

法定代表人：
（单位负责人）：[illegible]英

基本存款账户编号：J8510014043503

建行西宁上尕庄支行

2023 年 09 月 15 日

林草种子生产经营许可证

许可证号：X63010320230004

名　　称	青海泽标建设工程有限公司	法定代表人	李积英
住　　所	青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室	生产地点	（只经营不生产）
生产经营种类	林木苗木 花苗	有效区域	城中区
		经营方式	批发 零售

有效期从 2023年 07月 28日至 2028年 07月 27日　发证机关盖章

发证日期 2023 年 07 月 28 日

企业简介

青海泽标建设工程有限公司，成立于2020年04月07日，注册资金为5000万元，公司现有职工56人。公司以发展为主题，以市场为导向，以效益为中心，以科技创新为根本，不断进行企业管理理念、管理制度、科学技术的创新，努力把企业建设成为技术高新化、经营规模化、管理集约化、效益高效化的工程施工为主的企业。

公司经营范围有：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；舞台工程施工；林木种子生产经营；草种生产经营；文物保护工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；五金产品零售；市政设施管理；城乡市容管理；机械设备销售；智能农机装备销售；人工造林；广告制作；节能管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；水环境污染防治服务；太阳能热利用产品销售；土壤污染治理与修复服务；建筑材料销售；水污染治理；玩具销售；水土流失防治服务；白蚁防治服务；日用品销售；林业有害生物防治服务；汽车销售；道路货物运输站经营；停车场服务；花卉种植；礼品花卉销售；城市绿化管理；草种植；森林防火服务；农作物病虫害防治服务；房屋拆迁服务；牲畜销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；肥料销售；化肥销售；农用薄膜销售；塑料制品销售；充电桩销售；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；办公设备销售；金属制品销售；消防器材销售；体育用品及器材零售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；饲料原料销售；饲料生产专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；办公用品销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；劳动保护

用品销售；承接总公司工程建设业务；数字视频监控系统销售；照明器具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

青海泽标建设工程有限公司是一个新兴的企业，一个有梦想的企业，一个正在高速成长的企业。我公司以“诚信为本、质量第一”的经营宗旨，牢固树立“没有质量就没有信誉，失去信誉就会失去市场”的思想，恪守质量是企业第一生命的承诺，努力拼搏，团结奋战，立足青海，面向全国，以锐意进取勇往直前的精神，努力为我国工程建设事业的发展做出贡献，为社会创造一批优质精品工程。

我公司遵循以“质量求生存，信誉求发展”的经营理念，以“团结、敬业、扎实、高效”为企业精神，始终坚持“安全第一、质量第一、信誉第一”的服务宗旨，以实力与诚信铸造一品工程，用财富和感恩回报社会各界的大力支持。

公司核心价值观：诚信务实 追求卓越！

战略定位：以打造工程品牌为基础，立足青海，面向全国，走向世界！

企业精神：凝心聚力，只争朝夕！

青海泽标建设工程有限公司

会员证书
青海泽标建设工程有限公司
青海省生态保护和建设协会
Qinghai Association of Ecological Construction
二〇二一年七月

企业信用评价AAA级信用企业

ENTERPRISE CREDIT EVALUATION

企业名称： 青海泽标建设工程有限公司

证书查询： 全国企业认证信息查询系统
CERTIFICATE QUERY www.qgrz.org.cn

证书公示： 中国招标投标网
CERTIFICATE PUBLIC www.cecbid.org.cn

报告公示： 全国企业信用报告公示系统
REPORT PUBLIC www.xybg.org.cn

信用官网： 信用中国
CREDIT WEBSITE www.creditchina.gov.cn

防伪查询

信易信用评级有限公司

全国企业认证信息查询系统

职业健康安全管理体系认证证书

编号：AWS-ZY22-S213

兹证明

青海泽标建设工程有限公司

统一社会信用代码：91630100MA759T5Q75

注册地址：青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

建立的职业健康安全管理体系符合

GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准

认证覆盖范围

建筑工程施工总承包、市政公用施工总承包、机电工程施工总承包、钢结构施工专业承包、古建筑工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、环保工程专业承包、生态环境治理，沙漠化治理，草原病虫鼠害防治，标识标牌制作及安装，机电设备，农机具，肥料，饵料，LED显示屏液晶等离子显示屏的生成，销售，租赁，安装及维修，网围栏及配套产品加工安装，畜牧基础设施建设，暖棚建设，牧草，绿化苗木种植销售。

发证日期：2022年09月20日

有效期至：2025年09月19日

本证书持有者的管理体系持续符合职业健康安全管理体系标准的条件下,认证有效期为3年。

并在网上www.aws-iso.com查询。本证书的有效性需经本中心通过定期的监督审核确认保持。

amazon 互认结果

亚马逊国际认证标准

AWS

Occupational Health And Safety Management System Certificate

No.: AWS-ZY22-S213

This Is To Certify That

Qinghai Zebiao Construction Engineering Co., Ltd

Unify the social credit code: 91630100MA759T5Q75

Registered address:Room 261, Unit 2, Building 40, No. 85, Nanchuan East Road, Chengzhong District, Xining City, Qinghai Province

The established occupational health and safety management system complies with

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018standard

Certification Coverage

General contracting of building engineering construction, general contracting of municipal public construction, general contracting of mechanical and electrical engineering construction, specialized contracting of steel structure construction, specialized contracting of ancient building engineering, specialized contracting of urban and road lighting engineering, specialized contracting of environmental protection engineering, ecological environment control, desertification control, prevention and control of grassland diseases, pests and rodents, production and installation of signs, mechanical and electrical equipment, agricultural machinery, fertilizer, bait, Generation, sales, leasing, installation and maintenance of LED LCD plasma display, processing and installation of fence and supporting products, construction of animal husbandry infrastructure, greenhouse construction, planting and sales of grass and green seedlings.

Date of issue: 2022.09.20

Valid until: 2025.09.19

Under the condition that the management system of the holder of this certificate continues to meet the standards of occupational health and safety management system, the certification is valid for 3 years.It can also be queried online at www.aws-iso.com. The validity of this certificate shall be confirmed and maintained by the center through regular supervision and review.

amazon 互认结果 UKAS QUALITY MANAGEMENT MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Amazon international certification standard

环境管理体系认证证书

编号：AWS-HJ22-E213

兹证明

青海泽标建设工程有限公司

统一社会信用代码：91630100MA759T5Q75

注册地址：青海省西宁市城中区南川东路285号40号楼2单元261室

建立的环境管理体系符合

GB/T24001-2016/ISO14001：2015标准

认证覆盖范围

建筑工程施工总承包、市政公用施工总承包、机电工程施工总承包、钢结构施工专业承包、古建筑工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、环保工程专业承包、生态环境治理，沙漠化治理，草原病虫鼠害防治，标识标牌制作及安装，机电设备，农机具，肥料，饵料，LED显示屏液晶等离子显示屏的生成，销售，租赁，安装及维修，网围栏及配套产品加工安装，畜牧基础设施建设，暖棚建设，牧草，绿化苗木种植销售。

发证日期：2022年09月20日

有效期至：2025年09月19日

本证书持有者的管理体系持续符合环境管理体系标准的条件下,认证有效期为3年。

并在网上www.aws-iso.com查询。本证书的有效性需经本中心通过定期的监督审核确认保持。

amazon 互认结果

亚马逊国际认证标准

Environmental Management System Certification

NO.: AWS-HJ22-E213

This Is To Certify That

Qinghai Zebiao Construction Engineering Co., Ltd

Unify the social credit code: 91630100MA759T5Q75

Registered address:Room 261, Unit 2, Building 40, No. 85, Nanchuan East Road, Chengzhong District, Xining City, Qinghai Province

The established environmental management system complies with

GB/T24001-2016/ISO 14001:2015standard

Certification Coverage

General contracting of building engineering construction, general contracting of municipal public construction, general contracting of mechanical and electrical engineering construction, specialized contracting of steel structure construction, specialized contracting of ancient building engineering, specialized contracting of urban and road lighting engineering, specialized contracting of environmental protection engineering, ecological environment control, desertification control, prevention and control of grassland diseases, pests and rodents, production and installation of signs, mechanical and electrical equipment, agricultural machinery, fertilizer, bait, Generation, sales, leasing, installation and maintenance of LED LCD plasma display, processing and installation of fence and supporting products, construction of animal husbandry infrastructure, greenhouse construction, planting and sales of grass and green seedlings.

Date of issue: 2022.09.20

Valid until: 2025.09.19

Under the condition that the management system of the holder of this certificate continues to meet the standards of environmental management system, the certification is valid for 3 years. It can also be queried online at www.aws-iso.com. The validity of this certificate shall be confirmed and maintained by the center through regular supervision and review.

amazon 互认结果

Amazon international certification standard

AWS

质量管理体系认证证书

编号：AWS-ZL22-Q213

兹证明

青海泽标建设工程有限公司

统一社会信用代码：91630100MA759T5Q75

注册地址：青海省西宁市城中区南工东路85号40号楼2单元261室

建立的质量管理体系符合

GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准
GB/T50430-2017质量管理规范

认证覆盖范围

建筑工程施工总承包、市政公用施工总承包、机电工程施工总承包、钢结构施工专业承包、古建筑工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、环保工程专业承包、生态环境治理，沙漠化治理，草原病虫鼠害防治，标识标牌制作及安装，机电设备，农机具，肥料，饵料，LED显示屏液晶显离子显示屏的生成，销售，租赁，安装及维修，网围栏及配套产品加工安装，畜牧基础设施建设，暖棚建设，牧草，绿化苗木种植销售。

发证日期：2022年09月20日

有效期至：2025年09月19日

本证书持有者的管理体系持续符合质量管理体系标准的条件下,认证有效期为3年。

并在网上www.aws-iso.com查询。本证书的有效性需经本中心通过定期的监督审核确认保持。

amazon 互认结果 UKAS QUALITY MANAGEMENT MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

亚马逊国际认证标准

AWS

Quality Management System Certification

No.: AWS-ZL22-Q213

This Is To Certify That

Qinghai Zebiao Construction Engineering Co., Ltd

Unify the social credit code: 91630100MA759T5Q75

Registered address:Room 261, Unit 2, Building 40, No. 85, Nanchuan East Road, Chengzhong District, Xining City, Qinghai Province

The established quality management system complies with

GB/T19001-2016/ISO 9001:2015standard
GB/T50430-2017Quality management standard

Certification Coverage

General contracting of building engineering construction, general contracting of municipal public construction, general contracting of mechanical and electrical engineering construction, specialized contracting of steel structure construction, specialized contracting of ancient building engineering, specialized contracting of urban and road lighting engineering, specialized contracting of environmental protection engineering, ecological environment control, desertification control, prevention and control of grassland diseases, pests and rodents, production and installation of signs, mechanical and electrical equipment, agricultural machinery, fertilizer, bait, Generation, sales, leasing, installation and maintenance of LED LCD plasma display processing and installation of fence and supporting products, construction of animal husbandry infrastructure, greenhouse construction, planting and sales of grass and green seedlings

Date of issue: 2022.09.20

Valid until: 2025.09.19

Under the condition that the management system of the holder of this certificate continues to meet the standards of the quality management system, the certification is valid for 3 years.It can also be queried online at www.aws-iso.com. The validity of this certificate shall be confirmed and maintained by the center through regular supervision and review.

amazon 互认结果 UKAS QUALITY MANAGEMENT MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Amazon international certification standard

企业资信等级证书
Enterprise Credit Rating Certificate

青海泽标建设工程有限公司

青海省西宁市城中区西川北路85号16号楼3单元261室

根据企业信用评价体系标准《QGB320500xy01-2019》，并结合该企业信用报告，
According to the standard of enterprise credit evaluation system "QGB320500xy01-2019" and combining the credit report of this enterprise, the credit

对其企业信用状况进行客观、科学、公正的评估，确定该企业的资质为：
status of this company was evaluated objectively, scientifically and fairly, and finally the qualification of it is determined as follows:

AAA级
AAA Certificate

证书查询：全国企业认证信息查询系统 www.qgrz.org.cn
CERTIFICATE QUERY

证书公示：中国招标投标网 www.cecbid.org.cn
CERTIFICATE PUBLIC

报告公示：全国企业信用报告公示系统 www.xybg.org.cn
REPORT PUBLIC

信用官网：信用中国 www.creditchina.gov.cn
CREDIT WEBSITE

证书编号：XY202209169873
CERTIFICATE NUMBER

发证日期：2022年09月16日
DATE OF ISSUE

有效期至：2025年09月15日
VALID TILL

信用查询码
Authentication Query Code

信易互认
Accreditation Body

信用中国有限公司
全国企业认证信息查询系统

2023年09月 年审标志 Annual Verification Sign Of	2024年09月 年审标志 Annual Verification Sign Of

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，加贴防伪标签方为有效。

注：本证书内容为截至该时间点信用主体在相关信息公示。申报信息以及公开信息数据整理分析所得，本证书内容不构成我们对任何人或企业之明示或暗示的观点或保证。仅为您提供参考，不得用作法律诉讼的依据或是其他非法用途。对由于参考本证书所造成的损失，我司不承担任何责任。

中国投标企业信用等级证书

Credit Rating Certificate Of Chinese Bidding Enterprise

青海泽标建设工程有限公司

青海省西宁市城中区[illegible]85号16号楼3单元261室

根据企业信用评价体系标准《Q/GB320500xy01-2019》，并结合该企业信用报告，
According to the standard of enterprise credit evaluation system "Q/GB320500xy01-2019" and combining the credit report of this enterprise, the credit

对其企业信用状况进行客观、科学、公正的评估，确定该企业的资质为：
status of this company was evaluated objectively, scientifically and fairly, and finally the qualification of it is determined as follows:

AAA级

AAA Certificate

证书查询：全国企业认证信息查询系统 www.qgrz.org.cn
CERTIFICATE QUERY

证书公示：中国招标投标网 www.cecbid.org.cn
CERTIFICATE PUBLIC

报告公示：全国企业信用报告公示系统 www.xybg.org.cn
REPORT PUBLIC

信用官网：信用中国 www.creditchina.gov.cn
CREDIT WEBSITE

证书编号：XY20220916987[illegible]
CERTIFICATE NUMBER

发证日期：2022年09月16日
DATE OF ISSUE

有效期至：2025年09月15日
VALID TILL

信用查询码
Authentication Query Code

信易互认
Accreditation Body

信易信用科技有限公司
全国企业认证信息查询系统

2023年09月 年审标志 Annual Verification Sign Of	2024年09月 年审标志 Annual Verification Sign Of

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，加贴防伪标签方为有效。

注：本证书内容为截至该时间点信用主体在相关信息公示、申报信息以及公开信息数据整理分析所得，本证书内容不构成我们对任何人或企业之明示或暗示的观点或保证，仅为您提供参考，不得用作法律诉讼的依据或是其他非法用途，对由于参考本证书所造成的损失，我司不承担任何责任。

诚信经营示范单位等级证书

Rating Certificate Of Integrity Management Demonstration Unit

青海泽标建设工程有限公司

青海省西宁市城中区湟川东路85号4幢3单元261室

根据企业信用评价体系标准《QGB320500xy01-2019》，并结合该企业信用报告，
According to the standard of enterprise credit evaluation system "QGB320500xy01-2019" and combining the credit report of this enterprise, the credit

对其企业信用状况进行客观、科学、公正的评估，确定该企业的资质为：
status of this company was evaluated objectively, scientifically and fairly, and finally the qualification of it is determined as follows:

AAA级诚信经营示范单位

AAA grade integrity management demonstration unit

证书查询：全国企业认证信息查询系统 www.qgrz.org.cn
CERTIFICATE QUERY

证书公示：中国招标投标网 www.cecbid.org.cn
CERTIFICATE PUBLIC

报告公示：全国企业信用报告公示系统 www.xybg.org.cn
REPORT PUBLIC

信用官网：信用中国 www.creditchina.gov.cn
CREDIT WEBSITE

证书编号：XY20220916987-3
CERTIFICATE NUMBER

发证日期：2022年09月16日
DATE OF ISSUE

有效期至：2025年09月15日
VALID TILL

信用查询码
Authentication Query Code

信易互认
Accreditation Body

信易信用科技有限公司
全国企业认证信息查询系统
入网专用章
证书专用章

2023年09月 年审标志 Annual Verification Sign Of	2024年09月 年审标志 Annual Verification Sign Of

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，加贴防伪标签方为有效。

注：本证书内容为截至该时间点信用主体在相关信息公示、申报信息以及公开信息数据整理分析所得，本证书内容不构成我们对任何人或企业之明示或暗示的观点或保证。仅为您提供参考，不得用作法律诉讼的依据或是其他非法用途。对由于参考本证书所造成的损失，我司不承担任何责任。

质量、服务诚信单位证书
Certificate Of Integrity Unit In Quality And Service

青海泽标建设工程有限公司

青海省西宁市城中区南川路8号402号楼2单元261室

根据企业信用评价体系标准《Q/GB320500xy01-2019》，并结合该企业信用报告，
According to the standard of enterprise credit evaluation system "Q/GB320500xy01-2019" and combining the credit report of this enterprise, the credit

对其企业信用状况进行客观、科学、公正的评价，确定该企业的资质为：
status of this company was evaluated objectively, scientifically, and fairly, and finally the qualification of it is determined as follows:

AAA级质量、服务诚信单位
AAA grade quality and service integrity unit

证书查询：全国企业认证信息查询系统
CERTIFICATE QUERY www.qgrz.org.cn

证书公示：中国招标投标网
CERTIFICATE PUBLIC www.cecbid.org.cn

报告公示：全国企业信用报告公示系统
REPORT PUBLIC www.xybg.org.cn

信用官网：信用中国
CREDIT WEBSITE www.creditchina.gov.cn

证书编号：XY20220916987-4
CERTIFICATE NUMBER

发证日期：2022年09月16日
DATE OF ISSUE

有效期至：2025年09月15日
VALID TILL

信用查询码
Authentication Query Code

信易互认
Accreditation Body

信用中国网络有限公司
全国企业认证信息查询系统
入网专用章
证书专用章

2023年09月 年审标志 Annual Verification Sign Of	2024年09月 年审标志 Annual Verification Sign Of

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，加贴防伪标签方为有效。

注：本证书内容为截至该时间点信用主体在相关信息公示、申报信息以及公开信息数据整理分析所得，本证书内容不构成我们对任何人或企业之明示或暗示的观点或保证，仅为您提供参考，不得用作法律诉讼的依据或是其他非法用途，对由于参考本证书所造成的损失，我司不承担任何责任

重合同守信用企业证书

Enterprise Certificate Of Honoring Contract And Keeping Promise

青海泽标建设工程有限公司

青海省西宁市城中区南川东路8[illegible]号4号楼2单元261室

根据企业信用评价体系标准《Q/GB320500xy01-2019》，并结合该企业信用报告，
According to the standard of enterprise credit evaluation system "Q/GB320500xy01-2019" and combining the credit report of this enterprise, the credit

对其企业信用状况进行客观、科学、公正的评价，确定该企业的资质为：
status of this company was evaluated objectively, scientifically, justly, and finally the qualification of it is determined as follows:

AAA级重合同守信用企业

AAA grade honoring contracts and keeping promises enterprise

证书查询：全国企业认证信息查询系统 www.qgrz.org.cn
CERTIFICATE QUERY

证书公示：中国招标投标网 www.cecbid.org.cn
CERTIFICATE PUBLIC

报告公示：全国企业信用报告公示系统 www.xybg.org.cn
REPORT PUBLIC

信用官网：信用中国 www.creditchina.gov.cn
CREDIT WEBSITE

证书编号：XY20220916987-2
CERTIFICATE NUMBER

发证日期：2022年09月16日
DATE OF ISSUE

有效期至：2025年09月15日
VALID TILL

信用查询码
Authentication Query Code

信易互认
Accreditation Body

信易[illegible]有限公司
全国企业认证信息查询系统
入网专用章
证书专用章

2023年09月 年审标志 Annual Verification Sign Of	2024年09月 年审标志 Annual Verification Sign Of

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，加贴防伪标签方为有效。

注：本证书内容为截至该时间点信用主体在相关信息公示、申报信息以及公开信息数据整理分析所得，本证书内容不构成我们对任何人或企业之明示或暗示的观点或保证，仅为您提供参考，不得用作法律诉讼的依据或是其他非法用途，对由于参考本证书所造成的损失，我司不承担任何责任。

企业信用等级证书
Enterprise Credit Rating Certificate

青海泽标建设工程有限公司

青海省西宁市城中区南川西路85号4幢1单元2楼2单元261室

根据企业信用评价体系标准《Q/GB320500xy01-2019》，并结合该企业信用报告，
According to the standard of enterprise credit evaluation system "Q/GB320500xy01-2019" and combining the credit report of this enterprise, the credit

对其企业信用状况进行客观、科学、公正的评估，确定该企业的资质为：
status of this company was evaluated objectively, scientifically, fairly, and finally the qualification of it is determined as follows:

AAA级
AAA Certificate

证书查询：全国企业认证信息查询系统 www.qgrz.org.cn
CERTIFICATE QUERY

证书公示：中国招标投标网 www.cecbid.org.cn
CERTIFICATE PUBLIC

报告公示：全国企业信用报告公示系统 www.xybg.org.cn
REPORT PUBLIC

信用官网：信用中国 www.creditchina.gov.cn
CREDIT WEBSITE

证书编号：XY20220916987-1
CERTIFICATE NUMBER

发证日期：2022年09月16日
DATE OF ISSUE

有效期至：2025年09月15日
VALID TILL

信用查询码
Authentication Query Code

信易互认
Accreditation Body

[illegible]建设工程有限公司
全国企业认证信息查询系统
入网专用章

证书专用章

2023年09月 年审标志 Annual Verification Sign Of	2024年09月 年审标志 Annual Verification Sign Of

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，加贴防伪标签方为有效。

注：本证书内容为截至该时间点信用主体在相关信息公示、申报信息以及公开信息数据整理分析所得，本证书内容不构成我们对任何人或企业之明示或暗示的观点或保证。仅为您提供参考，不得用作法律诉讼的依据或是其他非法用途。对由于参考本证书所造成的损失，我司不承担任何责任。

立信单位评定证书
Evaluation Certificate Of Lixin Company

青海泽标建设工程有限公司

青海省西宁市城中区湟川东路85号90号楼3单元261室

根据企业信用评价体系标准《Q/GB3320500xy01-2019》，并结合该企业信用报告，
According to the standard of enterprise credit evaluation system "Q/GB3320500xy01-2019" and combining the credit report of this enterprise, the credit

对其企业信用状况进行客观、科学、公正的评价，确定该企业的资质为：
status of this company was evaluated objectively, scientifically and fairly, and finally the qualification of it is determined as follows:

AAA级立信单位
AAA grade lixin company

证书查询：全国企业认证信息查询系统 www.qgrz.org.cn
CERTIFICATE QUERY

证书公示：中国招标投标网 www.cecbid.org.cn
CERTIFICATE PUBLIC

报告公示：全国企业信用报告公示系统 www.xybg.org.cn
REPORT PUBLIC

信用官网：信用中国 www.creditchina.gov.cn
CREDIT WEBSITE

证书编号：XY20220916987-8
CERTIFICATE NUMBER

发证日期：2022年09月16日
DATE OF ISSUE

有效期至：2025年09月15日
VALID TILL

信用查询码
Authentication Query Code

信易互认
Accreditation Body

信用评级有限公司
全国企业认证信息查询系统
入网专用章
证书专用章

2023年09月 年审标志 Annual Verification Sign Of	2024年09月 年审标志 Annual Verification Sign Of

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，加贴防伪标签方为有效。

注：本证书内容为截至该时间点信用主体在相关信息公示、申报信息以及公开信息数据整理分析所得，本证书内容不构成我们对任何人或企业之明示或暗示的观点或保证，仅为您提供参考，不得用作法律诉讼的依据或是其他非法用途，对由于参考本证书所造成的损失，我司不承担任何责任。

国家企业信用信息公示（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）



股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	李积芳	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	李积英	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共 查询到 2 条记录 共 1 页　首页　‹ 上一页　1　下一页 ›　末页

主要人员信息

共计 3 条信息

李积英 执行董事兼总...	李积英 执行董事兼总...	宗有财 监事

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
1	单位办理住房公积金缴存登记	
2	物业服务企业及其分支机构备案	
3	资产评估机构及其分支机构备案	

共 查询到 3 条记录 共 1 页　首页　‹ 上　1　下一页 ›　末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	经营范围变更（含业务范围变更）	许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业... 更多	许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业... 更多	2023年11月2日
2	其他事项备案	公章刻制备案，单位办理住房公积金缴存登记	公章刻制备案，单位办理住房公积金缴存登记	2023年11月2日
3	其他事项备案	公章刻制备案，单位办理住房公积金缴存登记	公章刻制备案，单位办理住房公积金缴存登记	2023年7月14日
4	经营范围变更（含业务范围变更）	许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外... 更多	许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业... 更多	2023年7月14日
5	其他事项备案	公章刻制备案，单位办理住房公积金缴存登记	公章刻制备案，单位办理住房公积金缴存登记	2023年3月31日

共查询到 12 条记录 共 3 页　首页　* 上一页　1　2　3　下一页 *　末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页　* 上一页　下一页 *　末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页　* 上一页　下一页 *　末页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页　* 上一页　下一页 *　末页

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到0条记录 共0页　首页 上一页 下一页 末页

商标注册信息

暂无商标注册信息

抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
暂无抽查检查结果信息				

共查询到0条记录 共0页　首页 上一页 下一页 末页

产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							

共查询到0条记录 共0页　首页 上一页 下一页 末页

认证监管抽查检查信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称（单元名称）	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取的证书处理结果	证书撤销日期
暂无认证监管抽查检查信息									

共查询到0条记录 共0页　首页 上一页 下一页 末页

食品抽查检查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
暂无食品抽查检查信息					

共查询到0条记录 共0页　首页 上一页 下一页 末页

双随机抽查结果信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
暂无双随机抽查结果信息								

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页　上一页　下一页　末页

司法协助信息

序号	被执行人	股权数额	执行法院	执行通知书文号	类型|状态	详情
暂无司法协助信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页　上一页　下一页　末页

依人民法院判决申请撤销登记信息

序号	申请时间	判决法院	判决书文号	撤销事项	撤销登记时间	撤销登记机关	详情
暂无依人民法院判决申请撤销登记信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页　上一页　下一页　末页

协助涤除信息

序号	执行法院	协助执行通知书文号	被涤除人姓名	被涤除人身份类型	涤除日期
暂无协助涤除信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页　上一页　下一页　末页

承诺不实情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实情况			

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页　上一页　下一页　末页

信誉信息

序号	信誉信息	日期	记录单位
暂无信誉信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页　上一页　下一页　末页

名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页　上一页　下一页　末页

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

企业年报信息

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2024年度报告	2025年4月24日	查看
2	2023年度报告	2024年3月19日	查看
3	2022年度报告	2023年3月2日	查看
4	2021年度报告	2022年3月10日	查看
5	2020年度报告	2021年3月27日	查看

股东及出资信息

股东	认缴额(万元)	实缴额(万元)	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资金额(万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期	公示日期
暂无股东及出资信息										

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页　上一页　下一页　末页

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
暂无股权变更信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页　上一页　下一页　末页

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	状态	详情
暂无行政许可信息								

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页　上一页　下一页　末页

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	备注
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

集团成员信息

序号	成员名称	统一社会信用代码	成员类型	母公司控股比例
暂无集团成员信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

执行标准自我声明

提示：根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。
请登录企业标准信息公共服务平台（www.qybz.org.cn）完成注册填报。

查看修改记录>>

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准编号	标准名称	填报时间
暂无执行标准自我声明信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

信用承诺信息

序号	信用承诺事项	信用承诺时间	信用承诺内容
暂无信用承诺信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

名称授权信息

序号	授权方	使用方	授权名称	开始日期	授权期限	授权状态	变更信息
暂无名称授权信息							


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
青海泽标建设工程有限公司 开业
统一社会信用代码： 91630100MA759T5Q75
注册号：
法定代表人： 李积英
登记机关： 西宁市行政审批服务局
成立日期： 2020年04月07日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
行政许可信息
序号 许可文件编号 许可文件名称 有效期自 有效期至 许可机关 许可内容 详情
1 0000 为空 2020年5月21日 2099年12月31日 国家税务总局西宁市城中区税务局第一税务分局(办税服务厅) 准予行政许可文书内容：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十... 更多 查看
共查询到 1 条记录 共 1 页
首页 1 下一页 末页


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
青海泽标建设工程有限公司 开业
统一社会信用代码： 91630100MA759T5Q75
注册号：
法定代表人： 李积英
登记机关： 西宁市行政审批服务局
成立日期： 2020年04月07日
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
行政处罚信息
序号 决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 决定机关名称 处罚决定日期 公示日期 详情
暂无行政处罚信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
青海泽标建设工程有限公司 开业
统一社会信用代码： 91630100MA759T5Q75
注册号：
法定代表人： 李积英
登记机关： 西宁市行政审批服务局
成立日期： 2020年04月07日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
列入经营异常名录信息
序号 列入经营异常名录原因 列入日期 作出决定机关(列入) 移出经营异常名录原因 移出日期 作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
青海泽标建设工程有限公司 开业
统一社会信用代码： 91630100MA759T5Q75
注册号：
法定代表人： 李积英
登记机关： 西宁市行政审批服务局
成立日期： 2020年04月07日
发送报告
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
列入严重违法失信名单（黑名单）信息
序号 类别 列入严重违法失信名单（黑名单）原因 列入日期 作出决定机关(列入) 移出严重违法失信名单（黑名单）原因 移出日期 作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

青海泽标建设工程有限公司 开业

统一社会信用代码： 91630100MA759T5Q75
注册号：
法定代表人： 李积英
登记机关： 西宁市行政审批服务局
成立日期： 2020年04月07日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

市场主体歇业公告

序号	公告申请日期	公告期自	公告期至	详情
暂无市场主体歇业公告信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

涉嫌冒用他人身份登记信息

序号	冒名登记事项	当事人姓名	冒名登记时间	登记机关联系方式	公告期自	公告期至	处理结果
暂无涉嫌冒用他人身份公示信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

强制注销公告

序号	公告名称	公告期限	公告日期	详情
暂无强制注销公告信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

合并/分立公告

序号	公告类型	公告期限	公告状态	详情
暂无合并/分立公告信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

减少注册资本公告

序号	公告名称	公告期限	公告状态	详情
暂无减少注册资本公告信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

解散事由信息

序号	解散事由	公示日期	状态	详情
暂无解散事由信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

市场主体终止歇业公告

序号	公告日期	作出终止歇业决定日期	详情
暂无市场主体终止歇业公告信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

简易注销公告信息

序号	公告名称	公告日期自	公告日期至	详情
暂无简易注销公告信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

注销备案/公告信息

序号	清算组备案日期	债权人公告日期	公告状态	详情
暂无注销备案/公告信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

营业执照作废声明

序号	是否正副本	副本编号	声明内容	声明日期	是否补领	补领日期	状态	详情
暂无营业执照作废声明信息								

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	青海泽标建设工程有限公司
报告生成时间	2025/07/13 11:03:20
申请人邮箱	1753813693@qq.com

（报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

政府部门公示信息

照面信息

统一社会信用代码：91630100MA759T5Q75　　**企业名称：**青海泽标建设工程有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)　　**法定代表人：** 李积英

注册资本： 5000 万人民币　　**成立日期：** 2020年04月07日

营业期限自：2020年04月07日　　**营业期限至：**

登记机关：西宁市行政审批服务局　　**核准日期：**2023年11月02日

登记状态：开业

住所： 青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元251室

经营范围： 许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；舞台工程施工；林木种子生产经营；草种生产经营；文物保护工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；五金产品零售；市政设施管理；城乡市容管理；机械设备销售；智能农机装备销售；人工造林；广告制作；节能管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；水环境污染防治服务；太阳能热利用产品销售；土壤污染治理与修复服务；建筑材料销售；水污染治理；玩具销售；水土流失防治服务；白蚁防治服务；日用品销售；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；汽车销售；停车场服务；花卉种植；礼品花卉销售；城市绿化管理；草种植；森林防火服务；房屋拆迁服务；牲畜销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；肥料销售；化肥销售；农用薄膜销售；塑料制品销售；充电桩销售；机动车充电销售；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；金属制品销售；消防器材销售；体育用品及器材零售；照相机及器材销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；烘焙、熔炉及电炉销售；饲料原料销售；饲料生产专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；办公用品销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；劳动保护用品销售；承接总公司工程建设业务；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；照明器具销售；煤炭及制品销售；制冷、空调设备销售；道路货物运输站经营(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型

国家企业信用信息公示系统

1	李积芳	非公示项	非公示项	自然人股东
2	李积英	非公示项	非公示项	自然人股东

主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	李积英	执行董事兼总经理	2	李积英	执行董事兼总经理
3	宗有财	监事			

分支机构信息

暂无分支机构信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
		许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；舞台工程施工；林木种子生产经营；草种生产经营；文物保护工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；五金产品零售；市政设施管理；城乡市容管理；机械设备销售；智能农机装备销售；人工造林；广告制作；节能管理服务；环境保护专用设备销售；特	许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；舞台工程施工；林木种子生产经营；草种生产经营；文物保护工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；五金产品零售；市政设施管理；城乡市容管理；机械设备销售；智能农机装备销售；人工造林；广告制作；节能管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；水环	

1	经营范围变更（含业务范围变更）	种设备销售；水环境污染防治服务；太阳能热利用产品销售；土壤污染治理与修复服务；建筑材料销售；水污染治理；玩具销售；水土流失防治服务；白蚁防治服务；日用品销售；林业有害生物防治服务；汽车销售；道路货物运输站经营；停车场服务；花卉种植；礼品花卉销售；城市绿化管理；草种植；森林防火服务；农作物病虫害防治服务；房屋拆迁服务；牲畜销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；肥料销售；化肥销售；农用薄膜销售；塑料制品销售；充电桩销售；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；办公设备销售；金属制品销售；消防器材销售；体育用品及器材零售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；饲料原料销售；饲料生产专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；办公用品销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；劳动保护用品销售；承接总公司工程建设业务；数字视频监控系统销售；照明器具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	境污染防治服务；太阳能热利用产品销售；土壤污染治理与修复服务；建筑材料销售；水污染治理；玩具销售；水土流失防治服务；白蚁防治服务；日用品销售；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；汽车销售；停车场服务；花卉种植；礼品花卉销售；城市绿化管理；草种植；森林防火服务；房屋拆迁服务；牲畜销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；肥料销售；化肥销售；农用薄膜销售；塑料制品销售；充电桩销售；机动车充电销售；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；金属制品销售；消防器材销售；体育用品及器材零售；照相机及器材销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；饲料原料销售；饲料生产专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；办公用品销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；劳动保护用品销售；承接总公司工程建设业务；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；照明器具销售；煤炭及制品销售；制冷、空调设备销售；道路货物运输站经营(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	2023年11月02日
2	其他事项备案	公章刻制备案，单位办理住房公积金缴存登记	公章刻制备案，单位办理住房公积金缴存登记	2023年11月02日
3	其他事项备案	公章刻制备案，单位办理住房公积金缴存登记	公章刻制备案，单位办理住房公积金缴存登记	2023年07月14日
		许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；人防	许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业	

4	经营范围变更（含业务范围变更）	工程防护设备销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程造价咨询业务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；装卸搬运；体育场地设施工程施工；固体废物治理；安全技术防范系统设计施工服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；五金产品批发；市政设施管理；城乡市容管理；机械设备销售；智能农机装备销售；人工造林；广告制作；节能管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；畜牧机械销售；水环境污染防治服务；太阳能热利用装备销售；土壤环境污染防治服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；玩具销售；水土流失防治服务；白蚁防治服务；林业有害生物防治服务；日用品销售；汽车销售；道路货物运输站经营；停车场服务；花卉种植；礼品花卉销售；城市绿化管理；草种植；森林防火服务；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；林业机械服务；智能农业管理；房屋拆迁服务；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；农副产品销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；肥料销售；农用薄膜销售；新型膜材料销售；充电桩销售；广播影视设备销售；金属制品销售；办公设备销售；消防器材销售；体育用品及器材批发；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；饲料生产专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；办公用品销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；饲料原料销售；化肥	；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；舞台工程施工；林木种子生产经营；草种生产经营；文物保护工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；五金产品零售；市政设施管理；城乡市容管理；机械设备销售；智能农机装备销售；人工造林；广告制作；节能管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；水环境污染防治服务；太阳能热利用产品销售；土壤污染治理与修复服务；建筑材料销售；水污染治理；玩具销售；水土流失防治服务；白蚁防治服务；日用品销售；林业有害生物防治服务；汽车销售；道路货物运输站经营；停车场服务；花卉种植；礼品花卉销售；城市绿化管理；草种植；森林防火服务；农作物病虫害防治服务；房屋拆迁服务；牲畜销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；肥料销售；化肥销售；农用薄膜销售；塑料制品销售；充电桩销售；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；办公设备销售；金属制品销售；消防器材销售；体育用品及器材零售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；饲料原料销售；饲料生产专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；办公用品销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；劳动保	2023年07月14日

		销售；自然生态系统保护管理；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	护用品销售；承接总公司工程建设业务；数字视频监控系统销售；照明器具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	
5	其他事项备案	公章刻制备案，单位办理住房公积金缴存登记	公章刻制备案，单位办理住房公积金缴存登记	2023年03月31日
6	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	姓名: 宗有财; 证件号码: **********; 职位: 监事; 姓名: 李积芳; 证件号码: **********; 职位: 执行董事兼总经理;	姓名: 宗有财; 证件号码: **********; 职位: 监事; 姓名: 李积英; 证件号码: **********; 职位: 执行董事兼总经理;	2023年03月31日
7	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	姓名: 李积英; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 李积芳; 出资额: ***万; 百分比: *%;	姓名: 李积英; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 李积芳; 出资额: ***万; 百分比: *%;	2023年03月31日
8	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	李积芳	李积英	2023年03月31日
9	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	****	****	2023年03月31日
		建筑工程；地基与基础工程；公路工程；轨道交通工程；市政公用工程建设活动；公路管理与养护；机电工程	许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；人防工程防护设备销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程造价咨询业务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；装卸搬运；体育	

		；水利水电工程；电力工程；输变电工程；通信工程；道路照明工程；建筑智能化工程；钢结构工程专业承包；施工专业作业；建筑装饰装潢工程；建筑幕墙工程；防水防腐工程；消防设施工程施工；环保工程施工；；园林绿化工程施工；电子工程安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；生态环境治理；河湖整治工程；水污染治理；地质灾害治理服务；沙漠化治理；草原病虫鼠害防治；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑劳务分包；体育场馆及场地设施建设；电动汽车充电基础设施运营及技术服务咨询；光伏项目技术开发、技术转让及运营管理；特种设备安装改造修理；机械设备安装；采暖炉销售及安装；标识标牌制作及安装；电动汽车充电系统及设备、建筑材料、机电设备、五金产品、金属材料、农机具、肥料、饲料、日用百货、劳动保护用品、办公设备及耗材、办公用品、消防器材、电子产品、太阳能光电产品、照明器具、混凝土销售；LED显示屏、液晶、等离子显示屏的生产、销售、租赁、安装及维修；建筑用石加工；网围栏及配套产品加工、安装；畜牧基础设施建设；暖棚建设；牧草、绿化苗木种植销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	场地设施工程施工；固体废物治理；安全技术防范系统设计施工服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；五金产品批发；市政设施管理；城乡市容管理；机械设备销售；智能农机装备销售；人工造林；广告制作；节能管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；畜牧机械销售；水环境污染防治服务；太阳能热利用装备销售；土壤环境污染防治服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；玩具销售；水土流失防治服务；白蚁防治服务；林业有害生物防治服务；日用品销售；汽车销售；道路货物运输站经营；停车场服务；花卉种植；礼品花卉销售；城市绿化管理；草种植；森林防火服务；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；林业机械服务；智能农业管理；房屋拆迁服务；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；农副产品销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；肥料销售；农用薄膜销售；新型膜材料销售；充电桩销售；广播影视设备销售；金属制品销售；办公设备销售；消防器材销售；体育用品及器材批发；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；饲料生产专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；办公用品销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；饲料原料销售；化肥销售；自然生态系统保护管理；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	
10	经营范围变更（含业务范围变更）			2023年03月31日
			建筑工程；地基与基础工程	

11	经营范围变更	建筑工程；地基与基础工程；铁路工程；公路工程；隧道工程；桥梁工程；轨道交通工程；市政公用工程；道路养护工程；机电工程；水利水电工程；电力工程；输变电工程；通信工程；道路照明工程；建筑智能化工程；钢结构工程；室内外装饰装潢工程；建筑幕墙工程；防水防腐保温工程；消防工程；土石方工程；环保工程；仿古建筑工程；园林绿化工程；矿山工程；特种工程；房屋拆除（不含爆破拆除）；生态环境治理；河湖整治工程；水污染治理；地质灾害治理；沙漠化环境治理；草原虫病鼠害防治；工程招标代理；工程项目管理；工程设计咨询；建筑劳务；体育场馆及体育设施建设；电动汽车充换电设施建设及技术服务咨询；光伏项目技术开发、技术转让及运营管理；起重设备、锅炉、压力管道安装；模板脚手架安装；网围栏安装；机械设备安装；采暖炉销售及安装；标识标牌制作及安装；电动汽车充换电系统及设备销售；建材、网围栏、机电设备、五金产品、商品混凝土销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	；公路工程；轨道交通工程；市政公用工程建设活动；公路管理与养护；机电工程；水利水电工程；电力工程；输变电工程；通信工程；道路照明工程；建筑智能化工程；钢结构工程专业承包；施工专业作业；建筑装饰装潢工程；建筑幕墙工程；防水防腐工程；消防设施工程施工；环保工程施工；；园林绿化工程施工；电子工程安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；生态环境治理；河湖整治工程；水污染治理；地质灾害治理服务；沙漠化治理；草原病虫鼠害防治；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑劳务分包；体育场馆及场地设施建设；电动汽车充电基础设施运营及技术服务咨询；光伏项目技术开发、技术转让及运营管理；特种设备安装改造修理；机械设备安装；采暖炉销售及安装；标识标牌制作及安装；电动汽车充电系统及设备、建筑材料、机电设备、五金产品、金属材料、农机具、肥料、饵料、日用百货、劳动保护用品，办公设备及耗材、办公用品、消防器材、电子产品、太阳能光电产品、照明器具、混凝土销售；LED显示屏、液晶、等离子显示屏的生产、销售、租赁、安装及维修；建筑用石加工；网围栏及配套产品加工、安装；畜牧基础设施建设；暖棚建设；牧草、绿化苗木种植销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2020年09月10日
12	章程修正案备案	为空	为空	2020年09月10日

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
1	0000	为空	2020年05月21日	2099年12月31日	国家税务总局西宁市城中区税务局第一税务分局(办税服务厅)	准予行政许可文书内容：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，决定准予你（单位）取得《增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批》

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息（企业自行公示信息由该企业提供，企业对其即时信息的真实性、合法性负责）

股东及出资信息

暂无股东及出资信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2024年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91630100MA759T5Q75

企业名称： 青海泽标建设工程有限公司

企业通信地址： 西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

邮政编码： 810000

企业联系电话： 13997165993

企业电子邮箱： 15592926732@qq.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 建筑工程；地基与基础工程；铁路工程、公路工程、隧道工程、桥梁工程；园林绿化工程施工；建筑物拆除作业；生态环境治理；特殊设备安装改造修理；机械设备安装；建筑用石加工；网围栏及配套产品加工、安装；畜牧基础设施建设；牧草、园林整治销售等

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	李积芳	100	2020年04月07日	货币	0	2020年12月31日	货币
2	李积英	1900	2020年04月07日	货币	528.96	2023年08月11日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	**净利润**	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	**负债总额**	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险		失业保险	
职工基本医疗保险		工伤保险	
生育保险			

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	
	单位参加失业保险缴费基数	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	
	单位参加生育保险缴费基数	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	
	参加失业保险本期实际缴费基数	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	
	参加生育保险本期实际缴费基数	
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91630100MA759T5Q75　**企业名称：** 青海泽标建设工程有限公司

企业通信地址： 西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室　**邮政编码：** 810000

企业联系电话： 13997165993　**企业电子邮箱：** 15592926732@qq.com

从业人数： 企业选择不公示　**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

企业经营状态： 开业　**企业控股情况：** 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否　**是否有网站或网店：** 否

是否有对外担保信息： 否　**有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：** 否

企业主营业务活动： 建筑工程；地基与基础工程；铁路工程、公路工程、隧道工程、桥梁工程；园林绿化工程施工；建筑物拆除作业；生态环境治理；特殊设备安装改造修理；机械设备安装；建筑用石加工；网围栏及配套产品加工、安装；畜牧基础设施建设；牧草、园林整治销售等

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序	股东	认缴出资额（万元	认缴出资	认缴出资	实缴出资额（万元	实缴出资	实缴出资

号		）	时间	方式	）	时间	方式
1	李积芳	100	2020年04月07日	货币	0	2020年12月31日	货币
2	李积英	1900	2020年04月07日	货币	628.96	2023年08月11日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险		失业保险	
职工基本医疗保险		工伤保险	
生育保险			

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	
	单位参加失业保险缴费基数	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	
	单位参加生育保险缴费基数	

本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	
	参加失业保险本期实际缴费基数	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	
	参加生育保险本期实际缴费基数	
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2022年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91630100MA759T5　**企业名称：** 青海泽标建设工程有限公司

Q75

企业通信地址：西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室　**邮政编码：**810000

企业联系电话：13997165993　**企业电子邮箱：**15592926732@qq.com

从业人数：企业选择不公示　**其中女性从业人数：**企业选择不公示

企业经营状态：开业　**企业控股情况：**企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否　**是否有网站或网店：**否

是否有对外担保信息：否　**有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：**否

企业主营业务活动：建筑工程；地基与基础工程；铁路工程、公路工程、隧道工程、桥梁工程；园林绿化工程施工；建筑物拆除作业；生态环境治理；特殊设备安装改造修理；机械设备安装；建筑用石加工；网围栏及配套产品加工、安装；畜牧基础设施建设；牧草、园林整治销售等

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	李积英	1900	2020年04月07日	货币	416.46	2022年11月25日	货币
2	李积芳	100	2020年04月07日	货币	0	2020年12月31日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险		失业保险	
职工基本医疗保险		工伤保险	
生育保险			

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	
	单位参加失业保险缴费基数	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	
	单位参加生育保险缴费基数	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	
	参加失业保险本期实际缴费基数	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	
	参加生育保险本期实际缴费基数	
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	

单位缴费基数	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2021年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91630100MA759T5Q75

企业名称： 青海泽标建设工程有限公司

企业通信地址： 西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

邮政编码： 810000

企业联系电话： 13997165993

企业电子邮箱： 1559292673 2@qq.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 建筑工程；地基与基础工程；铁路工程、公路工程、隧道工程、桥梁工程；园林绿化工程施工；建筑物拆除作业；生态环境治理；特殊设备安装改造修理；机械设备安装；建筑用石加工；网围栏及配套产品加工、安装；畜牧基础设施建设；牧草、园林整治销售等

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	李积英	1900	2020年04月07日	货币	290	2021年12月31日	货币
2	李积芳	100	2020年04月07日	货币	0	2020年12月31日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险		失业保险	
职工基本医疗保险		工伤保险	

生育保险		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	
	单位参加失业保险缴费基数	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	
	单位参加生育保险缴费基数	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	
	参加失业保险本期实际缴费基数	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	
	参加生育保险本期实际缴费基数	
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2020年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91630100MA759T5Q75

企业名称： 青海泽标建设工程有限公司

企业通信地址： 西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

邮政编码： 810000

企业联系电话： 13997165993

企业电子邮箱： 1559292673@qq.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有网站或网店： 否

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 建筑工程；地基与基础工程；铁路工程、公路工程、隧道工程、桥梁工程、店里工程；建筑劳务、园林绿化工程、生态环境治理、草原虫病鼠害防治、网围栏销售及安装等

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	李积芳	100	2020年04月07日	货币	0	2020年12月31日	货币
2	李积英	1900	2020年04月07日	货币	64.45	2020年12月16日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险		失业保险	
职工基本医疗保险		工伤保险	
生育保险			

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	
	单位参加失业保险缴费基数	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	
	单位参加生育保险缴费基数	
本期实际缴费金	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	
	参加失业保险本期实际缴费基数	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费	

额	基数	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	
	参加生育保险本期实际缴费基数	
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

附件 7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明


财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第 22 条规定提供以下相关材料：

1、经第三方机构出具的 2024 年财务状况审计报告，包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。新注册未满一年的或农民专业合作社的投标人需提供基本开户银行出具的近三个月内的资信证明。扫描（或复印）件应全面、完整、清晰。

2、近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录（农民专业合作社的投标人提供个人养老保险缴纳凭证及个人医保）的证明材料；依法免税的投标人须提供相应文件证明(无欠税证明需加盖当地税务局公章)。

2024 年审计报告

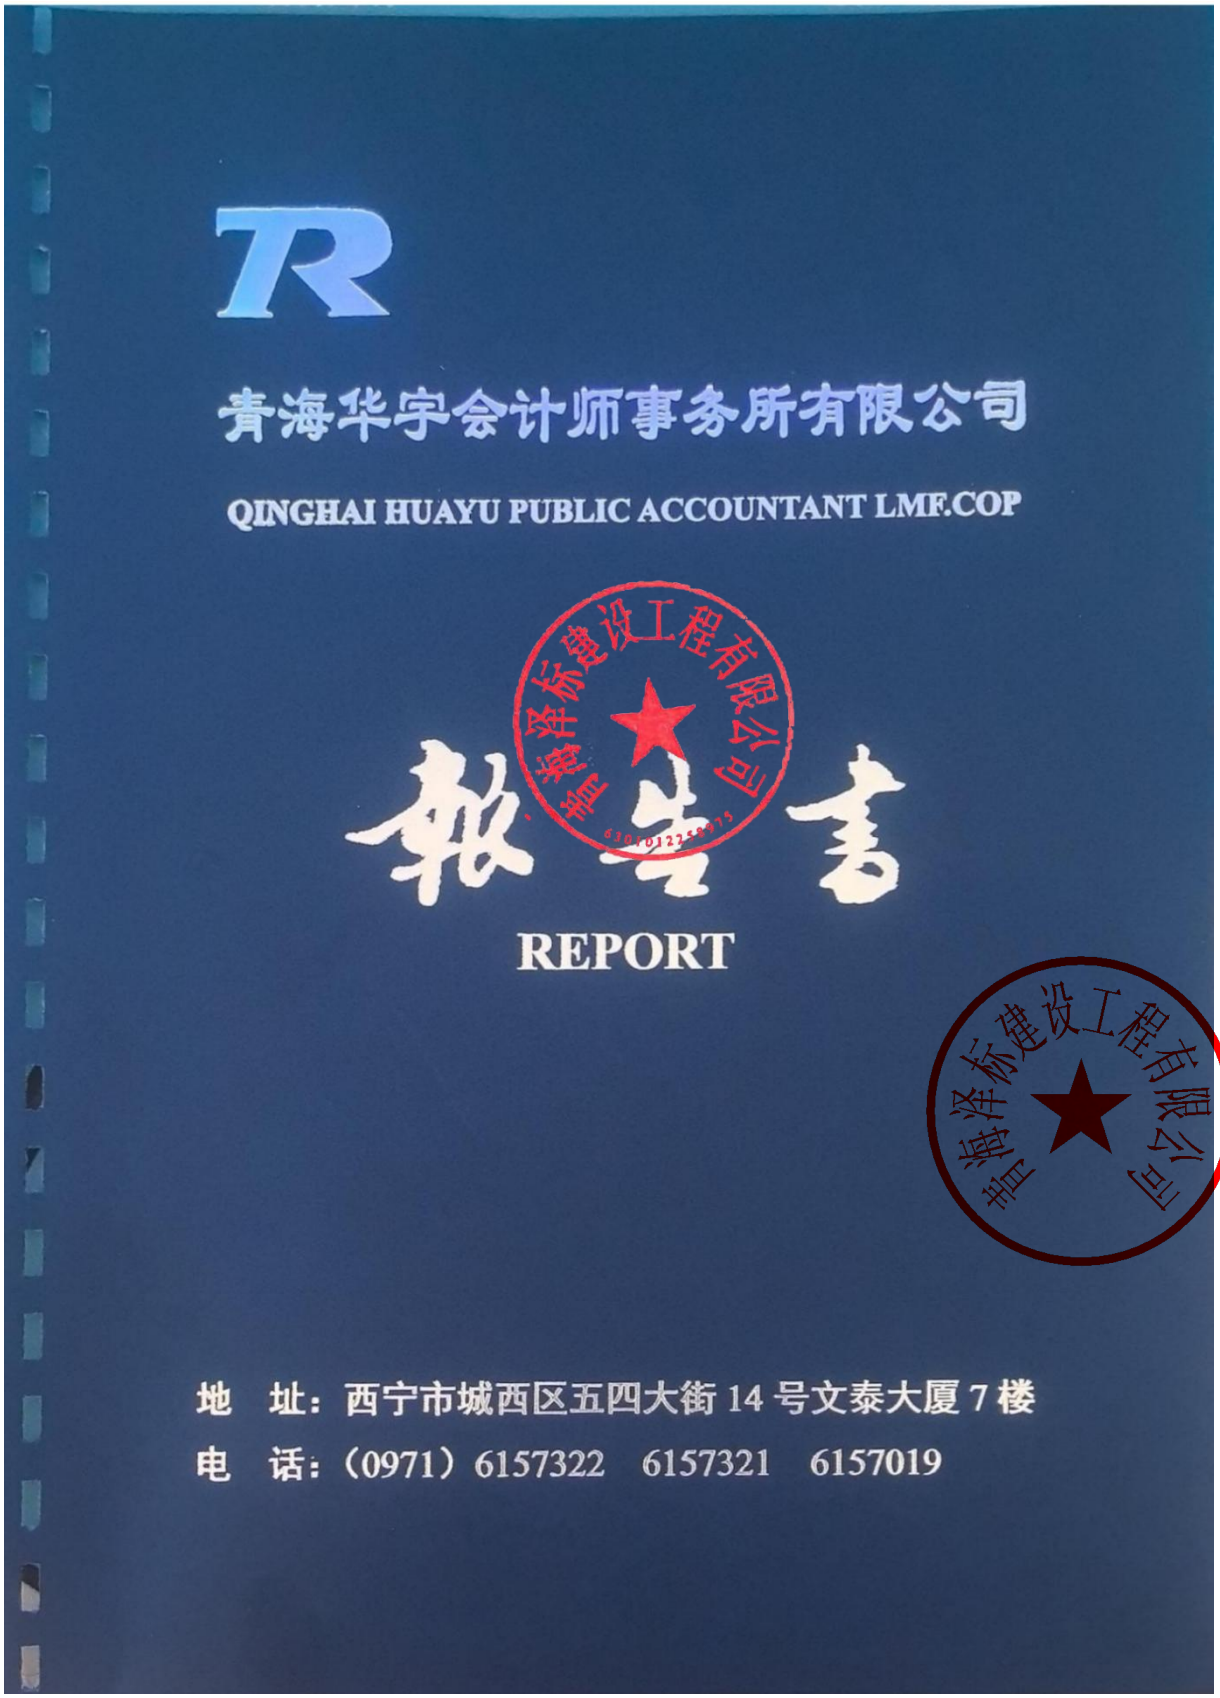
青海华宇会计师事务所有限公司
QINGHAI HUAYU PUBLIC ACCOUNTANT LMF.COP
報告書
REPORT
地　址：西宁市城西区五四大街 14 号文泰大厦 7 楼
电　话：（0971）6157322　6157321　6157019

青海华宇会计师事务所有限公司
青海省西宁市城北区宁张路44号
创业创新大厦8层8-1室
0971-6157322　6157321

审　计　报　告

青华宇审字（2025）019号

青海泽标建设工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了青海泽标建设工程有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、现金流量表。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

青海华宇会计师事务所有限公司
审计报告专用章

扫描全能王 创建

三、 其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高

扫描全能王 创建

水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对青海泽标建设工程有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致青海泽标建设工程有限公司不能持续经营。

扫描全能王 创建

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就青海泽标建设工程有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

六、其他事项

1、实收资本未提供验资报告。

2、本报告仅供招、投标使用。

3、我们关注到贵公司在中国建设银行股份有限公司海南州分行，账号为 63050164363700001079 的账户余额为 317,870.00 元，该账户是农民工工资监管账户。

青海华宇会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国·西宁　　中国注册会计师：

二〇二五年三月十八日

扫描全能王 创建

资产负债表

单位名称：青海泽标建设工程有限公司　　2024年12月31日　　单位：人民币元

资产	期末数	年初数	负债及所有者权益	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	15,896,775.00	12,068,423.33	短期借款	1,800,000.00	
衍生金融资产			应付票据		
应收票据			应付账款	31,811,037.04	19,032,249.70
应收股利			预收账款	21,810,726.39	10,133,575.95
应收利息			应付工资		
应收账款	12,131,608.83	3,665,573.74	应付福利费		
其他应收款	12,005,793.39	8,189,963.27	应付股利		
预付账款	12,074,231.33	10,800,448.67	应交税金	-214,857.44	-8,561.78
应收补贴款			其他应交款		
存货	10,978,681.29	3,241,563.80	其他应付款	1,829,404.06	2,202,317.55
待摊费用			预提费用		
一年内到期的长期债券投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	63,087,089.84	37,965,972.81	其他流动负债		
长期投资：					
长期期权投资			流动负债合计	57,036,310.05	31,359,581.42
长期债权投资			长期负债：		
长期投资合计			长期借款		
固定资产：			应付债券		
固定资产原价	447,118.24	447,118.24	长期应付款		
减：累计折旧	177,459.18	127,454.58	专项应付款		
固定资产净值	269,659.06	319,663.66	其他非流动负债		
减：固定资产减值准备			长期负债合计		
固定资产净额	269,659.06	319,663.66	递延税项：		
工程物资			递延税款贷项		
在建工程			非流动负债合计		
固定资产清理			负债总计	57,036,310.05	31,359,581.42
固定资产合计			所有者权益(或股东权益)		
无形资产及其它资产：			实收资本(或股本)：	6,289,600.00	6,289,600.00
无形资产	3,383.23	4,783.27	减：已归还投资		
长期待摊费用			实收资本(或股本)净额	6,289,600.00	6,289,600.00
开发支出			资本公积		
无形资产及递延资产合计			盈余公积		
非流动资产合计	273,042.29	324,446.93	其中：法定公益金		
递延税项：			未分配利润	34,222.08	641,238.32
递延税款借项			所有者权益(或股东权益)	6,323,822.08	6,930,838.32
资产总计	63,360,132.13	38,290,419.74	负债及所有者权益(或股东权益)合计	63,360,132.13	38,290,419.74

扫描全能王 创建

利 润 表

单位名称：青海泽标建设工程有限公司　　2024年度　　单位：人民币元

项目	本年累计金额	上年累计金额
一、主营业务收入	62,166,485.62	54,834,951.12
减：主营业务成本	60,174,437.02	53,445,129.26
主营业务税金及附加	188,515.04	100,983.75
二、主营业务利润	1,803,533.56	1,288,838.11
加：其他业务利润		
减：营业费用	945,668.48	646,807.58
管理费用	471,577.41	237,015.00
财务费用	24,113.91	-1,077.97
四、营业利润	362,173.76	406,093.50
加：投资收益	35.37	
补贴收入		
营业外收入	3,472.13	2,381.36
减：营业外支出	165,713.63	
加：以前年度损益调整		
五、利润总额	200,463.63	408,474.86
减：所得税	10,023.18	20,423.75
六、净利润	190,440.45	388,051.11
加：年初未分配的利润	641,238.32	253,221.53
其他调整因素		-34.32
七、可供分配的利润	831,678.77	641,238.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意公积金		
其他	797,456.69	
八、未分配利润	34,222.08	641,238.32

扫描全能王 创建

现金流量表

单位名称：青海泽标建设工程有限公司　　2024年度　　金额单位：人民币元

项　　目	本年累计金额	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,669,356.64	59,038,384.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		274,572.96
经营活动现金流入小计	71,669,356.64	59,312,957.12
购买商品、接受劳务支付的现金	59,917,794.54	52,282,593.16
支付给职工以及为职工支付的现金	913,431.23	595,538.20
支付的各项税费	2,415,550.35	1,753,182.39
支付其他与经营活动有关的现金	6,394,760.22	179,305.84
经营活动现金流出小计	69,641,536.34	54,810,619.59
经营活动产生的现金流量净额	2,027,820.30	4,502,337.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,125,000.00
取得借款收到的现金	1,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,800,000.00	2,125,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,800,000.00	2,125,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,827,820.30	6,627,337.53
加：期初现金及现金等价物余额	12,068,954.70	5,441,085.80
六、期末现金及现金等价物余额	15,896,775.00	12,068,423.33

青海泽标建设工程有限公司 财务专用章
青海泽标建设工程有限公司 审计报告专用章
青海泽标建设工程有限公司
扫描全能王 创建

所有者权益变动表

2024年度

编制单位：青海泽标建设工程有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	本年金额														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	6,289,600.00										641,238.32		6,930,838.32		6,930,838.32
加：会计政策变更															
前期差错更正															
以前年度损益调整															
二、本年年初余额	6,289,600.00										641,238.32		6,930,838.32		6,930,838.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号											190,440.45		190,440.45		190,440.45
（一）综合收益总额											190,440.45		190,440.45		190,440.45
（二）所有者投入和减少资本															
1、所有者投入的普通股															
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他															
（三）专项储备提取和使用															
1、提取专项储备															
2、使用专项储备															
（四）利润分配															
1、提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
#储备基金															
#企业发展基金															
#利润归还投资															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者（或股东）的分配															
4、其他											797,456.69		797,456.69		797,456.69
（五）所有者权益内部结转															
1、资本公积转增资本（或股本）															
2、盈余公积转增资本（或股本）															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收															
5、其他															
四、本年年末余额	6,289,600.00										1,629,135.46		7,918,735.46		7,918,735.46

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

青海华宇会计师事务所有限公司 审计报告专用章

青海泽标建设工程有限公司

扫描全能王 创建

会计报表附注

一、公司基本情况

青海泽标建设工程有限公司（以下简称本公司）于 2020 年 04 月 07 日注册登记成立，统一社会信用代码：91630100MA759T5Q75，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。注册地址：青海省西宁市城中区南川东路 85 号 40 号楼 2 单元 261 室；法定代表人：李积英；注册资本：伍仟万元整。

经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；舞台工程施工；林木种子生产经营；草种生产经营；文物保护工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络运货）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；五金产品零售；市政设施管理；城乡市容管理；机械设备销售；智能农机装备销售；人工造林；广告制作；节能管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；水环境污染防治服务；太阳能热利用产品销售；土壤污染治理与修复服务；建筑材料销售；水污染治理；玩具销售；水土流失防治服务；白蚁防治服务；日用品销售；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；汽车销售；停车场服务；花卉种植；礼品花卉销售；城市绿化管理；草种植；森林防火服务；房屋拆迁服务；牲畜销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；肥料销售；化肥销售；农用薄膜销售；塑料制品销售；充电桩销售；机动车充电销售；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；金属制品销售；消防器材销售；体育用品及器材零售；照相机及器材销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；饲料原料销售；饲料生产专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；办公用品销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；自然生态系统保等；

二、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

扫描全能王 创建

财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本公司财务状况、经营成果等有关信息。

会计年度

公司采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

记账基础及计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

现金等价物

公司将期限较短（指购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

坏账核算

（1）坏账的确认标准

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；

债务人逾期未履行其偿债义务，且有明显特征表明无法收回的货款。

（2）坏账准备的计提方法

坏账损失采用直接核销法核算

存货及跌价准备

（1）存货的分类：公司存货主要包括原材料、低值易耗品、委托加工材料等。

（2）存货的取得和发出计价

1）原材料按实际成本核算。

2）低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

扫描全能王 创建

（3）存货盘存采用永续盘存法。

（4）存货跌价准备的核算方法

公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。年度终了，公司对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货可变现净值低于成本价时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，同时计入当期损益。对已霉烂变质、已过期且无转让价值、经营中已不再需要且无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的存货的账面价值全部转入当期损益。

固定资产及折旧

（1）固定资产标准

公司将拥有的使用年限在一年以上、单位在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产。对非生产经营用主要设备的资产，单位价值在2000元以上，且使用年限在两年以上的，也作为固定资产。

（2）固定资产的分类和计价方法

公司根据生产经营的实际情况，将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、办公设备三大类。公司对固定资产采用实际成本法计价。购建固定资产使其达到可使用状态前所发生的符合资本化条件的借款费用予以资本化；有关重大扩充、更换及翻新、技术改造而增加的价值作为资本支出，列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用；固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处置净损益计入当期营业外收入或支出。

（3）固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法计提。各类固定资产估计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	10	4.5
运输设备	10	5	9.5
办公设备	3	3	32.33

扫描全能王 创建

（4）固定资产减值准备的计提方法

公司在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，但当存在下列情形之一时，按该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后生产大量不合格产品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

在建工程

（1）在建工程按实际发生成本核算，对建造的固定资产，达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按规定计提固定资产折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

（2）为在建工程项目而发生的借款费用，按借款费用资本化的原则，在项目已达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在固定资产已达到预定可使用状态后发生的，计入当期损益。

（3）在建工程减值准备的计提标准及方法

公司在会计期末，对在建工程进行逐项检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可收回金额的差额确定。

借款费用

（1）为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。

扫描全能王 创建

（2）为购建固定资产而发生的专门借款费用，在所购建的固定资产已达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入所购建的固定资产成本；在已达到预定可使用状态后发生的，计入当期财务费用。

企业发行债券筹集资金专项用于购建固定资产的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将发生金额较大的发行费用（减去发行期间冻结资金产生的利息收入），直接计入所购建的固定资产成本；向银行借款而发生的手续费，也按上述同一原则处理。

因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

无形资产

（1）无形资产计价和摊销方法

对无形资产按取得时发生的实际成本计价，并在受益期内或法律规定的有效年限内采用直线法平均摊销。

（2）无形资产减值准备的计提方法

公司在会计期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌、在剩余摊销年限内预期不会恢复或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，提取时按单个无形资产项目的成本高于其可收回金额的差额确定。

收入

（1）主营业务收入的确认方法：公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品继续实施与所有权有关的管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭证，并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量

扫描全能王 创建

时，确认营业收入的实现。

（2）劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日按劳务完成程度和劳务结果的可预计性确认相关的劳务收入。

所得税

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

三、税　项

公司适用的主要税种及税率如下：

税　　种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	13%
城市维护建设税	应缴纳增值税额	7%
教育费附加	应缴纳增值税额	3%
地方教育费附加	应缴纳增值税额	2%
企业所得税	应纳企所得额	25%

四、会计报表科目附注

1、货币资金

项　　目	期末数	期初数
现　　金	3,160.75	3,160.75
银行存款	15,893,614.25	12,065,262.58
合　　计	15,896,775.00	12,068,423.33

2、应收账款

应收账款期末数 12,131,608.83 元，其中：

债务年限	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)	备注
1年以内	10,166,747.14	[illegible]	2,804,864.81	76.52	
1-2年	1,130,150.06	[illegible]	314,089.30	8.57	
2-3年	288,092.00	[illegible]	546,619.63	14.91	
3年以上	546,619.63	4.51	2,804,864.81		

扫描全能王 创建

合　计	12,131,608.83	100.00	3,665,573.74	100.00	

大额债务人如下：

债务人名称	账龄	期末数	占总额比例（%）	备注
曲麻莱县发展和改革局	1年以内	1,946,976.13	16.05	
西宁市城中区城乡建设局	1年以内	2,250,000.00	18.55	
共和县自然资源和林业草原局	1-2年	1,224,900.00	10.10	
尖扎县住房和城乡建设局	1年以内	1,041,298.00	8.58	
果洛藏族自治州林业和草原站	1年以内	625,226.16	5.15	
甘德县自然资源局和林业草原局	1-2年	550,798.00	4.54	
西宁市湟中区住房和城乡建设局	1年以内	656,752.31	5.41	
合　计		8,421,276.13	68.38	

3、其他应收款

其他应收款期末数 12,005,793.39元，其中：

债务年限	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)	备注
1年以内	7,738,474.13	64.46	7,352,048.92	89.77	
1-2年	4,174,819.26	34.77	837,914.35	10.23	
2-3年	92,500.00	0.77			
3年以上					
合　计	12,005,793.39	100.00	8,189,963.27	100.00	

大额债务人如下：

债务人名称	账龄	期末数	占总额比例(%)	备注
青海宁政工程项目管理有限责任公司	2-3年	80,000.00	0.67	
青海富讯工程项目管理有限公司	1-2年	196,701.50	1.64	
青海昀邦生态农业科技有限公司	1年以内	393,200.00	3.28	
青海臻珀商贸有限公司	1年以内	1,000,000.00	8.33	
黄河源园区国家公园管理委员会	1-2年	141,259.50	1.18	

扫描全能王 创建

中共大通回族土族自治县委统一战线工作部	1-2 年	216,272.95	1.80	
果洛藏族自治州卫生健康委员会	1-2 年	202,299.00	1.69	
李积英	1 年以内	4,814,229.95	40.10	
齐雪霞	1 年以内	190,000.00	1.58	
西宁市城东区应急管理局	1 年以内	193,255.10	1.61	
海东市平安区住房和城乡建设局	1-2 年	2,114,459.60	17.61	
合　计		9,541,677.60	79.48	

4、预付账款

预付账款期末数 12,074,231.33 元，其中：

债务年限	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)	备注
1 年以内	7,274,584.46	60.25	4,624,481.58	42.82	
1-2 年	3,029,773.37	25.09	6,175,966.09	57.18	
2-3 年	1,769,873.50	14.66			
3 年以上					
合　计	12,074,231.33	100.00	10,800,448.67	100.00	

大额债务人如下：

债务人名称	账龄	期末数	占总额比例（%）	备注
青海正立建设工程管理有限公司	1 年以内	20,000.00	0.17	
青海佳凯农牧开发有限公司	2-3 年	850,604.50	7.04	
青海圣钰工程机械租赁有限公司	1-2 年	580,000.00	4.80	
玛多县天河开发建设有限责任公司	1 年以内	3,292,000.00	27.26	
互助县竟辉仓储物流有限公司	1-2 年	549,868.22	4.55	
济宁鸿顺草制品有限公司	1 年以内	222,700.00	1.84	
嘉祥县宏盛秸秆加工厂	1 年以内	365,000.00	3.02	
大通建飞新型建材有限公司	1-2 年	300,066.00	2.49	
陆广阔	1-2 年	350,000.00	2.90	

扫描全能王 创建

海西鸿瀚涛劳务有限公司	1年以内	483,000.00	4.00	
河南聚利环保科技有限公司	1年以内	416,000.00	3.45	
青海创耀建筑工程有限公司	1年以内	219,800.00	1.82	
合　计		7,649,038.72	63.35	

5、存货

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原材料				
库存商品	201,034.10	0.00	0.00	201,034.10
生产成本				
工程施工	3,040,529.70	68,544,420.08	60,807,302.59	10,777,647.19
合　计	3,241,563.80	68,544,420.08	60,807,302.59	10,978,681.29

6、固定资产及累计折旧

类　别	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原价合	447,118.24			447,118.24
其中：房屋构筑物				
机械设备				
运输设备	373,353.98			373,353.98
办公设备				
电子设备	73,764.26			73,764.26
二、累计折旧合计	127,454.58	50,004.60		177,459.18
其中：房屋构筑物				
机械设备				
运输设备	95,578.26	35,841.96		131,420.22
办公设备				
电子设备	31,876.32	14,162.64		46,038.96

扫描全能王 创建

三、固定资产账面净额	319,663.66			269,659.06
其中：房屋构筑物				-
机械设备				-
运输设备	275,775.72			241,933.76
办公设备				-
电子设备	41,887.94			27,725.30

7、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原值	7,000.00			7,000.00
财务软件	7,000.00			7,000.00
二、累计摊销	2,216.73	1,400.04		3,616.77
财务软件	2,216.73	1,400.04		3,616.77
三、减值准备				
财务软件	4,783.27			3,383.23
四、账面价值合计	4,783.27			3,383.23

8、短期借款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
经营快贷	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
合　计	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00

9、应付账款

应付账款期末数 31,811,037.04 元，其中

债权年限	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)	备注
1年以内	22,594,020.72	71.03	16,732,889.70	87.92	
1-2年	7,246,523.32	22.78	2,299,360.00	12.08	
2-3年	1,970,493.00	6.19	-		
3年以上					

扫描全能王 创建

合　计	31,811,037.04	100.00	19,032,249.70	100.00	

大额债权人如下：

债权人名称	账龄	期末数	占总额比例（%）	备注
青海达爱建筑装饰工程程有限公司	1年以内	1,290,000.00	4.06	
青海炜硕建筑工程有限公司	1年以内	1,300,000.00	4.09	
青海合悦建筑劳务有限公司	1-2年	1,075,000.00	3.38	
杭州中迈建筑劳务有限公司	1年以内	3,000,000.00	9.43	
青海创辉建筑工程有限公司	1年以内	789,800.00	2.48	
甘德青悦广告装饰店	1年以内	643,200.00	2.02	
合　计		8,098,000.00	25.46	

10、预收账款

预收账款期末数 21,810,726.39 元，其中：

债权年限	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)	备注
1年以内	13,707,649.48	62.85	5,439,210.38	53.68	
1-2年	5,990,646.77	27.47	4,694,365.57	46.32	
2-3年	2,112,430.14	9.69	-		
3年以上					
合　计	21,810,726.39	100.00	10,133,575.95	100.00	

大额债权人如下：

债权人名称	账龄	期末数	占总额比例（%）	备注
甘德县农牧水利和科技局	1年以内	4,890,646.77	22.42	
格尔木市林业和草原局	1年以内	6,068,040.21	27.82	
西宁市城中区城乡建设局	1-2年	1,100,000.00	5.04	
海东市平安区住房和城乡建设局	1年以内	1,329,059.60	6.09	
曲麻莱县发展和改革局	1年以内	1,946,976.13	8.93	

扫描全能王 创建

合　计		10,958,686.98	70.31	

11、应交税费

名　称	期末数	期初数
企业所得税	4,288.20	17,972.51
增值税	-236,550.89	-31,196.69
印花税	17,405.23	
环保税		
个人所得税		
城市维护建设税		2,719.73
教育费附加	0.01	1,165.60
地方教育费附加	0.01	777.07
合　计	214,937.41	-8,561.78

12、其他应付款

其他应付款期末数 1,829,404.06 元，其中：

债权年限	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)	备注
1年以内	1,302,105.06	71.18	2,202,317.55	100.00	
1-2年	527,299.00	28.82			
2-3年	-				
3年以上					
合　计	1,829,404.06	100.00	2,202,317.55	100.00	

大额债权人如下：

债权人名称	账龄	期末数	占总额比例（%）	备注
果洛鑫旺砂石有限责任公司	1-2年	202,299.00	11.06	
西宁市城北区裕川不锈钢经营部	1-2年	301,000.00	16.45	
贺永芳	1年以内	350,000.00	19.13	
甘德县农牧水利和科技局	1年以内	568,602.32	31.08	
合　计		1,421,901.32	77.72	

扫描全能王 创建

13、实收资本

项　目	期末数	占总额比例（%）
李积英	6,289,600.00	100.00
合　计	6,289,600.00	100.00

14、未分配利润

项 目	2024 年度	2023 年度
净利润	190,440.45	388,051.11
以前年度损益调整		-34.32
年初未分配利润	641,238.32	253,221.53
提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取任意盈余公积		
支付普通股股利		
利润分配		
其他	797,456.69	
未分配利润	34,222.08	641,238.32

15、主营业务收入

项　目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	62,166,485.62	54,834,951.12
合　计	62,166,485.62	54,834,951.12

16、主营业务成本

项　目	本期发生数	上期发生数
主营业务成本	60,174,437.02	53,445,129.26
合　计	60,174,437.02	53,445,129.26

17、营业税金及附加

扫描全能王 创建

项　目	本期发生数	上期发生数
环保税		
印花税	25,434.33	9,169.42
车船税		
土地使用税		
房产税		
城市维护建设税	91,617.02	51,321.51
教育费附加	42,878.25	24,295.72
地方教育费附加	28,585.44	16,197.10
残保金		
合　计	9,515.04	100,983.75

18、销售费用

项　目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	692,643.32	458,847.00
交通费	295.50	21,956.55
其他费用	58,275.02	47,313.39
项目报名费	27,724.00	25,700.00
折旧费	50,004.60	35,841.96
招标代理费	33,000.00	5,400.00
项目履约保函	83,726.04	46,500.00
保险费		5,188.68
合　计	945,668.48	646,807.58

19、管理费用

扫描全能王 创建

项　目	本期发生数	上期发生数
办公费	144,155.36	30,819.22
差旅费	32,454.83	11,179.62
业务招待费	580.75	
咨询费	17,000.00	22,000.00
无形资产摊销	1,400.04	1,050.03
社会社保(单位)	220,548.35	136,691.20
其他费用	36,744.01	5,741.01
培训费	2,550.00	18,240.00
汽车费用	15,142.07	
折旧费		11,293.92
合　计	471,577.41	237,015.00

20、财务费用

项　目	本期发生数	上期发生数
利息支出	24,700.00	0.00
利息收入	-6,719.89	-6,844.90
手续费	6,133.80	4,766.93
合　计	24,113.91	-1,077.97

21、营业外收入

项　目	本期发生数	上期发生数
其他（违约金收益）	3.17	
其他（政府补助）	3,468.96	2,381.36
处置固定资产净收益		
合　计	3,472.13	2,381.36

扫描全能王 创建

22、营业外支出

项　目	本期发生数	上期发生数
税收滞纳金、罚金、罚款	165,713.63	0.00
处置固定资产净损失		
合　计	165,713.63	0.00

23、所得税费用

项　目	本期发生数	上期发生数
所得税费用	10,923.18	20,423.75
合　计	10,923.18	20,423.75

五、会计政策、会计估计变更及会计差错更正

1、会计政策变更

公司本期无会计政策变更事项。

2、会计估计变更

公司本期无会计估计变更事项。

3、重大会计差错更正

公司本期无重大会计差错更正事项。

六、其他事项

无

青海泽标建设工程有限公司

二〇二五年三月十八日

扫描全能王 创建



统一社会信用代码

91630100661908235 3

营业执照

（副 本）

(1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　青海华宇会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　臧建宁

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设项目竣工决算财务审计；基本建设项目年度财务决算审计；会计培训；任期经济责任及其他专项审计；所得税汇算清缴鉴证；会计咨询及服务业务（以上项目凭执业证书经营）（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）※※※

注册资本　壹佰万元整

成立日期　2007年08月16日

住　　所　青海省西宁市城北区宁张路44号创业创新大厦8层8-1室

登记机关

2024 年 06 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

扫描全能王 创建



会计师事务所

执业证书

名　　称：青海华宇会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：臧建宁

经营场所：青海省西宁市城北区宁张路44号创业创新大厦8层8-1室

组织形式：有限责任

执业证书编号：63010006

批准执业文号：青财会字[2007]114号

批准执业日期：2007年8月7日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。


再次复印无效

发证机关：青海省财政厅

2007年 8 月 7 日

中华人民共和国财政部制

扫描全能王 创建

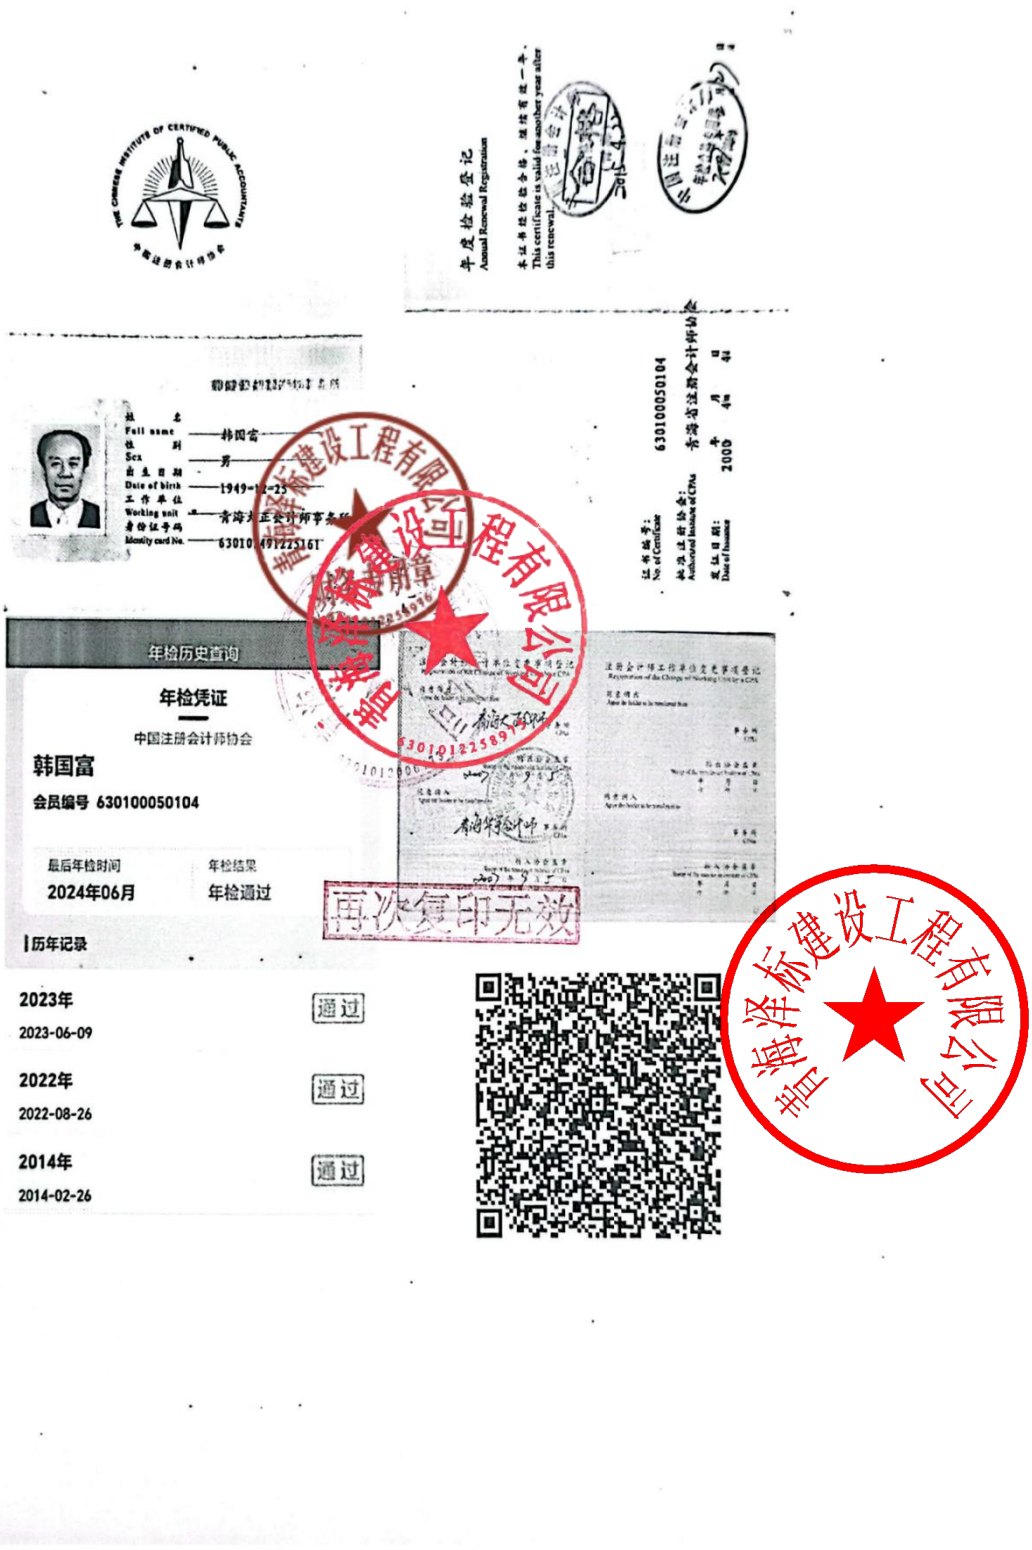
年检历史查询
年检凭证
中国注册会计师协会
韩国富
会员编号 630100050104
最后年检时间
2024年06月
年检结果
年检通过
历年记录
2023年
2023-06-09
通过
2022年
2022-08-26
通过
2014年
2014-02-26
通过
再次复印无效

扫描全能王 创建





年检凭证

中国注册会计师协会 .

刘国荣

会员编号 630200110184

最后年检时间	年检结果
2024年06月	年检通过

历年记录


2023年 2023-06-09	通过
2022年 2022-08-26	通过
2014年 2014-02-26	通过







扫描全能王 创建

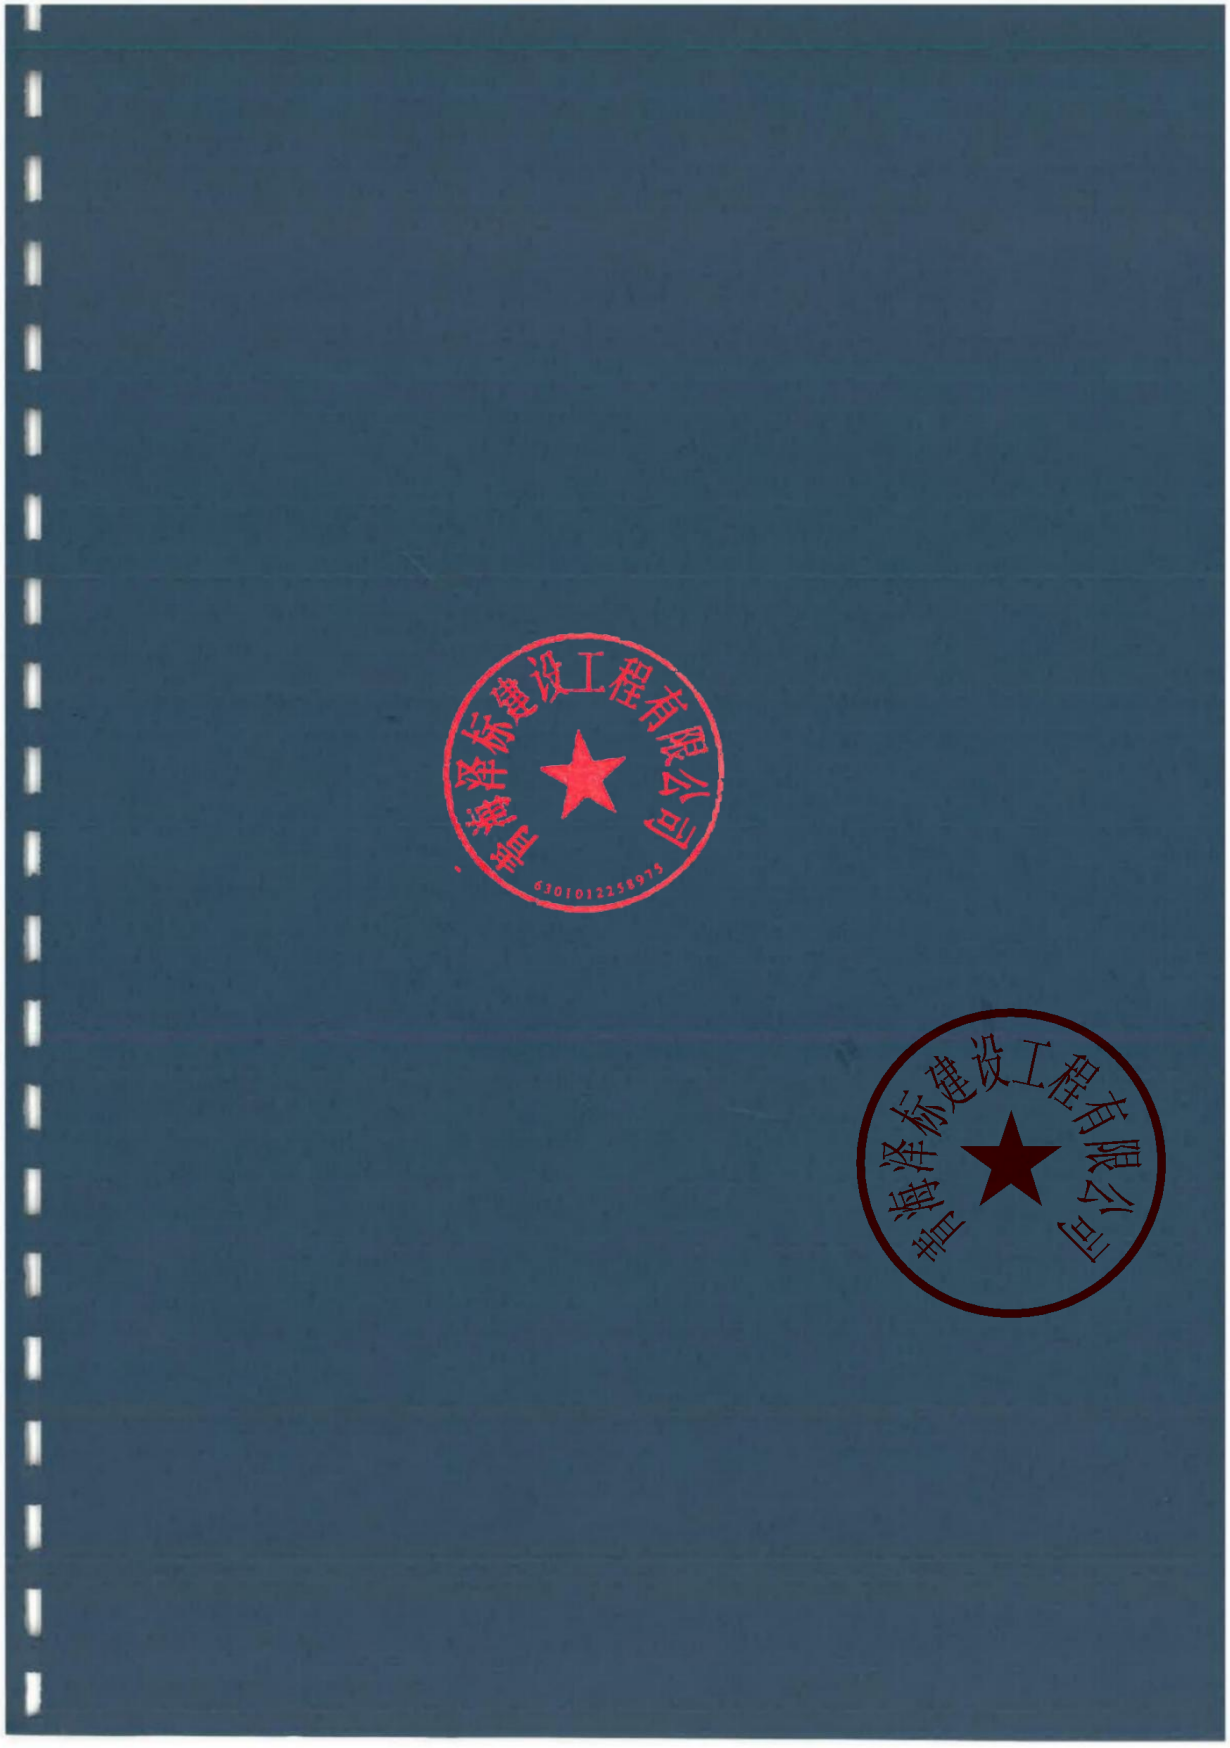

海泽标建设工程有限公司
630101225897S
海泽标建设工程有限公司

青海泽标建设工程有限公司2024年财务状况说明表

项目	行次	本年累计数
一、主营业务收入	1	62,166,485.62
减：主营业务成本	2	60,174,437.02
主营业务税金及附加	3	188,515.04
二、主营业务利润	4	1,803,533.56
减：销售费用	5	945,668.48
减:管理费用	6	471,577.41
减：财务费用	7	24,113.91
三、营业利润	8	362,173.76
四、利润总额	9	200,463.63
减：所得税	10	10,033.18
五、净利润	11	190,430.45
六、可分配利润	12	190,430.45

依法缴纳税收的凭证

2025 年 01 月

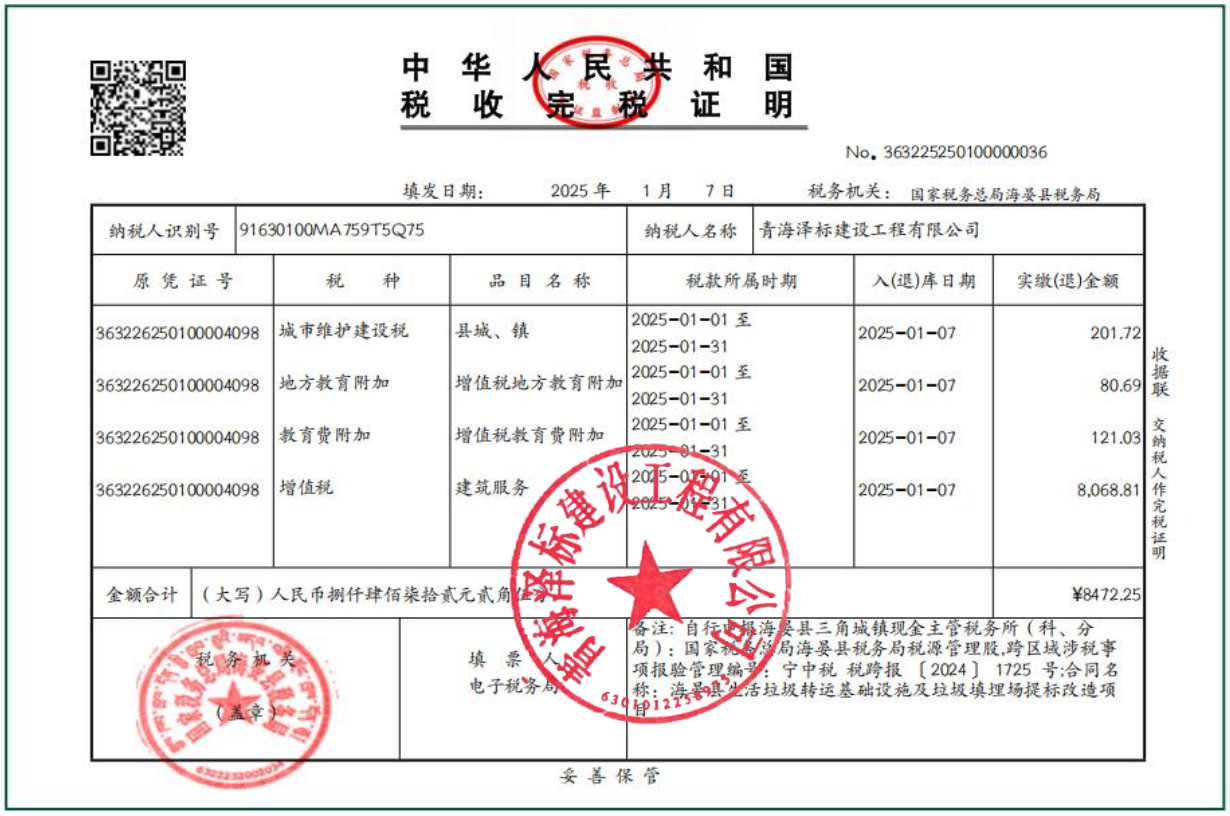

中华人民共和国
税收完税证明

No. 363225250100000036

填发日期：2025 年 1 月 7 日　　税务机关：国家税务总局海晏县税务局

纳税人识别号	91630100MA759T5Q75	纳税人名称	青海泽标建设工程有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
363226250100004098	城市维护建设税	县城、镇	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-01-07	201.72
363226250100004098	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-01-07	80.69
363226250100004098	教育费附加	增值税教育费附加	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-01-07	121.03
363226250100004098	增值税	建筑服务	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-01-07	8,068.81
金额合计	（大写）人民币捌仟肆佰柒拾贰元贰角伍分				¥8472.25

税务机关（盖章）

填票人 电子税务局

备注：自行申报海晏县三角城镇现金主管税务所（科、分局）；国家税务总局海晏县税务局税源管理股,跨区域涉税事项报验管理编号：宁中税 税跨报〔2024〕1725 号;合同名称：海晏县生活垃圾转运基础设施及垃圾填埋场提标改造项目

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

2025 年 02 月

增值税及附加税费申报表

（一般纳税人适用）

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表，纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自2025年2月1日至2025年2月28日　　填表日期：2025年3月4日　　金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91630100MA759T5Q75　　所属行业：其他未列明建筑业

纳税人名称	[redacted]建设工程有限公司	法定代表人姓名	李积英	注册地址	青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室	生产经营地址	青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室
开户银行及账号	中国建设银行股份有限公司西宁上尕庄支行：63050127654200000179	登记注册类型	私营有限责任公司		电话号码	13997165993	

项目		栏次	一般项目		即征即退项目	
			本月数	本年累计	本月数	本年累计
销售额	（一）按适用税率计税销售额	1	0.00	1,433,070.19	0.00	0.00
	其中：应税货物销售额	2	0.00	884,955.75	0.00	0.00
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	（二）按简易办法计税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	（三）免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	——	——
	（四）免税销售额	8	0.00	0.00	——	——
	其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	——	——
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	——	——
税款计算	销项税额	11	0.00	164,374.55	0.00	0.00
	进项税额	12	0.00	0.00	0.00	0.00
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	——
	进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	免、抵、退应退税额	15	0.00		——	——
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	——	——
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	0.00	——	0.00	——
	实际抵扣税额	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额	19=11-18	0.00	164,374.55	0.00	0.00
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	——
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	——	——
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额合计	24=19+21-23	0.00	164,374.55	0.00	0.00
税款缴纳	期初未缴税额（多缴为负数）	25	-1,469,484.20	-1,469,484.20	0.00	0.00
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	——	——
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	0.00	164,374.55	0.00	0.00
	①分次预缴税额	28	0.00	——	——	——
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	——	——	——
	③本期缴纳上期应纳税额	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	④本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	期末未缴税额（多缴为负数）	32=24+25+26-27	-1,469,484.20	-1,469,484.20	0.00	0.00
	其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27	0.00	——	0.00	——
	本期应补（退）税额	34=24-28-29	0.00	——	0.00	——
	即征即退实际退税额	35	——	——	0.00	0.00
	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	——	——
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	——	——
	期末未缴查补税额	38=16+22+36-37	0.00	0.00	——	——
附加税费	城市维护建设税本期应补（退）税额	39	0.00	0.00	——	——
	教育费附加本期应补（退）费额	40	0.00	0.00	——	——
	地方教育附加本期应补（退）费额	41	0.00	0.00	——	——

声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容（及附带资料）的真实性、可靠性、完整性负责。

纳税人（签章）：　　年　月　日

经办人：陈莉 经办人身份证号：630103**********427 代理机构签章： 代理机构统一社会信用代码：	受理人：16300xdzswj 受理税务机关（章）：国家税务总局西宁市城中区税务局　受理日期：2025年3月4日

增值税及附加税费申报表附列资料（一）

（本期销售情况明细）

税款所属时间：2025年2月1日至2025年2月28日

纳税人名称：（公章）青海泽标建设工程有限公司　　金额单位：元（列至角分）

项目及栏次				开具增值税专用发票		开具其他发票		未开具发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额	扣除后	
				销售额	销项（应纳）税额	销售额	销项（应纳）税额	销售额	销项（应纳）税额	销售额	销项（应纳）税额	销售额	销项（应纳）税额	价税合计		含税（免税）销售额	销项（应纳）税额
				1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10	12	13=11-12	14=13÷（100%+税率或征收率）×税率或征收率
一、一般计税方法计税	全部征税项目	13%税率的货物及加工修理修配劳务	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
		13%税率的服务、不动产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9%税率的货物及加工修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
		9%税率的服务、不动产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6%税率	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：即征即退项目	即征即退货物及加工修理修配劳务	6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
		即征即退服务、不动产和无形资产	7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、简易计税方法计税	全部征税项目	6%征收率	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
		5%征收率的货物及加工修理修配劳务	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
		5%征收率的服务、不动产和无形资产	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
		3%征收率的货物及加工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
		3%征收率的服务、不动产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预征率a%	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预征率b%	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预征率c%	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：即征即退项目	即征即退货物及加工修理修配劳务	14	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—
		即征即退服务、不动产和无形资产	15	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、免抵退税	货物及加工修理修配劳务		16	—	—	0.00		0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—
	服务、不动产和无形资产		17	—	—	0.00		0.00	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	0.00	—
四、免税	货物及加工修理修配劳务		18	0.00	0.00	0.00		0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—
	服务、不动产和无形资产		19	—	—	0.00		0.00	—	—	—	0.00	—	0.00	0.00	0.00	—

增值税及附加税费申报表附列资料（二）

（本期进项税额明细）

税款所属时间：2025年2月1日至2025年2月28日

纳税人名称：（公章）青海泽标建设工程有限公司

金额单位：元（列至角分）

一、申报抵扣的进项税额

项目	栏次	份数	金额	税额
（一）认证相符的增值税专用发票	1=2+3	0	0.00	0.00
其中：本期认证相符且本期申报抵扣	2	0	0.00	0.00
前期认证相符且本期申报抵扣	3	0	0.00	0.00
（二）其他扣税凭证	4=5+6+7+8a+8b	0	0.00	0.00
其中：海关进口增值税专用缴款书	5	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	6	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	7	0	——	0.00
加计扣除农产品进项税额	8a	——	——	0.00
其他	8b	0	0.00	0.00
（三）本期用于购建不动产的扣税凭证	9	0	0.00	0.00
（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证	10	0	0.00	0.00
（五）外贸企业进项税额抵扣证明	11	——	——	0.00
当期申报抵扣进项税额合计	12=1+4+11	0	0.00	0.00

二、进项税额转出额

项目	栏次	税额
本期进项税转出额	13=14至23之和	0.00
其中：免税项目用	14	0.00
集体福利、个人消费	15	0.00
非正常损失	16	0.00
简易计税方法征税项目用	17	0.00
免抵退税办法不得抵扣的进项税额	18	0.00
纳税检查调减进项税额	19	0.00
红字专用发票信息表注明的进项税额	20	0.00
上期留抵税额抵减欠税	21	0.00
上期留抵税额退税	22	0.00
异常凭证转出进项税额	23a	0.00
其他应作进项税额转出的情形	23b	0.00

三、待抵扣进项税额

项目	栏次	份数	金额	税额
（一）认证相符的增值税专用发票	24	——	——	——
期初已认证相符但未申报抵扣	25	0	0.00	0.00
本期认证相符且本期未申报抵扣	26	0	0.00	0.00
期末已认证相符但未申报抵扣	27	0	0.00	0.00
其中：按照税法规定不允许抵扣	28	0	0.00	0.00
（二）其他扣税凭证	29=30至33之和	0	0.00	0.00
其中：海关进口增值税专用缴款书	30	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	31	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	32	0	——	0.00
其他	33	0	0.00	0.00
	34			

四、其他

项目	栏次	份数	金额	税额
本期认证相符的增值税专用发票	35	0	0.00	0.00
代扣代缴税额	36	——	——	0.00

增值税及附加税费申报表附列资料（二）

（本期进项税额明细）

税款所属时间：2025年2月1日至2025年2月28日

纳税人名称：（公章）青海泽标建设工程有限公司

金额单位：元（列至角分）

一、申报抵扣的进项税额

项目	栏次	份数	金额	税额
（一）认证相符的增值税专用发票	1=2+3	0	0.00	0.00
其中：本期认证相符且本期申报抵扣	2	0	0.00	0.00
前期认证相符且本期申报抵扣	3	0	0.00	0.00
（二）其他扣税凭证	4=5+6+7+8a+8b	0	0.00	0.00
其中：海关进口增值税专用缴款书	5	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	6	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	7	0	——	0.00
加计扣除农产品进项税额	8a	——	——	0.00
其他	8b	0	0.00	0.00
（三）本期用于购建不动产的扣税凭证	9	0	0.00	0.00
（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证	10	0	0.00	0.00
（五）外贸企业进项税额抵扣证明	11	——	——	0.00
当期申报抵扣进项税额合计	12=1+4+11	0	0.00	0.00

二、进项税额转出额

项目	栏次	税额
本期进项税转出额	13=14至23之和	0.00
其中：免税项目用	14	0.00
集体福利、个人消费	15	0.00
非正常损失	16	0.00
简易计税方法征税项目用	17	0.00
免抵退税办法不得抵扣的进项税额	18	0.00
纳税检查调减进项税额	19	0.00
红字专用发票信息表注明的进项税额	20	0.00
上期留抵税额抵减欠税	21	0.00
上期留抵税额退税	22	0.00
异常凭证转出进项税额	23a	0.00
其他应作进项税额转出的情形	23b	0.00

三、待抵扣进项税额

项目	栏次	份数	金额	税额
（一）认证相符的增值税专用发票	24	——	——	——
期初已认证相符但未申报抵扣	25	0	0.00	0.00
本期认证相符且本期未申报抵扣	26	0	0.00	0.00
期末已认证相符但未申报抵扣	27	0	0.00	0.00
其中：按照税法规定不允许抵扣	28	0	0.00	0.00
（二）其他扣税凭证	29=30至33之和	0	0.00	0.00
其中：海关进口增值税专用缴款书	30	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	31	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	32	0	——	0.00
其他	33	0	0.00	0.00
	34			

四、其他

项目	栏次	份数	金额	税额
本期认证相符的增值税专用发票	35	0	0.00	0.00
代扣代缴税额	36	——	——	0.00

增值税及附加税费申报表附列资料（三）

（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）

税款所属时间：2025年2月1日至2025年2月28日

纳税人名称：（公章）青海泽标建设工程有限公司　　金额单位：元（列至角分）

项目及栏次		本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）	服务、不动产和无形资产扣除项目				
			期初余额	本期发生额	本期应扣除金额	本期实际扣除金额	期末余额
		1	2		4=2+3	5(5≤1且5≤4)	6=4-5
13%税率的项目	1						
9%税率的项目	2						
6%税率的项目（不含金融商品转让）	3						
6%税率的金融商品转让项目	4						
5%征收率的项目	5						
3%征收率的项目	6						
免抵退税的项目	7						
免税的项目	8						

增值税及附加税费申报表附列资料（四）

（税额抵减情况表）

税款所属时间：2025年2月1日至2025年2月28日

纳税人名称：（公章）青海泽标建设工程有限公司

金额单位：元（列至角分）

一、税额抵减情况						
序号	抵减项目	期初余额	本期发生额	本期应抵减税额	本期实际抵减税额	期末余额
		1	2	3=1+2	4≤3	5=3-4
1	增值税税控系统专用设备费及技术维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	分支机构预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	建筑服务预征缴纳税款	63,193.20	0.00	63,193.20	0.00	63,193.20
4	销售不动产预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	出租不动产预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、加计抵减情况							
序号	加计抵减项目	期初余额	本期发生额	本期调减额	本期可抵减额	本期实际抵减额	期末余额
		1	2	3	4=1+2-3	5	6=4-5
6	一般项目加计抵减额计算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	即征即退项目加计抵减额计算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）附列资料（五）

（附加税费情况表）

税（费）款所属时间：2025年2月1日至2025年2月28日

纳税人名称：（公章）青海泽标建设工程有限公司

金额单位：元（列至角分）

本期是否适用小微企业“六税两费”减免政策				■是 □否		减免政策适用主体			□个体工商户 ■小型微利企业				
						适用减免政策起止时间			2025年2月1日至2025年2月28日				
税（费）种	计税（费）依据			税（费）率（%）	本期应纳税（费）额	本期减免税（费）额		小微企业“六税两费”减免政策		试点建设培育产教融合型企业		本期已缴税（费）额	本期应补（退）税（费）额
	增值税税额	增值税免抵税额	留抵退税本期扣除额			减免性质代码	减免税（费）额	减征比例（%）	减征额	减免性质代码	本期抵免金额		
	1	2	3	4	5=(1+2-3)×4	6	7	8	9=(5-7)×8	10	11	12	13=5-7-9-11-12
城市维护建设税	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
教育费附加	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
地方教育附加	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	0.00	--		--	0.00	--	0.00	0.00	0.00

本期是否适用试点建设培育产教融合型企业抵免政策	□是 ■否	当期新增投资额	5	0.00
		上期留抵可抵免金额	6	0.00
		结转下期可抵免金额	7	0.00
可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况		当期新增可以用于扣除的留抵退税额	8	0.00
		上期结存可用于扣除的留抵退税额	9	0.00
		结转下期可用于扣除的留抵退税额	10	0.00

增值税减免税申报明细表

税款所属时间： 自2025年2月1日 至 2025年2月28日


纳税人名称（公章）：青海泽标建设工程有限公司

金额单位：元（列至角分）

一、减税项目						
减税性质代码及名称	栏次	期初余额	本期发生额	本期应抵减税额	本期实际抵减税额	期末余额
		1	2	3=1+2	4≤3	5=3-4
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、免税项目						
免税性质代码及名称	栏次	免征增值税项目销售额	免税销售额扣除项目本期实际扣除金额	扣除后免税销售额	免税销售额对应的进项税额	免税额
		1	2	3=1-2	4	5
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	2	0.00	0.00	0.00	--	0.00
其中:跨境服务	3	0.00	0.00	0.00	--	0.00

2025 年 03 月

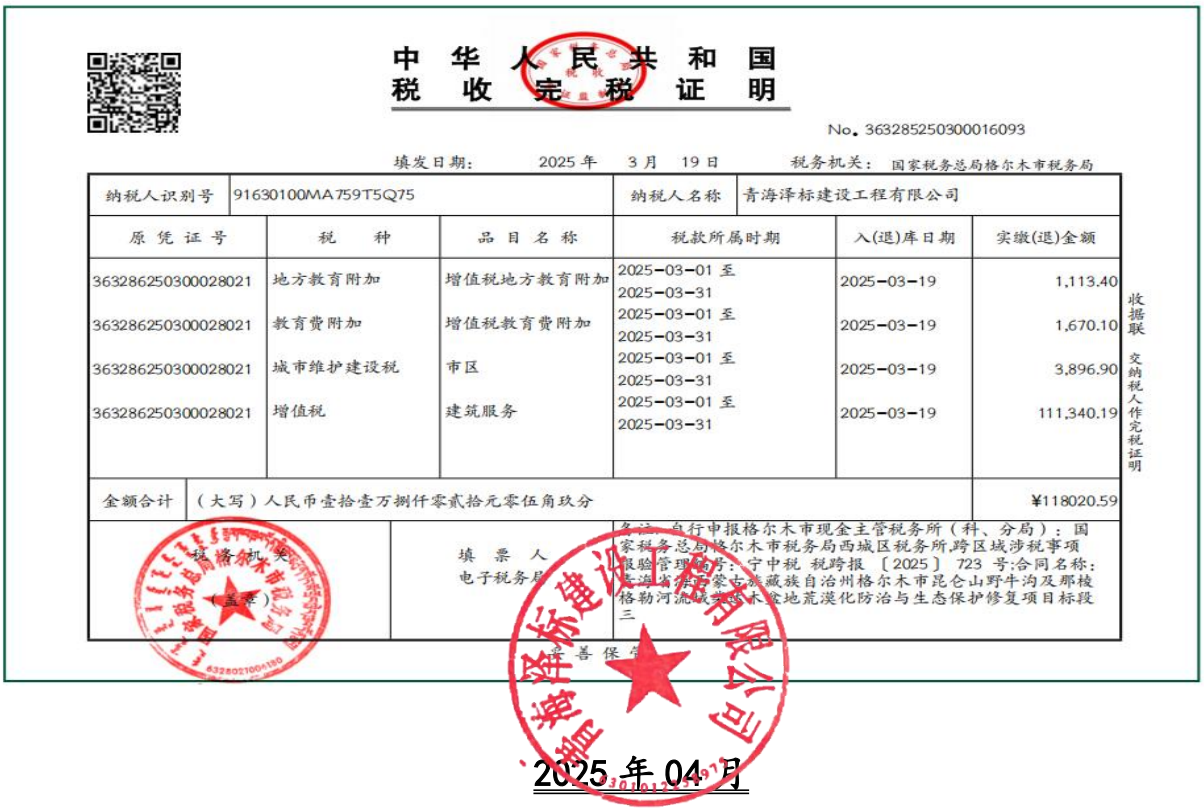

中华人民共和国
税收完税证明

No. 363285250300016093

填发日期：2025 年 3 月 19 日　　税务机关：国家税务总局格尔木市税务局

纳税人识别号	91630100MA759T5Q75		纳税人名称	青海泽标建设工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
363286250300028021	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-03-19	1,113.40
363286250300028021	教育费附加	增值税教育费附加	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-03-19	1,670.10
363286250300028021	城市维护建设税	市区	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-03-19	3,896.90
363286250300028021	增值税	建筑服务	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-03-19	111,340.19
金额合计	（大写）人民币壹拾壹万捌仟零贰拾元零伍角玖分				¥118020.59


税务机关（盖章）　　填票人 电子税务局

备注：自行申报格尔木市现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局格尔木市税务局西城区税务所,跨区域涉税事项报验管理编号：宁中税 税跨报〔2025〕723 号;合同名称：青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市昆仑山野牛沟及那棱格勒河流域重点生态地荒漠化防治与生态保护修复项目标段三

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

2025 年 04 月

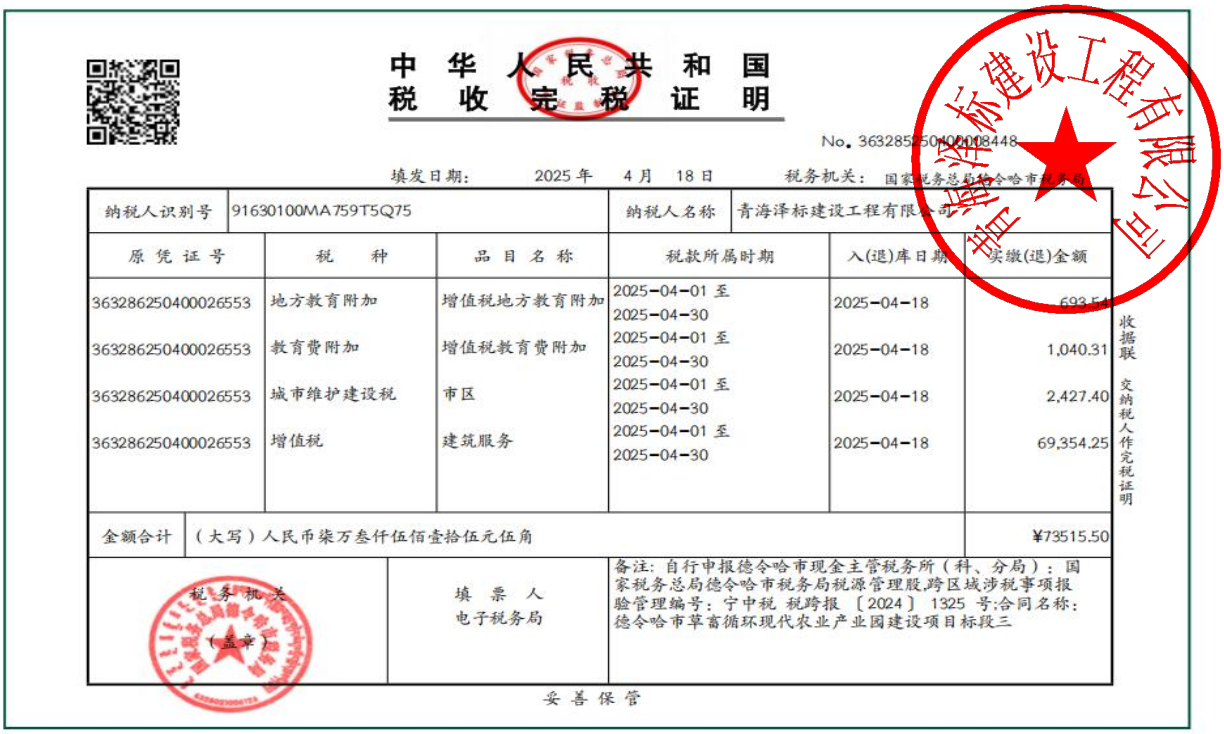

中华人民共和国
税收完税证明

No. 363285250400008448

填发日期：2025 年 4 月 18 日　　税务机关：国家税务总局德令哈市税务局

纳税人识别号	91630100MA759T5Q75		纳税人名称	青海泽标建设工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
363286250400026553	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-04-18	693.54
363286250400026553	教育费附加	增值税教育费附加	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-04-18	1,040.31
363286250400026553	城市维护建设税	市区	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-04-18	2,427.40
363286250400026553	增值税	建筑服务	2025-04-01 至 2025-04-30	2025-04-18	69,354.25
金额合计	（大写）人民币柒万叁仟伍佰壹拾伍元伍角				¥73515.50

税务机关（盖章）　　填票人 电子税务局

备注：自行申报德令哈市现金主管税务所（科、分局）：国家税务总局德令哈市税务局税源管理股,跨区域涉税事项报验管理编号：宁中税 税跨报〔2024〕1325 号;合同名称：德令哈市草畜循环现代农业产业园建设项目标段三

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

2025 年 05 月

中华人民共和国
税收完税证明

No. 363255250500004012

填发日期：2025 年 5 月 6 日　　税务机关：国家税务总局共和县税务局

纳税人识别号	91630100MA759T5Q75		纳税人名称	青海泽标建设工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
363256250500001023	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-05-06	583.25
363256250500001023	教育费附加	增值税教育费附加	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-05-06	874.87
363256250500001023	增值税	建筑服务	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-05-06	58,324.77
363256250500001023	城市维护建设税	非市区、县城、镇	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-05-06	291.62
金额合计	（大写）人民币陆万零柒拾肆元伍角壹分				¥60074.51
税务机关（盖章）	填票人 电子税务	备注：自行申报共和县沙珠玉乡种子村现金主管税务所（科、分局）；国家税务总局共和县税务局税源管理一股,跨区域涉税事项报验管理编号：宁中税 税跨报〔2025〕1228 号;合同名称：共和县2024-2025年度共和盆地沙漠化防治及草原生态恢复治理项目（天然林保护与营造林工程及荒漠化治理工程）标段十四			

收据联　交纳税人作完税证明

保管

依法缴纳社保的凭证

2025 年 1 月份

中华人民共和国
税收完税证明

No. 463015250100012174

填发日期： 2025 年 1 月 7 日　　税务机关： 国家税务总局西宁市城中区税务局

纳税人识别号	91630100MA759T5Q75	纳税人名称	青海泽标建设工程有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
463016250100032095	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-07	14,935.68
463016250100032095	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-01-01至2025-01-31	2025-01-07	7,467.84
金额合计	（大写）贰万贰仟肆佰零叁元伍角贰分				￥22,403.52

西宁市城中区税务局 税务机关（盖章） 征税专用章

填 票 人
单位社保费管理客户端

备注
正常申报一般申报正税自行申报青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室主管税务所（科、分局）：国家税务总局西宁市城中区税务局南川税务分局

第 1 次打印　　妥善保存

2025 年 2 月份

中华人民共和国
税收完税证明

No. 463015250200004770

填发日期： 2025 年 2 月 17 日　　税务机关： 国家税务总局西宁市城中区税务局

纳税人识别号	91630100MA759T5Q75	纳税人名称	青海泽标建设工程有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
463016250200056595	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-17	14,935.68
463016250200056595	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-02-01至2025-02-28	2025-02-17	7,467.84
金额合计	（大写）贰万贰仟肆佰零叁元伍角贰分				￥22,403.52

西宁市城中区税务局 税务机关（盖章） 征税专用章

填 票 人
单位社保费管理客户端

备注
正常申报一般申报正税自行申报青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室主管税务所（科、分局）：国家税务总局西宁市城中区税务局南川税务分局

第 1 次打印　　妥善保存

2025 年 3 月份

中华人民共和国
税收完税证明

No. 463015250300028626

填发日期： 2025 年 3 月 10 日　　税务机关： 国家税务总局西宁市城中区税务局

纳税人识别号	91630100MA759T5Q75	纳税人名称	青海泽标建设工程有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
463016250300024743	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-10	14,935.68
463016250300024743	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-03-01至2025-03-31	2025-03-10	7,467.84
金额合计	（大写）贰万贰仟肆佰零叁元伍角贰分				￥22,403.52

税务机关（盖章） 征税专用章

填 票 人
单位社保费管理客户端

备注
正常申报一般申报正税自行申报青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室主管税务所（科、分局）：国家税务总局西宁市城中区税务局南川税务分局

第 1 次打印　　妥善保存

2025 年 4 月份

中华人民共和国
税收完税证明

No. 463015250400044495

填发日期： 2025 年 4 月 10 日　　税务机关： 国家税务总局西宁市城中区税务局

纳税人识别号	91630100MA759T5Q75	纳税人名称	青海泽标建设工程有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
463016250400014821	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-10	14,972.48
463016250400014821	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-04-01至2025-04-30	2025-04-10	7,486.24
金额合计	（大写）贰万贰仟肆佰伍拾捌元柒角贰分				￥22,458.72

税务机关（盖章） 征税专用章

填 票 人
单位社保费管理客户端

备注
正常申报一般申报正税自行申报青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室主管税务所（科、分局）：国家税务总局西宁市城中区税务局南川税务分局

第 1 次打印　　妥善保存

2025 年 5 月份

中华人民共和国
税收完税证明

No. 463015250500012005

填发日期：2025 年 5 月 9 日　　税务机关：国家税务总局西宁市城中区税务局

纳税人识别号	91630100MA759T5Q75	纳税人名称	青海泽标建设工程有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
463016250500027864	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-09	14,972.48
463016250500027864	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-05-01至2025-05-31	2025-05-09	7,486.24
金额合计	（大写）贰万贰仟肆佰伍拾捌元柒角贰分				￥22,458.72

税务机关（盖章）
征税专用章

填 票 人
单位社保费管理客户端

备注
正常申报，逾期申报正税自行申报青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室(管理分所（科、分局）：国家税务总局西宁市城中区税务局南川税务分局

第 1 次打印　　妥善保存

附件 8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票（或租赁合同）或相关人员的证书或劳动（务）合同等证明材料。

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

我公司收到贵方招标采购文件，在完全理解该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我公司决定参加该项目。

我公司参加的投标活动，现承诺：

1、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

2、按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人。我公司在参加本次政府采购活动中，如获中标，保证具有履行本次采购所具有专业技术能力。

4、我公司拟投入施工及管理人员完全满足施工需求。

5、我公司拟投入本项目的机械设备配置合理、中小型机械齐全，完全满足工程需求，生产资源配备齐全。

6、保证施工进度的落实和完成。

特此承诺！

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李积英（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

机械设备：



湖北增值税专用发票

4200221130
机动车

№ 05281218 4200221130 05281218

开票日期：2023年09月25日

购买方	名称：青海泽标建设工程有限公司 纳税人识别号：91630100MA759T5Q75 地址、电话：青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室 0971-6249989 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司西宁上孙庄支行 630501373607000000179	密码区	27602**6714*2>8/49><131*639 4*7-->2>567211873*309653836 0110<9095+//82412>*-*-><535 /6>11<5--648773684>1-846024

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*机动车*东风汽车	LGHXHDAR1P6112064	辆	1	157522.12389	157522.12	13%	20477.88
合计					¥157522.12		¥20477.88
价税合计（大写）	⊗壹拾柒万捌仟圆整				（小写）¥178000.00		

销售方	名称：十堰豪国汽车贸易有限公司 纳税人识别号：91420300698005435U 地址、电话：十堰经济开发区台湾路81号 0719-8780680 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司十堰白浪经济开发区支行 42001613805300081170	备注	

收款人：郝清国　复核：杜敏　开票人：郝清国　销售方（章）：十堰豪国汽车贸易有限公司 91420300698005435U 发票专用章

税总货劳函〔2021〕302号中钞华森实业有限公司

第三联：发票联 购买方记账凭证



青海增值税专用发票

6300201160
机器编号：499932492653

№ 00157482 6300201160 00157482

开票日期：2021年05月25日

购买方	名称：青海泽标建设工程有限公司 纳税人识别号：91630100MA759T5Q75 地址、电话：青海省西宁市南川东路85号楼2单元261室13997165993 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司西宁上孙庄支行630501373607000017 9	密码区	03822361<3874<36652-307>-*8< 9/24018<-2>9<3+>2+28>/32850- +**+--4446+*99423/-+>03+0/<<8 +555>-/0><0190+-03*>=-7774

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*计算机配套产品*电脑		套	3	3316.83168316	¥9950.50	1%	¥99.50
合计					¥9950.50		¥99.50
价税合计（大写）	⊗壹万零伍拾圆整				（小写）¥10050.00		

销售方	名称：西宁市城西区欣晟景电脑维修部 纳税人识别号：92630104MA756EJ30C 地址、电话：西宁市胜利路39号电子市场西厅负6号09718116182 开户行及账号：青海银行城北支行0601201000186149	备注	

收款人：张艳　复核：李锦捷　开票人：李海峰　销售方：西宁市城西区欣晟景电脑维修部 92630104MA756EJ30C 发票专用章

税总函〔2019〕399号西安印钞有限公司

第二联：发票联 购买方记账凭证



3700223130
机动车

山东增值税专用发票

№ 29116911

3700223130
29116911

抵扣联

开票日期：2023年05月24日

购买方	名称：青海泽标建设工程有限公司 纳税人识别号：91630100MA759T5Q75 地址、电话：青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室0971-6249989 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司西宁上朵庄支行630501373807000000179	密码区	2//1/<39<+6082/865/>5379>*< 149176*+8*62**62843181/*919 6316+079/-151-4/+69/>7/7154 8<0616-17>+/+/26591400471**

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*机动车*吸粪车	LVAV2JVB0NE480011	辆	1	47787.610619	47787.61	13%	6212.39
合计					¥47787.61		¥6212.39

价税合计（大写）⊗ 伍万肆仟圆整　（小写）¥54000.00

销售方	名称：山东祥农专用车辆有限公司 纳税人识别号：91370829599265370 2 地址、电话：济宁市嘉祥县黄垓镇张垓村东200米 0537-6781001 开户行及账号：中国农业银行嘉祥支行15485301040012333	备注	工程名称：贵德县 2021年农村[illegible]项目（[illegible]工 工程(段三) 工程地点：贵德县拉西瓦镇

收款人：王汉进　复核：丁明锐　开票人：田高青　销售方：（章）

山东祥农专用车辆有限公司 91370829599265370 2 发票专用章

青海泽标建设工程有限公司 6301012258975

税总货劳函〔2022〕222号 西安西正印制有限公司

第二联：抵扣联 购买方扣税凭证

青海泽标建设工程有限公司

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24132000000055551531
开票日期：2024年05月10日

购买方信息	名称：青海泽标建设工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号:91630100MA759T5Q75	销售方信息	名称：邢台晨展机械配件有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号:91130505MA7HTMD57Q

下载次数：1

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*其他机械设备*治沙车		台	1	16814.1592920354	16814.16	13%	2185.84
合计					¥16814.16		¥2185.84
价税合计（大写）	⊗壹万玖仟圆整				（小写）¥19000.00		

备注：
购方开户银行:中国建设银行股份有限公司西宁上尕庄支行； 银行账号:63050137360700000179;
销方开户银行:中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行； 银行账号:50222001040043333;

开票人：赵克欣

青海泽标建设工程有限公司 6301012258975

青海增值税电子普通发票

机器编号：661923522016

发票代码:063002200111
发票号码:03265923
开票日期：2024年01月03日
校验码:45810 58136 39002 35054

购买方	名称：青海泽标建设工程有限公司 纳税人识别号：91630100MA759T5Q75 地址、电话：青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室 13997165993 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司西宁上尕庄支行 63050137360700000179	密码区	283<010808/2*-0841<2/2689- 2>10<5289/9++/447<39-58<+7 518</8+25845>3/>/<9<338928< 3*937/30<*4>-*>-4832>+4>289

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
(详见销货清单)					40420.78	1%	404.22
合计					¥40420.78		¥404.22
价税合计(大写)	⊗肆万零捌佰贰拾伍圆整				(小写)¥40825.00		

销售方	名称：青海特展商贸有限公司 纳税人识别号：91630104MA759KCG5M 地址、电话：城西区文景路36号0971-8136475 开户行及账号：青海西宁农村商业银行股份有限公司湟光支行82010000000571276	备注	

收款人：王燕妮　　复核：王燕妮　　开票人：石海梅　　销售方：(章)

青海特展商贸有限公司 91630104MA759KCG5M 发票专用章

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称:青海泽标建设工程有限公司

销售方名称:青海特展商贸有限公司

所属增值税电子普通发票代码: 063002200111　　号码:03265923　　共 2 页 第 1 页

序号	货物(劳务)名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*家具*铁皮文件柜		组	2	445.54455446	891.09	1%	8.91
2	*文具*木质文件栏		套	4	84.15841584	336.63	1%	3.37
3	*木制品*木质笔架		个	4	64.35643564	257.43	1%	2.57
4	*绘图测量仪器*计算器		台	4	54.45544554	217.82	1%	2.18
5	*纸制品*A4打印纸		件	10	183.16831683	1831.68	1%	18.32
6	*文具*塑料档案盒5CM	5	个	50	9.9009901	495.05	1%	4.95
7	*计算机外部设备*移动硬盘	1T	个	3	544.55445545	1633.66	1%	16.34
8	*计算机外部设备*U盘	126G	个	3	118.81188119	356.44	1%	3.56
9	*纺织产品*线手套		双	100	3.46534653	346.53	1%	3.47
10	*橡胶制品*半胶手套		双	100	4.75247525	475.25	1%	4.75
11	*美容护肤品*洗手液		瓶	40	20.79207921	415.84	1%	4.16
12	*洗涤剂*洗洁精		桶	20	11.88118812	237.62	1%	2.38
13	*化学药品原药*84消毒液		盒	50	4.95049505	247.52	1%	2.48
14	*家用厨房电器具*烧水壶		个	10	108.91089109	1089.11	1%	10.89
15	*配电控制设备*公牛插板（5米）			10	67.32673267	673.27	1%	6.73
16	*配电控制设备*公牛插板（10米）			10	116.83168317	1168.32	1%	11.68
17	*文化办公用设备*碎纸机		台	1	782.17821782	782.18	1%	7.82
18	*纸制品*纸杯		个	2	376.23762376	752.48	1%	7.52
19	*纸制品*抽纸		提	20	19.8019802	396.04	1%	3.96
20	*纸制品*卷纸		提	20	24.75247525	495.05	1%	4.95
21	*印刷品*黑皮记事本		本	50	14.85148515	742.57	1%	7.43
22	*印刷品*会议记录本		本	10	17.82178218	178.22	1%	1.78
23	*印刷品*黑皮记事本		本	50	14.85148515	742.57	1%	7.43
24	*文具*中性笔		盒	50	35.64356436	1782.18	1%	17.82
25	*纺织产品*毛巾		条	80	11.88118812	950.50	1%	9.50
26	*纸制品*A3打印纸		件	10	183.16831683	1831.68	1%	18.32
27	*鞋*雨鞋		双	60	44.55445545	2673.27	1%	26.73
28	*洗涤剂*洗衣粉		袋	40	5.94059406	237.62	1%	2.38
29	*洗涤剂*肥皂		块	100	3.96039604	396.04	1%	3.96
30	*复印胶版印制设备*硒鼓		个	4	356.43564356	1425.74	1%	14.26
31	*纺织产品*口罩		包	100	9.9009901	990.10	1%	9.90
32	*金属制品*意见箱		个	4	64.35643564	257.43	1%	2.57
33	*文具*加宽文件袋		个	50	14.85148515	742.57	1%	7.43
34	*塑料制品*垃圾桶		各	6	24.75247525	148.51	1%	1.49
35	*文具*文件盒		个	100	11.88118812	1188.12	1%	11.88
小计						¥ 27386.13		¥ 273.87
总计						¥ 40420.78		¥ 404.22
备注								

销售方(章):　　填开日期: 2024 年 01月03日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称:青海泽标建设工程有限公司

销售方名称:青海特展商贸有限公司

所属增值税电子普通发票代码:063002200111　　号码:03265923　　共 2 页 第 2 页

序号	货物(劳务)名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
36	*纸制品*A4复印纸		件	15	183.16831683	2747.52	1%	27.48
37	*塑料制品*安全帽		顶	60	74.25742574	4455.45	1%	44.55
38	*纺织产品*手套		双	100	3.46534653	346.53	1%	3.47
39	*服装*工作服		套	60	74.25742574	4455.45	1%	44.55
40	*计算机配套产品*键盘		个	10	68.31683168	683.17	1%	6.83
41	*塑料制品*垃圾袋		卷	100	3.46534653	346.53	1%	3.47
小计						¥ 13034.65		¥ 130.35
总计						¥ 40420.78		¥ 404.22
备注								

销售方(章):

填开日期:2024 年 01月03日

劳保用品采购合同

甲方（采购方）：青海泽标建设工程有限公司

乙方（供货方）：青海特展商贸有限公司

根据《中华人民共和国合同法》，经买卖双方协商一致同意签订本合同：

一、 采购物资（详见销货清单及出库单）

二、 交货方式：乙方免费送至甲方仓库

三、 验收标准，以及质保

1、 质量标准：所供物资与双方确认的样品相同，且符合国家标准和行业标准。

2、 所有物资的质保周期为三个月（包退、包换、保修），三个月之后乙方负责维修。

四、 结算方式：货到甲方仓库经验收合格后，且无质量问题予以一次性付清。

五、 诉讼

合同履行期间，双方产生分歧应通过友好协商解决，当协商不能达成共识，双方可向甲方所在地人民法院提出诉讼请求。

六、 其它

本合同一式两份，甲乙双方给一份。

甲方：青海泽标建设工程有限公司　　乙方：青海特展商贸有限公司

负责人签字：　　负责人签字：

签订日期：　　签订日期：

出 库 单

付给：_____ 年 月 日

货 号	品 名	规 格	单位	数 量	单 价	金 额
1	铁皮文件柜		组	2	450	900
2	木质文件栏		套	4	85	340
3	木质笔架		个	4	65	260
4	计算器		台	4	55	220
5	A4打印纸		件	10	185	1850
6	塑料档案盒5CM	5	个	50	10	500
7	移动硬盘	1T	个	3	550	1650
8	U盘	126G	个	3	120	360
9	线手套		双	100	3.5	350
10	半胶手套		双	100	4.8	480
11	洗手液		瓶	20	21	420
12	洗洁精		桶	20	12	240
13	84消毒液		瓶	50	5	250
14	烧水壶		个	10	110	1100
15	公牛插班（5米）		个	10	68	680
16	公牛插班（10米）		个	10	118	1180
17	碎纸机		台	1	790	790
18	纸杯		件	2	380	760
19	抽纸		提	20	20	400
20	卷纸		提	20	25	500
21	黑皮记事本		本	50	15	750
22	会议记事本		本	10	18	180
23	黑皮记事本		本	50	15	750
24	中性笔		盒	50	36	1800
25	毛巾		条	80	12	960
26	A3打印纸		件	10	185	1850
27	雨鞋		双	60	45	2700
28	洗衣粉		袋	40	6	240
29	肥皂		块	100	4	400
30	硒鼓		个	4	360	1440
31	口罩		包	100	10	1000
32	意见箱		个	4	65	260
33	加宽文件袋		个	50	15	750
34	垃圾桶		各	6	25	150
35	文件盒		个	100	12	1200
36	A4复印纸		件	15	185	2775
37	安全帽		顶	60	75	4500
38	手套		双	100	3.5	350
负责人		仓库负责人		出库经手		记账		合计	35285

出 库 单

付给：_____ 年 月 日

货 号	品 名	规 格	单位	数 量	单 价	金 额
39	工作服		套	60	75	4500
40	键盘		个	10	69	690
41	垃圾袋		卷	100	3.5	350

具备履行合同所必需的设备机械

序号	设备名称	数量	生产地	制造年份	生产能力	备注
1	破土器（波纹盘）	2 个	中国	2023 年	满足施工要求	良好
2	开沟器（双圆盘）	1 台	中国	2023 年	满足施工要求	良好
3	施肥机	2 台	中国	2022 年	满足施工要求	良好
4	打药机	3 台	中国	2023 年	满足施工要求	良好
5	大型无人机	2 台	中国	2023 年	满足施工要求	良好
6	轮式拖拉机	2 辆	中国	2023 年	满足施工要求	良好
7	3 吨柴油机械叉车	3 辆	中国	2023 年	满足施工要求	良好
8	电脑	4 台	中国	2023 年	满足施工要求	良好
9	装载机	1 辆	中国	2023 年	满足施工要求	良好
10	货车	2 辆	中国	2023 年	满足施工要求	良好
11	轻型货车	1 辆	中国	2023 年	满足施工要求	良好
12	分层免耕播种机	2 台	中国	2024 年	满足施工要求	良好
13	圆盘耙	2 台	中国	2022 年	满足施工要求	良好
14	小型运输车	1 辆	中国	2023 年	满足施工要求	良好
15	覆土器（镇压轮）	4	中国	2024 年	满足施工要求	良好
16	高压水枪	5	中国	2023 年	满足施工要求	良好
17	皮卡车	3	中国	2024 年	满足施工要求	良好
18	铁锹	50	中国	2024 年	满足施工要求	良好
19	洒水车	4	中国	2023 年	满足施工要求	良好
20	发电机	4	中国	2023 年	满足施工要求	良好
21	装载机	5	中国	2023 年	满足施工要求	良好


雷沃M 904
FOTOL


注意:作业时严禁后退




泰 山 — 604E


JOHN DEERE
904
JOHN DEERE
904




IVECO



（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目负责人	陈慧	工程师	职称证	高级	10058694	园林绿化	退休返聘	
技术负责人	肖大为	工程师	职称证	中级	B081510900000000192	园林绿化	退休返聘	
技术员	陈玉华	工程师	职称证	中级	20040524028	环保工程	退休返聘	
技术员	李积英	/	岗位证	/	QAEC-JS-2023-048	生态工程技术	已缴纳	
安全员	李国祥	/	岗位证	C类	青建安C2(2023)0011959	农牧工程	已缴纳	
质量管理员	王静	/	岗位证	无	06325109000060000021	生态工程技术	已缴纳	
技术员、运输管理员、资料员	王晓梅	/	岗位证、驾驶证	无	QAEC-JS-2023-047、630200003417、063171149631700 0940	生态工程技术	已缴纳	
技术员、货物管理员、材料员	郭建芬	/	岗位证	无	QAEC-JS-2023-049 、 / 、 063231110000200 0022	生态工程技术	已缴纳	

（二）主要人员简历表--项目负责人

姓名	**陈慧**	年龄	**58 岁**	学历	**专科**
职称	**工程师**	职务	**项目负责人**	拟在本合同任职	**项目负责人**
毕业学校		**2018 年毕业于 内蒙古农业大学 学校 木材机械加工与综合利用专业**			
主要工作经历					
时 间		参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话
/		/		/	/

注：后附相关资料


姓名 陈慧
性别 女 民族 汉
出生 1967年 6月 15日
住址 内蒙古包头市青山区迎宾小区39栋8号
公民身份号码 150102196706152064


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 包头市公安局青山分局
有效期限 2006.12.08-2026.12.08

普通高等学校

毕业证明书



学生 陈慧 性别 女，一九[illegible]年[illegible]月十五 日生，于一九八六年九 月至一九九〇年 七 月在本校 木材机械加工与综合利用 专业四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号 900041 ），因证书遗失，兹具毕业证明书为凭。

校 名：内蒙古农业大学 校 长：

补证号：101291201805004 二〇一八年 四 月八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国

退休证

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅



(相片处加盖钢印，无钢印可加盖单位印章)

字 号

社会保障号码 150102196706152064

发证日期 2022年 6月 1日

姓 名 陈慧 性别 女

出生年月 1967.06 民族 汉

籍贯 内蒙包头

参加工作时间 1990.10

退休时间 2022.06

退休时身份类别 事业

退休时职务(岗位) 副高

内蒙古自治区
人事厅制

Made by the Personnel Department
of Inner Mongolia Autonomous Region

10058694



持证人签名 Signature of Bearer

姓名 Full Name 陈慧

性别 Sex 女

出生年月 Date of Birth 1967/06

专业名称 Speciality 园林绿化

资格级别 Qualification Level 副高

资格名称 Qualification 高级工程师

授予时间 Conferment Date 2004年11月


注册时间至2020年12月止
发证单位 内蒙古自治区人事厅
Issued by
041103368
证书编号
Certificate No.
主管部门
Conferred by
注册情况
注册有效期：
工作单位：
注册部门印章：
注册日期： 年 月 日
注册有效期：
工作单位：
注册部门印章：
注册日期： 年 月 日
注：注册管理情况由注册管理机构填写



退休返聘合同

甲方(用人单位)：青海泽标建设工程有限公司

乙方(劳动者)：陈慧

鉴于：乙方是退休人员，已到法定退休年龄，已无法购买社会保险。

甲乙双方根据有关法律、法规的规定，为明确双方退休返聘关系及相关权利义务，本着平等自愿、协商一致的原则，共同签订本返聘协议。

第一条 本返聘期限为 5 年。自 2023 年 8 月 10 日起至 2028 年 9 月 10 日止。甲方在返聘期满后同意继续聘用乙方的，可在期满前 30 日内与乙方协商续签返聘协议事宜。

第二条 双方协商一致，乙方同意从事 项目负责人 (岗位或工种)工作。甲方可根据乙方的工作能力及表现、身体健康状况等因素调整乙方工作岗位，乙方应服从甲方的安排。

第三条 乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。返聘期间，乙方应严格遵守甲方制定和修改的各项规章制度和工作纪律。

第四条 甲方安排乙方执行标准工时工作制。乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。

第五条 乙方的工作报酬为每月人民币 3000 元。

第六条 乙方不享受甲方在职员工的福利待遇，但享有国家规定的法定节假日休假的权利。

第七条 甲方向乙方提供符合国家规定的工作条件，提供保障乙方安全的、健康的工作环境。

第八条 甲方有义务对乙方进行必务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第九条 乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令险作业。

第十条 协议的终止和解除

1、返聘期满，本协议即行终止。

2、经甲乙双方协商一致，即可解除本协议。

3、乙方有下列情形之一的，甲方可以立即解除本协议。

(1)不符合甲方的返聘条件和要求的。

(2)不能胜任甲方安排的工作的，或经考核不合格的。

(3)患病或负伤，不能从事原工作或停工治疗期限超过 10 日的。

(4)严重违反甲方规章制度的。

(5)严重失职、营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的。

(6)乙方被查实在应聘时向甲方提供虚假的个人资料、相关证明的。

(7)向甲方隐瞒重大疾病史及其他重要信息的。

4、甲方有下列情形之一的，乙方可以立即解除本协议。

(1)未及时足额支付工作报酬的。

(2)甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫乙方工作的。

第十一条 本协议被终止或解除，甲方均无需向乙方支付任何经济补偿。

第十二条 工伤、医疗

1、返聘期间乙方发生工伤的，甲乙双方协商解决。

2、返聘期间乙方患病或非因工负伤，医疗费用由乙方自行负担，甲方不支付乙方治疗期间的工作报酬。

第十三条 乙方违反甲方规章制度，对甲方造成损失的，应承担相应责任。

第十四条 双方因履行本合同发生争议，甲乙双方应尽量协商解决。

第十五条 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

第十六条 甲乙双方在本合同签订之前无任何的债权债务关系

甲方：(盖章)　　乙方：(签名)

法定代表人(签名)：

身份证号：150102196706152064

签订日期：2021年 8月 9日

（二）主要人员简历表--技术负责人

姓名	肖大为	年龄	56岁	学历	专科
职称	工程师	职务	技术负责人	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校	1993年毕业于中南林学院学校园林专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2023年	2023年中央林业草原发展资（第一批、第四批）都兰县沙化土地封禁保护区补助项目（包二）			项目负责人	都兰县林业局

注：后附相关资料

身份证


姓名 肖大为
性别 女 民族 汉
出生 1968 年 9 月 16 日
住址 湖南省益阳市赫山区康富北路6号
公民身份号码 432301196809162082


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 益阳市公安局赫山分局
有效期限 2008.06.11-2028.06.11

毕业证


毕业证书
学生肖大为性别女系湖南
省益阳县(市)人，一九六八年九月生，
于一九九〇年九月至一九九三年六月
在我院经济林系园林
专业叁年制专科修业期满，
学完教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。
中南林学院院长
一九九三年六月二十日

职称证



姓　　名：肖大为

性　　别：女

身份证号：432301196809162082

任职资格：工程师


专业类别：园林绿化

批准日期：2015年12月31日

工作单位：益阳市林业科学研究所

持证人签名：

系统编码：B08151090000000192

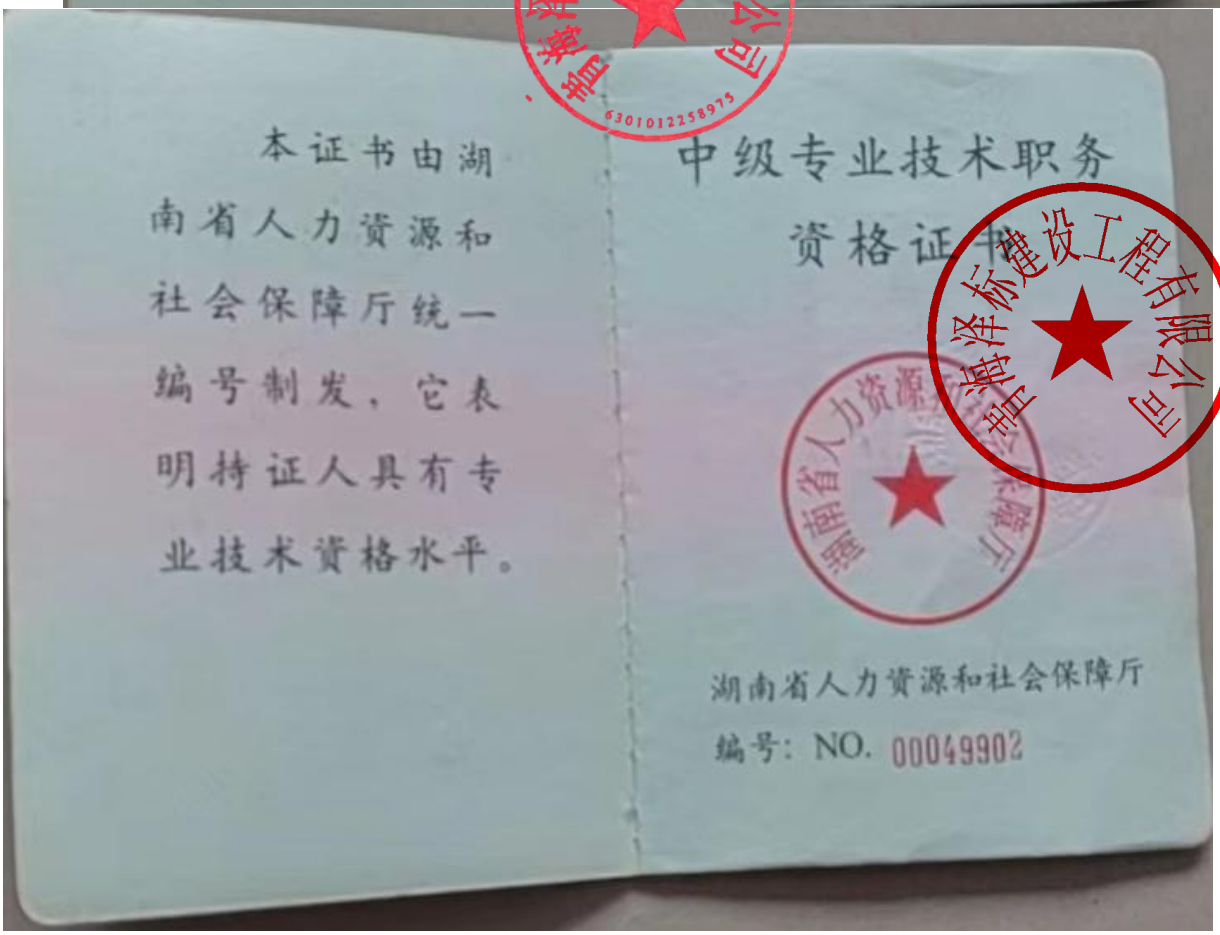

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

中级专业技术职务资格证书

湖南省人力资源和社会保障厅

编号：NO. 0004990?

退休证



姓　名	肖大为	性别	女
出生年月	1968年11月	民族	汉族
籍　贯	湖南益阳		
参加工作时间	1989年8月		
退休时间	2018年11月		
退休时别	工勤人员		
退休前职务（职称）	技术工一级（高级技师）		

（相片处加盖钢印，无钢印可加盖单位公章）

益人社退字 2018306 号

社会保障号码

发证日期 2018 年 11 月 27 日

退休返聘合同

甲方(用人单位)：青海泽标建设工程有限公司

乙方(劳动者)：[redacted]肖大为

鉴于：乙方是退休人员，已到法定退休年龄，已无法购买社会保险。

甲乙双方根据有关法律、法规的规定，为明确双方退休返聘关系及相关权利义务，本着平等自愿、协商一致的原则，共同签订本返聘协议。

第一条 本返聘期限为 5 年。自 2022 年 1 月 4 日起至 2027 年 1 月 3 日止。甲方在返聘期满后同意继续聘用乙方的，可在期满前 30 日内与乙方协商续签返聘协议事宜。

第二条 双方协商一致，乙方同意从事 项目负责人 (岗位或工种)工作。甲方可根据乙方的工作能力及表现、身体健康状况等因素调整乙方工作岗位，乙方应服从甲方的安排。

第三条 乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。返聘期间，乙方应严格遵守甲方制定和修改的各项规章制度和工作纪律。

第四条 甲方安排乙方执行标准工时工作制。乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。

第五条 乙方的工作报酬为每月人民币 3060 元。

第六条 乙方不享受甲方在职员工的福利待遇，但享有国家规定的法定节假日休假的权利。

第七条 甲方向乙方提供符合国家规定的工作条件，提供保障乙方安全的、健康的工作环境。

第八条 甲方有义务对乙方进行业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第九条 乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令险作业。

第十条 协议的终止和解除

1、返聘期满，本协议即行终止。

2、经甲乙双方协商一致，即可解除本协议。

3、乙方有下列情形之一的，甲方可以立即解除本协议。

(1)不符合甲方的返聘条件和要求的。

(2)不能胜任甲方安排的工作的，或经考核不合格的。

(3)患病或负伤，不能从事原工作或停工治疗期限超过 10 日的。

(4)严重违反甲方规章制度的。

(5)严重失职、营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的。

(6)乙方被查实在应聘时向甲方提供虚假的个人资料、相关证明的。

(7)向甲方隐瞒重大疾病史及其他重要信息的。

4、甲方有下列情形之一的，乙方可以立即解除本协议。

(1)未及时足额支付工作报酬的。

(2)甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫乙方工作的。

第十一条 本协议被终止或解除，甲方均无需向乙方支付任何经济补偿。

第十二条 工伤、医疗

1、返聘期间乙方发生工伤的，甲乙双方协商解决。

2、返聘期间乙方患病或非因工负伤，医疗费用由乙方自行负担，甲方不支付乙方治疗期间的工作报酬。

第十三条 乙方违反甲方规章制度，对甲方造成损失的，应承担相应责任。

第十四条 双方因履行本合同发生争议，甲乙双方应尽量协商解决。

第十五条 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

第十六条甲乙双方在本合同签订之前无任何的债权债务关系

甲方：(盖章)　　乙方：(签名)

法定代表人(签名)：　　身份证号：432301196809162082

签订日期：2022年 1月 4日

（三）主要人员简历表--技术员

姓名	**陈玉华**	年龄	**55 岁**	学历	**本科**
职称	**工程师**	职务	**技术员**	拟在本合同任职	**技术员**
毕业学校		**2003 年毕业于 内蒙古环保大学 学校 环境工程专业**			
主要工作经历					
时间		参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话
/		/		/	/

注：后附相关资料


姓 名 陈玉华
性 别 女 民 族 汉
出 生 1969年 5 月 6 日
住 址 内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇新华街全宁小区2号楼3单元5楼西
公民身份号码 150426196905060008X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 翁牛特旗公安局
有效期限 2010.04.09-2030.04.09


内蒙古自治区人力资源和社会保障厅制
主管部门
证书编号 20132732
身份证号


姓名 陈玉华
性别 女
出生年月 1969/05
管理号：补 20040524028
专业名称
资格级别 中级
资格名称 工程师
授予时间 2004-12
发证单位 赤峰市人力资源和社会保障局



成人高等教育

毕业证书

学生陈玉华　性别 女，一九六九年 五 月 六 日生，于二〇〇〇年 七 月至二〇〇三年 六 月在本校 环境工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

（院）：

批准文号：教育部(83)教[illegible]02号

证书编号：10135520030[illegible]4938

二〇〇三年 六 月十五日

№ 00991881

中华人民共和国教育部监制




退休时工作单位
批准退休单位
养老金发放机构
退休后居住地址
赤峰市人力资源和社会保障局
退休证明专用章
海泽标建设工程有限公司
社会保障号码 2020-037
发证日期 2020年 1月22日
姓名
出生年月 1969.01
参加工作时间 1985.01
退休时间 2020.01
退休时职务（岗位）
海泽标建设工程有限公司

退休返聘合同

甲方(用人单位)：青海泽标建设工程有限公司

乙方(劳动者)：陈玉华

鉴于：乙方是退休人员，已到法定退休年龄，已无法购买社会保险。

甲乙双方根据有关法律、法规的规定，为明确双方退休返聘关系及相关权利义务，本着平等自愿、协商一致的原则，共同签订本返聘协议。

第一条 本返聘期限为5年。自2024年7月1日起至2029年6月30日止。甲方在返聘期满后同意继续聘用乙方的，可在期满前30日内与乙方协商续签返聘协议事宜。

第二条 双方协商一致，乙方同意从事项目负责人(岗位或工种)工作。甲方可根据乙方的工作能力及表现、身体健康状况等因素调整乙方工作岗位，乙方应服从甲方的安排。

第三条 乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。返聘期间，乙方应严格遵守甲方制定和修改的各项规章制度和工作纪律。

第四条 甲方安排乙方执行标准工时工作制。乙方每日工作时间不超过8小时，每周不超过40小时。

第五条 乙方的工作报酬为每月人民币3000元。

第六条 乙方不享受甲方在职员工的福利待遇，但享有国家规定的法定节假日休假的权利。

第七条 甲方向乙方提供符合国家规定的工作条件，提供保障乙方安全的、健康的工作环境。

第八条 甲方有义务对乙方进行业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第九条 乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令险作业。

第十条 协议的终止和解除

1、返聘期满，本协议即行终止。

2、经甲乙双方协商一致，即可解除本协议。

3、乙方有下列情形之一的，甲方可以立即解除本协议。

(1)不符合甲方的返聘条件和要求的。

(2)不能胜任甲方安排的工作的，或经考核不合格的。

(3)患病或负伤，不能从事原工作或停工治疗期限超过10日的。

(4)严重违反甲方规章制度的。

(5)严重失职、营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的。

(6)乙方被查实在应聘时向甲方提供虚假的个人资料、相关证明的。

(7)向甲方隐瞒重大疾病史及其他重要信息的。

4、甲方有下列情形之一的，乙方可以立即解除本协议。

(1)未及时足额支付工作报酬的。

(2)甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫乙方工作的。

第十一条 本协议被终止或解除，甲方均无需向乙方支付任何经济补偿。

第十二条 工伤、医疗

1、返聘期间乙方发生工伤的，甲乙双方协商解决。

2、返聘期间乙方患病或非因工负伤，医疗费用由乙方自行负担，甲方不支付乙方治疗期间的工作报酬。

第十三条 乙方违反甲方规章制度，对甲方造成损失的，应承担相应责任。

第十四条 双方因履行本合同发生争议，甲乙双方应尽量协商解决。

第十五条 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

第十六条甲乙双方在本合同签订之前无任何的债权债务关系

甲方：(盖章)　　乙方：(签名)陈玉华

法定代表人(签名)：　　身份证号：150426196905060088X

签订日期：2017 年 7 月 1 日

（二）主要人员简历表--技术员

姓名	李积英	年龄	31 岁	学历	专科
职称	/	职务	技术员	拟在本合同任职	技术员
毕业学校		2015 年毕业于青海建筑职业技术学院（学校）建筑经济管理专业			
主要工作经历					
时间		参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话
2022 年 5 月		曲麻莱县麻多乡扎加村亚宿海草原退化综合治理建设项目四标段		技术负责人	玛沁县自然资源和林业草原局

注：后附相关资料

身份证


姓 名 李积英
性 别 女 民 族 汉
出 生 1993 年 11 月 28 日
住 址 青海省乌兰县柯柯镇西村一社162号
公民身份号码 632822199311280022


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 乌兰县公安局
有效期限 2024.04.09-2044.04.09


青海泽标建设工程有限公司

毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 李积英 性别女，一九九三 年十一 月二十八 日生，于二〇一二 年 九 月至二〇一五 年 七 月在本校 建筑经济管理 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：青海建筑职业技术学院 校（院）长：刘康宁

证书编号：129741201506000637 二〇一五 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　　名：李积英

性　　别：女

出生年月：1993.11.28

身份证号：632822199311280022

职　　称：

工作单位：青海泽标建设工程有限公司

李积英同志已完成青海省生态保护和建设工程技术人员培训并考核合格，特颁发此证。

专业：生态工程技术

证书编号：QAEC-JS-2023-048

发证单位：青海省生态保护和建设协会

发证时间：2023 年 02 月 27 日

有效期至：2026 年 02 月 27 日

继续教育登记

培训单位	青海省林业草原人才交流培训有限公司（盖章）		
学习形式	专题讲授、案例分析、交流研讨、现场教学、专家点评、综合测试		
起止日期	2023年2月20日-2月23日	总学时	28
学习内容或科目		学时	
“二十大”精神内容解读		3.5	
全过程咨询法律风险识别与业务合规管理		3.5	
青海省草地生态建设工程监理与施工		3.5	
如何设计生态草原规划项目		3.5	
《青海省林业和草原生态建设项目管理办法》等八个管理办法解读		3.5	
现场教学：青海省自然资源博物馆		3.5	
现场教学：青海林草工程档案管理示范基地（青海生态工程档案管理概要及案例分析）		3.5	
《项目计划编制、进度动态管理及项目检查和验收》及《项目招投标管理办法及细则》解读		3.5	
考核(试)结果	合格		
主管部门（盖章）2023年2月27日		培训单位（盖章）2023年2月27日	

继续教育登记

培训单位	（盖章）		
学习形式			
起止日期		总学时	
学习内容或科目		学时	考核(试)结果
主管部门（盖章）年 月 日		培训单位（盖章）年 月 日	

施工员岗位证

证书编码：06323104000030000005

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　李积英



身份证号：　632822199311280022

岗位名称：　市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：国网青海省电力公司培训中心

发证时间：2023年 04月10 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

扫码验证

职称证

青海省中级专业技术资格证　书



姓　　名：李积英

性　　别：女

出 生 年 月：1993年11月28日

身 份 证 号：632822199311280022

工 作 单 位：青海泽标建设工程有限公司

职称系列(专业)：建设工程

资 格 名 称：工程师

职 称 层 级：中级

专　　业：建筑工程

评 价 方 式：正常评审

评委会名称：西宁市建设工程中级专业技术职务评审委员会

有 效 范 围：全省有效

取得资格时间：2025年02月21日

批 复 文 号：宁人社局发〔2025〕76号

管　理　号：96320241Z09913743

唯一在线验证网址：
https://rst.qinghai.gov.cn/rsrc/ZCGL/CertiVali
打印时间：2025年03月03日

社保证明

青海省企业职工基本养老保险参保缴费证明

基本信息					
姓名	李积英	性别	女	个人编号	0100106400549
证件类型及号码	居民身份证(户口簿)	632822199311280022		单位编号	010311468367
参加工作时间	2017-06-01	现参保缴费单位	青海泽标建设工程有限公司		
建账时间	2017-06-01 00:00:00.0	参保起始时间	2017-06-01	参保状态	
当前个人账户累计储存额	33201.18		其中：个人缴费储存额		33201.18
欠费月数	0年0月	欠费时段			

缴费明细			
缴费区间	缴费月数	缴费单位	缴费类型
2017.06-2018.02	9	青海青渝建设工程有限公司	成建制单位
2019.05-2020.02	10	青海锦阳建设工程有限公司	成建制单位
2020.03-2025.04	61	青海[illegible]建设工程有限公司	成建制单位

社保机构名称：城中区社会保险服务局　　打印时间：2025-05-14

说明：若本人对缴费单位、缴费类型有异议，请前往参保所在地社保经办机构办理修正业务。

本证明仅认定实际缴费年限，盖章后可作为参保人员工龄认定依据。

编号：

劳 动 合 同 书

（全日制用工）

用 人 单 位：青海泽标建设工程有限公司

劳动者姓名：李积英

青海省人力资源和社会保障厅印制

使 用 说 明

一、本合同适用于全日制劳动者，即在本行政区域内的企业、个体经济组织、民办非企业单位、国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者，在订立、履行、变更劳动合同时使用。

二、填写劳动合同第四条中劳动者岗位时，属于劳务派遣工的，一律明确填写岗位属性，即临时性岗位、辅助性岗位或替代性岗位。同时对劳务派遣工应当签订三年以上固定期限劳动合同。

三、劳动合同试用期：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；劳动合同期限三年以上的，试用期不得超过六个月。

四、本合同一式三份。应由劳动者持有的一份不得由用人单位代为保管。用钢笔或签字笔填写，字迹清楚、文字简练、准确，不得涂改。

二〇二四年

根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，用人单位与劳动者双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同双方当事人基本情况

第一条 用人单位名称 青海泽标建设工程有限公司

法定代表人（主要负责人） 李积英

住　　所 青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼

联系电话 15110901357

第二条 劳动者姓名 李积英 性别 女 民族 汉

居民身份证号码 632822198[illegible]28022

或者其他有效证件名称 ／ 证件号码 ／

户口所在地 青海省乌兰县柯木[illegible]西村一社162号

现居住地址 青海省西宁市城中区

二、劳动合同期限

第三条 本合同期限经双方协商一致，采取下列第（一）种形式：

（一）固定期限：自2014年4月9日起至2019年4月8日止。其中，试用期自／年／月／日至／年／月／日。

（二）无固定期限：自／年／月／日起。其中，试用期自／年／月／日至／年／月／日。

（三）以完成一定工作任务为期限：自／年／月／日起至／时止。

三、工作内容和工作地点

第四条 用人单位根据工作需要，安排劳动者在施工员岗位工作，工作地点为西宁。经双方协商同意，可以变更工作岗位。

第五条 劳动者在该岗位的职责要求是：

一、负责公司外来人员的接待工作；

二、负责公司档案（人事档案除外）的建立、保管及查询、借阅等工作；

三、负责日常接听电话、收发传真及回复日常邮件工作；

四、负责公司各类会议的通知；

五、负责安排董事长日常事务工作，完成领导交办的其他临时性工作；

六、负责指定、修改、完善本岗位所属各项工作的工作流程。

第六条 劳动者按照用人单位安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守用人单位依法制定的规章制度。

四、工作时间和休息休假

第七条 用人单位安排劳动者执行下列第（一）种工时制度。

（一）执行标准工时制度的，劳动者每天工作时间不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时。

（二）执行综合计算工时工作制度的，分别以周、月、季、年等为周期综合计算工作时间，但其周期内总的实际工作时间不应超过法定标准工作时间。

（三）执行不定时工作制度的，用人单位在保障职工身体健康的基础上，应采取轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

实行综合计算工时或者不定时工时的，由用人单位报人力资源社会保障行政部门批准后执行。

第八条 用人单位依法保证劳动者的休息休假权利。

五、劳动报酬

第九条 用人单位结合本单位的生产经营特点和经济效益，依法确定本单位的工资分配制度、劳动者的工资水平，按照本单位的工资分配制度，结合劳动者的劳动技能、劳动强度等确定，实行同工同酬。

第十条 用人单位按下列第（一）种形式支付劳动者工资。

（一）用人单位每月以货币形式支付劳动者工资3000.00元或按用人单位依法制定的《岗位人员工资标准》执行。

（二）计时工资。劳动者的工资标准为/元/月（周、日），绩效工资（奖金）根据劳动者实际劳动贡献确定。

（三）计件工资。劳动者的劳动定额为/，计件单价为/。

第十一条 劳动者在试用期的工资为/元（不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%）。

第十二条 用人单位安排劳动者延长工作时间的按150%的标准支付加班工资；休息日安排劳动者工作又不能补休的按200%

标准支付加班工资；法定节假日安排工作的按300%标准支付加班工资。

六、社会保险及其他保险福利待遇

第十三条 用人单位和劳动者双方按国家和青海省有关规定参加社会保险。用人单位为劳动者办理有关社会保险手续，并承担相应社会保险义务。

第十四条 劳动者在合同期内，患病、患职业病或因工负伤的按国家有关规定执行。

第十五条 用人单位为劳动者提供以下补充保险和福利待遇：

七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十六条 用人单位根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定对劳动者进行必要的培训和配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

第十七条 用人单位根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度；劳动者应当严格遵守用人单位的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

第十八条 用人单位违章指挥、强令冒险作业，危及劳动者人身安全的，劳动者有权拒绝。劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对用人单位提出批评、检举和控告。

八、劳动合同的履行、变更

第十九条 用人单位和劳动者双方按照本合同的约定，依法、全面履行各自的义务。

第二十条 用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响本合同的履行。

第二十一条 用人单位发生合并或者分立等情况，本合同继续有效，由继承其权利和义务的单位继续履行。

第二十二条 经用人单位和劳动者双方协商一致，可以变更本合同约定的内容，并以书面形式确定。

九、劳动合同的解除、终止和经济补偿

第二十三条 用人单位和劳动者双方解除、终止劳动合同，应当依照《劳动合同法》第三十六条、三十七条、三十八条、三十九条、四十条、四十一条、四十二条、四十三条、四十四条的规定执行。

第二十四条 用人单位和劳动者双方解除、终止本合同，符合《劳动合同法》第四十六条情形的，用人单位依法向劳动者支付经济补偿。

第二十五条 用人单位应当在解除或者终止本合同时，为劳动者出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。

用人单位和劳动者应当按照双方约定，办理工作交接。应当支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。

十、当事人约定的其他内容

第二十六条 用人单位为劳动者提供了专项培训费用，对其进行专业技术培训，双方可以订立专项协议，约定服务期，作为本合同的附件。

第二十七条 劳动者负有保密义务的，双方可以订立专项协议，约定竞业限制条款，作为本合同的附件。

第二十八条 用人单位与劳动者双方约定本合同增加以下内容：

第二十九条 用人单位和劳动者双方因履行本合同发生争议，可以协商解决。协商不成的，可以依法申请仲裁、提起诉讼。

第三十条 本合同未尽事宜按国家和青海省有关规定执行。

用人单位：（公章）　　劳动者：（签字）

法定代表人（委托代理人）

（签字或盖章）

签订日期：2024年 4 月 9 日　　签订日期：2024年 4 月 9 日

（二）主要人员简历表--安全员

姓名	李国祥	年龄	25 岁	学历	专科
职称	/	职务	专职安全生产管理人员	拟在本合同任职	专职安全生产管理人员
毕业学校		2022 年毕业于西安理工大学学校电气自动化技术专业			
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2022 年 5 月	曲麻莱县麻多乡扎加村星宿海草原退化综合治理建设项目四标段			安全员	玛沁县自然资源和林业草原局

注：后附相关资料

安全员身份证


姓 名 李国祥
性 别 男 民 族 汉
出 生 1999 年 5 月 16 日
住 址 青海省德令哈市尕海镇尕海村一社22号
公民身份号码 632802199905162O1X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 德令哈市公安局
有效期限 2023.07.14-2033.07.14

安全员毕业证



成人高等教育

毕业证书

学生 李国祥 性别 男，一九九九年 五 月 十六 日生，于 二〇二〇 年 三 月至 二〇二二 年 七 月在本校 电气自动化技术 专业， 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安理工大学 校 长：

证书编号：107005202206705799 二〇二二 年 七 月 五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://ww .com.cn

安全员安考证

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号:青建安C2（2023）0011959



姓　　名:李国祥

性　　别:男

出 生 年 月:1999年05月16日

企 业 名 称:青海泽标建设工程有限公司

职　　务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2023年11月20日

有 效 期:2023年11月20日　　至 2026年11月20日

发 证 机 关:青海省住房和城乡建设厅

发 证 日 期:2024 年 10 月 30日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制


全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户
住房和城乡建设部 | 无障碍浏览 | 登录
首页
信息公示
勘察设计
工程质量
施工安全
城市轨道交通
当前位置：首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情
安全生产管理人员考核合格证书信息
安全生产管理人员考核合格证书信息
返回
姓名 李国祥
性别 男
身份证件类型 公民身份号码
身份证件号码 632**********1X
安全生产管理人员类型 土建类专职安全生产管理人员
安全生产管理人员考核合格证书编号 青建安C2（2023）0011959
证书状态 有效
所在企业名称 青海泽标建设工程有限公司
所在企业统一社会信用代码 91630100MA759T5Q75
职务 专职安全生产管理人员
发证机关 青海省住房和城乡建设厅
初次领证日期 2023-11-20
发证日期 2024-10-30
有效期起始日期 2023-11-20
有效期终止日期 2026-11-20
青海泽标建设工程有限公司


青海泽标建设工程有限公司

社保证明

青海省企业职工基本养老保险参保缴费证明

基本信息					
姓名	李国祥	性别	男	个人编号	01041109026086
证件类型及号码	居民身份证(户口簿)	632802199905162018		单位编号	010311468367
参加工作时间	2019-01-01	现参保缴费单位	青海泽标建设工程有限公司		
建账时间	2019-01-01 00:00:00.0	参保起始时间	2019-01-01	参保状态	
当前个人账户累计储存额	11574.39		其中：个人缴费储存额		11574.39
欠费月数	0年0月	欠费时段			

缴费明细			
缴费区间	缴费月数	缴费单位	缴费类型
2019.01-2019.02	2	西宁红星美凯龙世博家居广场有限公司	成建制单位
2023.04-2024.10	19	青海立帆生态环境治理有限公司	成建制单位
2024.11-2025.05	7	青海泽标建设工程有限公司	成建制单位

社保机构名称：城中区社会保险服务局　　打印时间：2025-05-14

说明：若个人对缴费单位、缴费类型有异议，请前往参保所在地社保经办机构办理修正业务。

本证明仅供认定实际缴费年限，盖章后可作为参保人工龄认定依据。

安全员劳动合同

编号：

劳 动 合 同 书

（全日制用工）

用 人 单 位：青海泽标建设工程有限公司

劳动者姓名：李国祥

青海省人力资源和社会保障厅印制

使 用 说 明

一、本合同适用于全日制劳动者，即在本行政区域内的企业、个体经济组织、民办非企业单位、国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者，在订立、履行、变更劳动合同时使用。

二、填写劳动合同第四条中劳动者岗位时，属于劳务派遣工的，一律明确填写岗位属性，即临时性岗位、辅助性岗位或替代性岗位。同时对劳务派遣工应当签订二年以上固定期限劳动合同。

三、劳动合同试用期：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；劳动合同期限三年以上的，试用期不得超过六个月。

四、本合同一式三份。应由劳动者持有的一份不得由用人单位代为保管。用钢笔或签字笔填写，字迹清楚、文字简练、准确，不得涂改。

二〇二三年

根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，用人单位与劳动者双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同双方当事人基本情况

第一条 用人单位名称 青海泽标建设工程有限公司

法定代表人（主要负责人） 李积英

住　　所 青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼

联系电话 15110901357

第二条 劳动者姓名 李明祥 性别 男 民族 汉

居民身份证号码 632801199205162014

或者其他有效证件名称 ／ 证件号码 ／

户口所在地 青海省德令哈市尕海镇

现居住地址 青海省德令哈市尕海镇

二、劳动合同期限

第三条 本合同期限经双方协商一致，采取下列第（一）种形式：

（一）固定期限：自2023年11月6日起至2026年11月5日止。其中，试用期自／年／月／日至／年／月／日。

（二）无固定期限：自／年／月／日起。其中，试用期自／年／月／日至／年／月／日。

（三）以完成一定工作任务为期限：自／年／月／日起至／时止。

第四条 用人单位根据工作需要，安排劳动者在安全员岗位工作，工作地点为西宁。经双方协商同意，可以变更工作岗位。

第五条 劳动者在该岗位的职责要求是：

一、负责公司外来人员的接待工作；

二、负责公司档案（人事档案除外）的建立、保管及查询、借阅等工作；

三、负责日常接听电话、收发传真及回复日常邮件工作；

四、负责公司各类会议的通知；

五、负责安排董事长日常事务工作，完成领导交办的其他临时性工作；

六、负责指定、修改、完善本岗位所属各项工作的工作流程。

第六条 劳动者按照用人单位安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守用人单位依法制定的规章制度。

四、工作时间和休息休假

第七条 用人单位安排劳动者执行下列第（一）种工时制度。

（一）执行标准工时制度的，劳动者每天工作时间不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时。

（二）执行综合计算工时工作制度的，分别以周、月、季、年等为周期综合计算工作时间，但其周期内总的实际工作时间不

（三）执行不定时工作制度的，用人单位在保障职工身体健康的基础上，应采取轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

实行综合计算工时或者不定时工时的，由用人单位报人力资源社会保障行政部门批准后执行。

第八条 用人单位依法保证劳动者的休息休假权利。

五、劳动报酬

第九条 用人单位结合本单位的生产经营特点和经济效益，依法确定本单位的工资分配制度、劳动者的工资水平，按照本单位的工资分配制度，结合劳动者的劳动技能、劳动强度等确定，实行同工同酬。

第十条 用人单位按下列第（一）种形式支付劳动者工资。

（一）用人单位每月以货币形式支付劳动者工资3000元或按用人单位依法制定的《岗位人员工资标准》执行。

（二）计时工资。劳动者的工资标准为/元/月（周、日），绩效工资（奖金）根据劳动者实际劳动贡献确定。

（三）计件工资。劳动者的劳动定额为/，计件单价为/。

第十一条 劳动者在试用期的工资为/元（不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%）。

第十二条 用人单位安排劳动者延长工作时间的按150%的标

标准支付加班工资；法定节假日安排工作的按300%标准支付加班工资。

六、社会保险及其他保险福利待遇

第十三条 用人单位和劳动者双方按国家和青海省有关规定参加社会保险。用人单位为劳动者办理有关社会保险手续，并承担相应社会保险义务。

第十四条 劳动者在合同期内，患病、患职业病或因工负伤的按国家有关规定执行。

第十五条 用人单位为劳动者提供以下补充保险和福利待遇：

七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十六条 用人单位根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定对劳动者进行必要的培训和配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

第十七条 用人单位根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度；劳动者应当严格遵守用人单位的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

第十八条 用人单位违章指挥、强令冒险作业，危及劳动者人身安全的，劳动者有权拒绝。劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对用人单位提出批评、检举和控告。

八、劳动合同的履行、变更

第十九条 用人单位和劳动者双方按照本合同的约定，依法、

第二十条 用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响本合同的履行。

第二十一条 用人单位发生合并或者分立等情况，本合同继续有效，由继承其权利和义务的单位继续履行。

第二十二条 经用人单位和劳动者双方协商一致，可以变更本合同约定的内容，并以书面形式确定。

九、劳动合同的解除、终止和经济补偿

第二十三条 用人单位和劳动者双方解除、终止劳动合同，应当依照《劳动合同法》第三十六条、三十七条、三十八条、三十九条、四十条、四十一条、四十二条、四十三条、四十四条的规定执行。

第二十四条 用人单位和劳动者双方解除、终止本合同，符合《劳动合同法》第四十六条情形的，用人单位依法向劳动者支付经济补偿。

第二十五条 用人单位应当在解除或者终止本合同时，为劳动者出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。

用人单位和劳动者应当按照双方约定，办理工作交接。用人单位应当支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。

十、当事人约定的其他内容

第二十六条 用人单位为劳动者提供了专项培训费用，对其进行专业技术培训，双方可以订立专项协议，约定服务期，作为本合同的附件。

第二十七条 劳动者负有保密义务的，双方可以订立专项协议，

第二十八条 用人单位与劳动者双方约定本合同增加以下内容：

第二十九条 用人单位和劳动者双方因履行本合同发生争议，可以协商解决。协商不成的，可以依法申请仲裁、提起诉讼。

第三十条 本合同未尽事宜按国家和青海省有关规定执行。

用人单位：（公章）　　劳动者：（签字）

李国祥

法定代表人（委托代理人）

（签字或盖章）

签订日期：2023年 11 月 6 日　　签订日期：2023年 11 月 6 日

（二）主要人员简历表--质量管理员

姓名	**王静**	年龄	**28 岁**	学历	**专科**
职称	/	职务	**质量管理员**	拟在本合同任职	**质量管理员**
毕业学校		**2018 年毕业于 江西工商职业技术学院 学校会计 专业**			
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2022 年 5 月	**曲麻莱县麻多乡扎加村星宿海草原退化综合治理建设项目四标段**			**技术员**	**玛沁县自然资源和林业草原局**

注：后附相关资料

质量员身份证


姓 名 王 静
性 别 女 民 族 汉
出 生 1997 年 10 月 20 日
住 址 青海省平安县平安镇古驿
大道新册028号
公民身份号码 632121199710200021


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 平安县公安局
有效期限 2016.08.29-2026.08.29

质量员毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 王静 性别 女，一九九七 年 十 月 二十 日生，

于二0一五 年九 月至 二0一八 年 七 月在本校 会计与审计

专业 三 年制 专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，

准予毕业。

校 名：

证书编号：143211201806000795

校（院）长：

二0一八 年 七 月 一 日

质量员岗位证

证书编码：06325109000060000021

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：王静

身份证号：632121199710200021

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

培训机构：西宁众邦职业培训学校

发证时间：2025年04月21日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

扫码验证

2025 年社保证明

青海省企业职工基本养老保险参保缴费证明

基本信息					
姓名	王静	性别	女	个人编号	21211109115226
证件类型及号码	居民身份证(户口簿)	632121199710200021		单位编号	010311468367
参加工作时间	2020-03-01	现参保缴费单位	青海泽标建设工程有限公司		
建账时间	2020-03-01 00:00:00.0	参保起始时间	2020-03-01	参保状态	
当前个人账户累计储存额	12775.54		其中：个人缴费储存额		12775.54
欠费月数	0年0月	欠费时段			

缴费明细			
缴费区间	缴费月数	缴费单位	缴费类型
2020.03-2020.12	10	海东市平安区老干部活动中心	成建制单位
2022.07-2024.04	22	青海泽标建设工程有限公司	
2024.12-2025.06	7	青海泽标建设工程有限公司	成建制单位

社保机构名称：城中区社会保险服务局　　打印时间：2025-06-17

说明：若本人对缴费单位、缴费类型有异议，请前往参保所在地社保经办机构办理修改手续。

本证明用以认定实际缴费年限，盖章后可作为参保人工龄认定依据。

劳 动 合 同 书

（全日制用工）

用 人 单 位：青海泽标建设工程有限公司

劳动者姓名：

青海省人力资源和社会保障厅印制

使 用 说 明

一、本合同适用于全日制劳动者，即在本行政区域内的企业、个体经济组织、民办非企业单位、国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者，在订立、履行、变更劳动合同时使用。

二、填写劳动合同第四条中劳动者岗位时，属于劳务派遣工的，一律明确填写岗位属性，即临时性岗位、辅助性岗位或替代性岗位。同时对劳务派遣工应当签订二年以上固定期限劳动合同。

三、劳动合同试用期：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；劳动合同期限三年以上的，试用期不得超过六个月。

四、本合同一式三份。应由劳动者持有的一份不得由用人单位代为保管。用钢笔或签字笔填写，字迹清楚、文字简练、准确，不得涂改。

二〇二四年

根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，用人单位与劳动者双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同双方当事人基本情况

第一条 用人单位名称 青海泽标建设工程有限公司

法定代表人（主要负责人） 李积英

住　　所 青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼

联系电话 15110901357

第二条 劳动者姓名 [illegible] 性别 女 民族 汉

居民身份证号码 632121195710200021

或者其他有效证件名称 - 证件号码 -

户口所在地 青海省湟中县

现居住地址 青海省西宁市城北区

二、劳动合同期限

第三条 本合同期限经双方协商一致，采取下列第（二）种形式：

（一）固定期限：自2020年11月1日起至2022年10月31日止。其中，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。

（二）无固定期限：自 / 年 / 月 / 日起。其中，试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。

（三）以完成一定工作任务为期限：自 / 年 / 月 / 日起至 / 时止。

三、工作内容和工作地点

第四条 用人单位根据工作需要，安排劳动者在 项目经理 岗位工作，工作地点为 西宁 。经双方协商同意，可以变更工作岗位。

第五条 劳动者在该岗位的职责要求是：

一、负责公司外来人员的接待工作；

二、负责公司档案（人事档案除外）的建立、保管及查询、借阅等工作；

三、负责日常接听电话、收发传真及回复日常邮件工作；

四、负责公司各类会议的通知；

五、负责安排董事长日常事务工作，完成领导交办的其他临时性工作；

六、负责指定、修改、完善本岗位所属各项工作的工作流程。

第六条 劳动者按照用人单位安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守用人单位依法制定的规章制度。

四、工作时间和休息休假

第七条 用人单位安排劳动者执行下列第 （一） 种工时制度。

（一）执行标准工时制度的，劳动者每天工作时间不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时。

（二）执行综合计算工时工作制度的，分别以周、月、季、年等为周期综合计算工作时间，但其周期内总的实际工作时间不应超过法定标准工作时间。

（三）执行不定时工作制度的，用人单位在保障职工身体健康的基础上，应采取轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

实行综合计算工时或者不定时工时的，由用人单位报人力资源社会保障行政部门批准后执行。

第八条 用人单位依法保证劳动者的休息休假权利。

五、劳动报酬

第九条 用人单位结合本单位的生产经营特点和经济效益，依法确定本单位的工资分配制度。劳动者的工资水平，按照本单位的工资分配制度，结合劳动者的劳动技能、劳动强度等确定，实行同工同酬。

第十条 用人单位按下列第__（一）__种形式支付劳动者工资。

（一）用人单位每月以货币形式支付劳动者工资__3500__元或按用人单位依法制定的《_____岗位人员工资标准_____》执行。

（二）计时工资。劳动者的工资标准为_____元/月（周、日），绩效工资（奖金）根据劳动者实际劳动贡献确定。

（三）计件工资。劳动者的劳动定额为_____，计件单价为_____。

第十一条 劳动者在试用期的工资为_____元（不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的 80%）。

第十二条 用人单位安排劳动者延长工作时间的按 150%的标准支付加班工资；休息日安排劳动者工作又不能补休的按 200%

标准支付加班工资；法定节假日安排工作的按300%标准支付加班工资。

六、社会保险及其他保险福利待遇

第十三条 用人单位和劳动者双方按国家和青海省有关规定参加社会保险。用人单位为劳动者办理有关社会保险手续，并承担相应社会保险义务。

第十四条 劳动者在合同期内，患病、患职业病或因工负伤的按国家有关规定执行。

第十五条 用人单位为劳动者提供以下补充保险和福利待遇：

七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十六条 用人单位根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定对劳动者进行必要的培训和配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

第十七条 用人单位根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度；劳动者应当严格遵守用人单位的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

第十八条 用人单位违章指挥、强令冒险作业，危及劳动者人身安全的，劳动者有权拒绝。劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对用人单位提出批评、检举和控告。

八、劳动合同的履行、变更

第十九条 用人单位和劳动者双方按照本合同的约定，依法、全面履行各自的义务。

第二十条 用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响本合同的履行。

第二十一条 用人单位发生合并或者分立等情况，本合同继续有效，由继承其权利和义务的单位继续履行。

第二十二条 经用人单位和劳动者双方协商一致，可以变更本合同约定的内容，并以书面形式确定。

九、劳动合同的解除、终止和经济补偿

第二十三条 用人单位和劳动者双方解除、终止劳动合同，应当依照《劳动合同法》第三十六条、三十七条、三十八条、三十九条、四十条、四十一条、四十二条、四十三条、四十四条的规定执行。

第二十四条 用人单位和劳动者双方解除、终止本合同，符合《劳动合同法》第四十六条情形的，用人单位依法向劳动者支付经济补偿。

第二十五条 用人单位应当在解除或者终止本合同时，为劳动者出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。

用人单位和劳动者应当按照双方约定，办理工作交接。应当支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。

十、当事人约定的其他内容

第二十六条 用人单位为劳动者提供了专项培训费用，对其进行专业技术培训，双方可以订立专项协议，约定服务期，作为本合同的附件。

第二十七条 劳动者负有保密义务的，双方可以订立专项协议，约定竞业限制条款，作为本合同的附件。

第二十八条 用人单位与劳动者双方约定本合同增加以下内容：

第二十九条 用人单位和劳动者双方因履行本合同发生争议，可以协商解决。协商不成的，可以依法申请仲裁、提起诉讼。

第三十条 本合同未尽事宜按国家和青海省有关规定执行。

用人单位：（公章）　　劳动者：（签字）

法定代表人（委托代理人）

（签字或盖章）

签订日期：　年　月　日　　签订日期：2021年 11月 1 日

（二）主要人员简历表--运输管理员

姓名	王晓梅	年龄	29 岁	学历	专科
职称	/	职务	运输管理员	拟在本合同任职	运输管理员
毕业学校		2017 年毕业于 青海建筑执业技术学院 学校 建筑工程技术 专业			
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2022 年 5 月	曲麻莱县麻多乡扎加村至宿海草原退化综合治理建设项目四标段			技术员	玛沁县自然资源和林业草原局

注：后附相关资料



姓 名 王晓梅

性 别 女 民 族 汉

出 生 1995 年 12 月 10 日

住 址 青海省互助土族自治县塘川镇大通苑村285附2号

公民身份号码 632126199512100427



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 互助县公安局

有效期限 2016.09.01-2026.09.01



普通高等学校

毕业证书

学生 王晓梅 性别 女，一九九五 年 十二月 十 日生，于 二〇一四 年 九 月至 二〇一七年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：青海建筑职业技术学院 校（院）长：

证书编号：129741201706000550 二〇一七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　　名：王晓梅

性　　别：女

出生年月：1995.12.10

身份证号：632126199512100427

职　　称：

工作单位：青海泽标建设工程有限公司

王晓梅同志已完成青海省生态保护和建设工程技术人员培训并考核合格，特颁发此证。

专业：生态工程技术

证书编号：QAEC-JS-2023-047

发证单位：青海省生态保护和建设协会

发证时间：2023 年 02 月 27 日

有效期至：2028 年 02 月 27 日

继续教育登记

培训单位	青海省林业草原人才交流培训有限公司（盖章）		
学习形式	专题讲授、案例分析、交流研讨、现场教学、专家点评、综合测试		
起止日期	2023年2月20日-2月23日	总学时	28

学习内容或科目	学时
“二十大”精神内容解读	3.5
全过程咨询法律风险识别与业务合规管理	3.5
青海省草地生态建设工程监理与施工	3.5
如何设计生态草原规划项目	3.5
《青海省林业和草原生态建设项目管理办法》等八个管理办法解读	3.5
现场教学：青海省自然资源博物馆	3.5
现场教学：青海林草工程档案管理示范基地（青海生态工程档案管理概要及案例分析）	3.5
《项目计划编制、进度动态管理及项目检查和验收》及《项目招投标管理办法及细则》解读	3.5
考核(试)结果	合格

主管部门（盖章）2023 年 2 月 21 日

培训单位（盖章）2023 年 2 月 21 日

继续教育登记

培训单位	（盖章）		
学习形式			
起止日期		总学时	

学习内容或科目	学时	考核(试)结果

主管部门（盖章）年 月 日

培训单位（盖章）年 月 日



中华人民共和国机动车驾驶证
Driving License of the People's Republic of China
证号 632126199512100427
姓名 Name 王晓梅 性别 Sex 女 国籍 Nationality 中国/CHN
住址 Address 青海省海东市互助土族自治县塘川镇大通苑村285附2号
青海省海东市公安局交通警察支队
出生日期 Date of Birth 1995-12-10
初次领证日期 Date of First Issue 2022-01-21
准驾车型 Class C1
有效期限 Valid Period 2022-01-21 至 2028-01-21



中华人民共和国机动车驾驶证副页
证号 632126199512100427
姓名 王晓梅 档案编号 630200003417
记录 实习期至2023年01月20日

证书编码：063171149631700094O

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　王晓梅

身份证号：632126199512100427

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2021 年度，继续教育学时为 64 学时。

扫码验证

培训机构：青海省

发证时间：2021年09月30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

登记通知书

（宁市监）登字[2023]第 000743 号

青海泽标建设工程有限公司（市场主体名称）：

你单位提交的注册资本、股东出资额、经营范围、执行董事、经理、法定代表人变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

（登记机关盖章）

2023 年 03 月 31 日

注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

社保证明

青海省企业职工基本养老保险参保缴费证明

基本信息					
姓名	王晓梅	性别	女	个人编号	01031109312566
证件类型及号码	居民身份证(户口簿)	632126199512100427		单位编号	010311468367
参加工作时间	2022-01-01	现参保缴费单位	青海泽标建设工程有限公司		
建账时间	2022-01-01 00:00:00.0	参保起始时间	2022-01-01	参保状态	
当前个人账户累计储存额	16798.62		其中：个人缴费储存额		16798.62
欠费月数	0年0月	欠费时段			

缴费明细			
缴费区间	缴费月数	缴费单位	缴费类型
2022.01-2025.05	41	青海泽标建设工程有限公司	成建制单位

社保机构名称：城中区社会保险服务局　　打印时间：2025-05-14

说明：若个人对缴费单位、缴费类型有异议，请前往参保所在地社会经办机构办理修正业务。

本证明仅认定实际缴费年限，核定后可作为参保人工龄认定依据。

编号：

劳 动 合 同 书

（全日制用工）

用 人 单 位：青海泽标建设工程有限公司

劳动者姓名：[redacted]

青海省人力资源和社会保障厅印制

使 用 说 明

一、本合同适用于全日制劳动者，即在本行政区域内的企业、个体经济组织、民办非企业单位、国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者，在订立、履行、变更劳动合同时使用。

二、填写劳动合同第四条中劳动者岗位时，属于劳务派遣工的，一律明确填写岗位属性，即临时性岗位、辅助性岗位或替代性岗位。同时对劳务派遣工应当签订二年以上固定期限劳动合同。

三、劳动合同试用期：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；劳动合同期限三年以上的，试用期不得超过六个月。

四、本合同一式三份。应由劳动者持有的一份不得由用人单位代为保管。用钢笔或签字笔填写，字迹清楚、文字简练、准确，不得涂改。

二〇二二年

根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，用人单位与劳动者双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同双方当事人基本情况

第一条 用人单位名称 青海泽标建设工程有限公司

法定代表人（主要负责人） 李积英

住　　所 青海省西宁市城中区南川东路 85 号 40 号楼

联系电话 15110901357

第二条 劳动者姓名 王晓梅 性别 女 民族 汉

居民身份证号码 632126199[illegible]

或者其他有效证件名称 ／ 证件号码 ／

户口所在地 青海省海东乐[illegible]

现居住地址 青海省西宁市

二、劳动合同期限

第三条 本合同期限经双方协商一致，采取下列第（二）种形式：

（一）固定期限：自 2023 年 7 月 1 日起至 2028 年 7 月 1 日止。其中，试用期自 ／ 年 ／ 月 ／ 日至 ／ 年 ／ 月 ／ 日。

（二）无固定期限：自 ／ 年 ／ 月 ／ 日起。其中，试用期自 ／ 年 ／ 月 ／ 日至 ／ 年 ／ 月 ／ 日。

（三）以完成一定工作任务为期限：自 ／ 年 ／ 月 ／ 日起至 ／ 时止。

三、工作内容和工作地点

第四条 用人单位根据工作需要，安排劳动者在资料员岗位工作，工作地点为西宁。经双方协商同意，可以变更工作岗位。

第五条 劳动者在该岗位的职责要求是：

一、负责公司外来人员的接待工作；

二、负责公司档案（人事档案除外）的建立、保管及查询、借阅等工作；

三、负责日常接听电话、收发传真及回复日常邮件工作；

四、负责公司各类会议的通知；

五、负责安排董事长日常事务工作，完成领导交办的其他临时性工作；

六、负责指定、修改、完善本岗位所属各项工作的工作流程。

第六条 劳动者按照用人单位安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守用人单位依法制定的规章制度。

四、工作时间和休息休假

第七条 用人单位安排劳动者执行下列第（一）种工时制度。

（一）执行标准工时制度的，劳动者每天工作时间不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时。

（二）执行综合计算工时工作制度的，分别以周、月、季、年等为周期综合计算工作时间，但其周期内总的实际工作时间不应超过法定标准工作时间。

（三）执行不定时工作制度的，用人单位在保障职工身体健康的基础上，应采取轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

实行综合计算工时或者不定时工时的，由用人单位报人力资源社会保障行政部门批准后执行。

第八条 用人单位依法保证劳动者的休息休假权利。

五、劳动报酬

第九条 用人单位结合本单位的生产经营特点和经济效益，依法确定本单位的工资分配制度。劳动者的工资水平，按照本单位的工资分配制度，结合劳动者的劳动技能、劳动强度等确定，实行同工同酬。

第十条 用人单位按下列第（一）种形式支付劳动者工资。

（一）用人单位每月以货币形式支付劳动者工资 3300 元或按用人单位依法制定的《岗位人员工资标准》执行。

（二）计时工资。劳动者的工资标准为 / 元/月（周/日），绩效工资（奖金）根据劳动者实际劳动贡献确定。

（三）计件工资。劳动者的劳动定额为 /，计件单价为 /。

第十一条 劳动者在试用期的工资为 / 元（不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的 80%）。

第十二条 用人单位安排劳动者延长工作时间的按 150%的标准支付加班工资；休息日安排劳动者工作又不能补休的按 200%

标准支付加班工资；法定节假日安排工作的按300%标准支付加班工资。

六、社会保险及其他保险福利待遇

第十三条 用人单位和劳动者双方按国家和青海省有关规定参加社会保险。用人单位为劳动者办理有关社会保险手续，并承担相应社会保险义务。

第十四条 劳动者在合同期内，患病、患职业病或因工负伤的按国家有关规定执行。

第十五条 用人单位为劳动者提供以下补充保险和福利待遇：

七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十六条 用人单位根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定对劳动者进行必要的培训和配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

第十七条 用人单位根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度；劳动者应当严格遵守用人单位的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

第十八条 用人单位违章指挥、强令冒险作业，危及劳动者人身安全的，劳动者有权拒绝。劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对用人单位提出批评、检举和控告。

八、劳动合同的履行、变更

第十九条 用人单位和劳动者双方按照本合同的约定，依法、全面履行各自的义务。

第二十条 用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响本合同的履行。

第二十一条 用人单位发生合并或者分立等情况，本合同继续有效，由继承其权利和义务的单位继续履行。

第二十二条 经用人单位和劳动者双方协商一致，可以变更本合同约定的内容，并以书面形式确定。

九、劳动合同的解除、终止和经济补偿

第二十三条 用人单位和劳动者双方解除、终止劳动合同，应当依照《劳动合同法》第三十六条、三十七条、三十八条、三十九条、四十条、四十一条、四十二条、四十三条、四十四条的规定执行。

第二十四条 用人单位和劳动者双方解除、终止本合同，符合《劳动合同法》第四十六条情形的，用人单位依法向劳动者支付经济补偿。

第二十五条 用人单位应当在解除或者终止本合同时，为劳动者出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。

用人单位和劳动者应当按照双方约定，办理工作交接。应当支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。

十、当事人约定的其他内容

第二十六条 用人单位为劳动者提供了专项培训费用，对其进行专业技术培训，双方可以订立专项协议，约定服务期，作为本合同的附件。

第二十七条 劳动者负有保密义务的，双方可以订立专项协议，约定竞业限制条款，作为本合同的附件。

第二十八条 用人单位与劳动者双方约定本合同增加以下内容：

第二十九条 用人单位和劳动者双方因履行本合同发生争议，可以协商解决。协商不成的，可以依法申请仲裁、提起诉讼。

第三十条 本合同未尽事宜按国家和青海省有关规定执行。

用人单位：（公章）　　劳动者：（签字）

王成梅

法定代表人（委托代理人）

（签字或盖章）

签订日期：2021年 7 月 18 日　　签订日期：2021年 7 月 18 日

（二）主要人员简历表--货物管理员

姓名	郭建芬	年龄	28 岁	学历	专科
职称	/	职务	货物管理员	拟在本合同任职	货物管理员
毕业学校		2017 年毕业于 青海建筑执业技术学院 学校 建筑工程技术 专业			
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
2022 年 5 月	曲麻莱县麻多乡扎加村至宿海草原退化综合治理建设项目四标段			货物管理员	玛沁县自然资源和林业草原局

注：后附相关资料


姓 名 郭建芬
性 别 女 民 族 汉
出 生 1996 年 3 月 4 日
住 址 青海省互助土族自治县塘川镇五下村29号
公民身份号码 632126199603040626


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 互助县公安局
有效期限 2022.04.01-2042.04.01



姓　　名：郭建芬

性　　别：女

出生年月：1996.03.04

身份证号：632126199603040626

职　　称：

工作单位：青海泽标建设工程有限公司

郭建芬 同志已完成青海省生态保护和建设工程技术人员培训并考核合格，特颁发此证。

专业：生态工程技术

证书编号：QAEC-JS-2023-049

发证单位：青海省生态保护和建设协会

发证时间：2023 年 02 月 27 日

有效期至：2026 年 02 月 27 日

继续教育登记

培训单位	青海省林业草原人才交流培训有限公司（盖章）		
学习形式	专题讲授、案例分析、交流研讨、现场教学、自学占课、综合测试		
起止日期	2023年2月20日-2月23日	总学时	28

学习内容或科目	学时
“二十大”精神内容解读	3.5
全过程咨询法律风险识别与业务合规管理	3.5
青海省草地生态建设工程监理与施工	3.5
如何设计生态草原规划项目	3.5
《青海省林业和草原生态建设项目管理办法》等八个管理办法解读	3.5
现场教学：青海省自然资源博物馆	3.5
现场教学：青海林草工程档案管理示范基地(青海生态工程档案管理概要及案例分析)	3.5
(项目计划编制、进度动态管理及项目检查和验收)及《项目招投标管理办法及细则》解读	3.5
考核(试)结果	合格

主管部门（盖章）2023 年 2 月 21 日

培训单位（盖章）2023 年 2 月 21 日

继续教育登记

培训单位	（盖章）		
学习形式			
起止日期		总学时	

学习内容或科目	学时	考核(试)结果

主管部门（盖章）年 月 日

培训单位（盖章）年 月 日

证书编码：06323111000020000022

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　郭建芬

身份证号：　632126199603040626

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：青海建筑职业技术学院

发证时间：2023年04月23日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

社保证明

青海省企业职工基本养老保险参保缴费证明

基本信息					
姓名	郭建芬	性别	女	个人编号	01031109312567
证件类型及号码	居民身份证(户口簿)	632126199603040626		单位编号	010311468367
参加工作时间	2022-01-01	现参保缴费单位	青海泽标建设工程有限公司		
建账时间	2022-01-01 00:00:00.0	参保起始时间	2022-01-01	参保状态	
当前个人账户累计储存额	16798.62		其中：个人缴费储存额		16798.62
欠费月数	0年0月	欠费时段			

缴费明细			
缴费区间	缴费月数	缴费单位	缴费类型
2022.01-2025.05	41	青海泽标建设工程有限公司	成建制单位

社保机构名称：城中区社会保险服务局　　打印时间：2025-05-14

说明：若个人对缴费单位、缴费类型有异议，请前往参保所在地社会经办机构办理修正业务。

本证明仅供认定实际缴费年限，盖章后可作为领取工龄认定依据

登记通知书

（宁市监）登字[2023]第 000743 号

青海泽标建设工程有限公司（市场主体名称）：

你单位提交的注册资本、股东出资额、经营范围、执行董事、经理、法定代表人变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

（登记机关盖章）

2023 年 03 月 31 日

注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

编号：

劳 动 合 同 书

（全日制用工）

用 人 单 位：青海泽标建设工程有限公司

劳动者姓名：

青海省人力资源和社会保障厅印制

使　用　说　明

一、本合同适用于全日制劳动者，即在本行政区域内的企业、个体经济组织、民办非企业单位、国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者，在订立、履行、变更劳动合同时使用。

二、填写劳动合同第四条中劳动者岗位时，属于劳务派遣工的，一律明确填写岗位属性，即临时性岗位、辅助性岗位或替代性岗位。同时对劳务派遣工应当签订二年以上固定期限劳动合同。

三、劳动合同试用期：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；劳动合同期限三年以上的，试用期不得超过六个月。

四、本合同一式三份。应由劳动者持有的一份不得由用人单位代为保管。用钢笔或签字笔填写，字迹清楚、文字简练、准确，不得涂改。

二〇二一年

使 用 说 明

一、本合同适用于全日制劳动者，即在本行政区域内的企业、个体经济组织、民办非企业单位、国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者，在订立、履行、变更劳动合同时使用。

二、填写劳动合同第四条中劳动者岗位时，属于劳务派遣工的，一律明确填写岗位属性，即临时性岗位、辅助性岗位或替代性岗位。同时对劳务派遣工应当签订二年以上固定期限劳动合同。

三、劳动合同试用期：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；劳动合同期限三年以上的，试用期不得超过六个月。

四、本合同一式三份。应由劳动者持有的一份不得由用人单位代为保管。用钢笔或签字笔填写，字迹清楚、文字简练、准确，不得涂改。

二〇二一年

根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，用人单位与劳动者双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同双方当事人基本情况

第一条 用人单位名称 青海泽标建设工程有限公司

法定代表人（主要负责人） 李积芳

住　　所 青海省西宁市城中区南川东路 85 号 40 号楼

联系电话 15110901357

第二条 劳动者姓名 [illegible] 性别 [illegible] 民族 汉

居民身份证号码 632126[illegible]

或者其他有效证件名称 ___ 证件号码 ___

户口所在地 [illegible]

现居住地址 [illegible]

二、劳动合同期限

第三条 本合同期限经双方协商一致，采取下列第（一）种形式：

（一）固定期限：自 2022 年 4 月 1 日起至 2026 年 4 月 1 日止。其中，试用期自 ___ 年 ___ 月 ___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日。

（二）无固定期限：自 ___ 年 ___ 月 ___ 日起。其中，试用期自 ___ 年 ___ 月 ___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日。

（三）以完成一定工作任务为期限：自 ___ 年 ___ 月 ___ 日起至 ___ 时止。

三、工作内容和工作地点

第四条 用人单位根据工作需要，安排劳动者在技术员岗位工作，工作地点为西宁。经双方协商同意，可以变更工作岗位。

第五条 劳动者在该岗位的职责要求是：

一、负责公司外来人员的接待工作；

二、负责公司档案（人事档案除外）的建立、保管及查询、借阅等工作；

三、负责日常接听电话、收发传真及回复日常邮件工作；

四、负责公司各类会议的通知；

五、负责安排董事长日常事务工作，完成领导交办的其他临时性工作；

六、负责指定、修改、完善本岗位所属各项工作的工作流程。

第六条 劳动者按照用人单位安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守用人单位依法制定的规章制度。

四、工作时间和休息休假

第七条 用人单位安排劳动者执行下列第（一）种工时制度。

（一）执行标准工时制度的，劳动者每天工作时间不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时。

（二）执行综合计算工时工作制度的，分别以周、月、季、年等为周期综合计算工作时间，但其周期内总的实际工作时间不应超过法定标准工作时间。

（三）执行不定时工作制度的，用人单位在保障职工身体健康的基础上，应采取轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

实行综合计算工时或者不定时工时的，由用人单位报人力资源社会保障行政部门批准后执行。

第八条 用人单位依法保证劳动者的休息休假权利。

五、劳动报酬

第九条 用人单位结合本单位的生产经营特点和经济效益，依法确定本单位的工资分配制度。劳动者的工资水平，按照本单位的工资分配制度，结合劳动者的劳动技能、劳动强度等确定，实行同工同酬。

第十条 用人单位按下列第（一）种形式支付劳动者工资。

（一）用人单位每月以货币形式支付劳动者工资 3000 元或按用人单位依法制定的《岗位人员工资标准》执行。

（二）计时工资。劳动者的工资标准为 / 元/月（周、日），绩效工资（奖金）根据劳动者实际劳动贡献确定。

（三）计件工资。劳动者的劳动定额为 /，计件单价为 /。

第十一条 劳动者在试用期的工资为 / 元（不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的 80%）。

第十二条 用人单位安排劳动者延长工作时间的按 150%的标准支付加班工资；休息日安排劳动者工作又不能补休的按 200%

标准支付加班工资；法定节假日安排工作的按300%标准支付加班工资。

六、社会保险及其他保险福利待遇

第十三条 用人单位和劳动者双方按国家和青海省有关规定参加社会保险。用人单位为劳动者办理有关社会保险手续，并承担相应社会保险义务。

第十四条 劳动者在合同期内，患病、患职业病或因工负伤的按国家有关规定执行。

第十五条 用人单位为劳动者提供以下补充保险和福利待遇：

七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十六条 用人单位根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定对劳动者进行必要的培训和配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

第十七条 用人单位根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度；劳动者应当严格遵守用人单位的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

第十八条 用人单位违章指挥、强令冒险作业，危及劳动者人身安全的，劳动者有权拒绝。劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对用人单位提出批评、检举和控告。

八、劳动合同的履行、变更

第十九条 用人单位和劳动者双方按照本合同的约定，依法、全面履行各自的义务。

第二十条 用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响本合同的履行。

第二十一条 用人单位发生合并或者分立等情况，本合同继续有效，由继承其权利和义务的单位继续履行。

第二十二条 经用人单位和劳动者双方协商一致，可以变更本合同约定的内容，并以书面形式确定。

九、劳动合同的解除、终止和经济补偿

第二十三条 用人单位和劳动者双方解除、终止劳动合同，应当依照《劳动合同法》第三十六条、三十七条、三十八条、三十九条、四十条、四十一条、四十二条、四十三条、四十四条的规定执行。

第二十四条 用人单位和劳动者双方解除、终止本合同，符合《劳动合同法》第四十六条情形的，用人单位依法向劳动者支付经济补偿。

第二十五条 用人单位应当在解除或者终止本合同时，为劳动者出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。

用人单位和劳动者应当按照双方约定，办理工作交接。应当支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。

十、当事人约定的其他内容

第二十六条 用人单位为劳动者提供了专项培训费用，对其进行专业技术培训，双方可以订立专项协议，约定服务期，作为本合同的附件。

第二十七条 劳动者负有保密义务的，双方可以订立专项协议，约定竞业限制条款，作为本合同的附件。

第二十八条 用人单位与劳动者双方约定本合同增加以下内容：

第二十九条 用人单位和劳动者双方因履行本合同发生争议，可以协商解决。协商不成的，可以依法申请仲裁、提起诉讼。

第三十条 本合同未尽事宜按国家和青海省有关规定执行。

用人单位：（公章）　　劳动者：（签字）

法定代表人（委托代理人）：

（签字或盖章）

签订日期：2022年 11月 1日　　签订日期：2022年 11月 1日

附件 9：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附网站查询截图，截图中须显示“报告查看时间”，时间为投标截止时间前 20 天内。

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李积英（签字或盖章）

2025年07月15日

中国裁判文书截图（公司、法人、项目经理）

（https://wenshu.court.gov.cn/）






2025年7月14日 星期一
欢迎您，18797097950 退出 意见建议 返回主站 使用帮助
中国裁判文书网
China Judgements Online
首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书
高级检索
输入案由、关键词、法院、当事人、律师
搜索
关键字
案由
法院层级
地域及法院
裁判年份
审判程序
文书类型
案例等级
已选条件：
保存搜索条件 清空搜索条件
全文：青海泽标建设工程有限公司、李积英、陈慧
案由：行贿罪
法院层级：全部
案件类型：刑事案件
文书类型：全部
共检索到 0 篇文书
法院层级 裁判日期 审判程序
全选 批量收藏
暂无数据！
中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网
中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航
地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114
京ICP备05023036号


青海泽标建设工程有限公司
6301012258975


青海泽标建设工程有限公司

中华人民共和国最高人民法院企业被执行人网络查询截图

公司查询（https://www.court.gov.cn/）





法人查询





全国法院被执行人信息查询使用声明

为推进社会信用体系建设，切实解决执行难问题，促进被执行人自动履行生效法律文书确定的义务，保障公民、法人和其他组织依法获取执行案件信息，充分发挥执行案件信息对人民群众生产生活和社会经济活动的服务作用，参照《中华人民共和国政府信息公开条例》，最高人民法院从2009年3月30日起向社会开通"全国法院被执行人信息查询"平台。社会各界通过该平台可查询全国法院（不包括军事法院）2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。现就有关事项申明如下：

一、被执行人信息由执行法院录入和审核，若有关当事人对相关信息内容有异议的，可依据《最高人民法院关于全国法院被执行人信息查询平台信息异议处理问题的若干规定》向执行法院书面申请更正。

二、本网站提供的信息仅供查询人参考，如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

三、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

四、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

五、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

最高人民法院

二〇〇九年三月三十日

项目经理查询


努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义
中华人民共和国最高人民法院
The Supreme People's Court of The People's Republic of China
首页
学习新时代
机构设置
法院资讯
权威发布
公报
审判业务
法院建设
办事服务
公众互动
巡回法庭
驻院纪检监察组
走出一条中国特色城市发展道路——以习近平同志为核心的党中央引领城市工作纪实
习近平向苏里南当选总统西蒙斯致贺电
习近平给田华等8位电影艺术家回信
习近平在山西阳泉市向抗战烈士敬献花篮并参观百团大战纪念馆
全国法院生态环境资源审判工作会议召开
要闻
更多
“经济大省的法院工作也要努力‘挑大梁’”——最高法调研组调研江苏法院、最高法三巡
最高法、人力资源社会保障部、江苏省委联合召开追授边晓斌同志称号表彰会 张军信长星出席会议并讲话 许昆林主持 ...
最高法举行“人民法院大讲堂”人工智能专题辅导报告会
最高法召开党组会传达学习贯彻习近平总书记在中央政治局第二十一次集体学习时的重要讲话精神
张军向基层法院班子成员、初任法官专题讲授 把习近平法治思想更深更实融入审判执行、审判管理
锲而不舍落实 中央八项规定精神
接续奋斗 共谱新篇
学习贯彻 习近平法治思想


中国执行信息公开网
——司法为民 公正司法
首页
执行公开服务
综合查询被执行人
被执行人姓名/名称:
陈慧
身份证号码/组织机构代码:
150102196706152064
执行法院范围:
全国法院（包含地方各级法院）
验证码:
SVEX
验证码正确!
查询
查询结果
在全国法院（包含地方各级法院）范围内没有找到 150102196706152064 陈慧相关的结果.
全国法院被执行人信息查询使用声明
为推进社会信用体系建设，切实解决执行难问题，促进被执行人自动履行生效法律文书确定的义务，保障公民、法人和其他组织依法获取执行案件信息，充分发挥执行案件信息对人民群众生产生活和社会经济活动的服务作用，参照《中华人民共和国政府信息公开条例》，最高人民法院从2009年3月30日起向社会开通“全国法院被执行人信息查询”平台。社会各界通过该平台可查询全国法院（不包括军事法院）2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。现就有关事项申明如下：
一、被执行人信息由执行法院录入和审核，若有关当事人对相关信息内容有异议的，可依据《最高人民法院关于全国法院被执行人信息查询平台信息异议处理的若干规定》向执行法院书面申请更正。
二、本网站提供的信息仅供查询人参考，如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。
三、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。
四、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
五、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。
最高人民法院
二〇〇九年三月三十日

信用中国查询截图（https://www.creditchina.gov.cn/）

“信用中国”网站下载的公司完整信用报告信息



第 1 条

行政许可决定文书号	青西高路许〔2025〕2号
行政许可决定文书名称	交通行政许可决定书
许可证书名称	——
许可类别	普通
许可编号	——
许可决定日期	2025-04-28
有效期自	2025-04-28
有效期至	2028-04-28
许可内容	G0615德马高速K110+360米(下行线右幅)、K115+180米(上行线左幅)处从事增设平面交叉道口
许可机关	青海省交通运输综合行政执法海西高速支队
许可机关统一社会信用代码	126300000916040443
数据来源单位	青海省交通运输厅
数据来源单位统一社会信用代码	11630000015000556M

第 2 条

行政许可决定文书号	〔青〕JZ安许证字〔2020〕000038
行政许可决定文书名称	安全生产许可证
许可证书名称	(青)JZ安许证字[2020]000038
许可类别	核准
许可编号	安全生产许可证
许可决定日期	2023-05-30
有效期自	2023-05-30
有效期至	2026-06-04
许可内容	建筑施工
许可机关	西宁市行政审批服务局
许可机关统一社会信用代码	11630100MB0Q66927D
数据来源单位	青海省住房和城乡建设厅
数据来源单位统一社会信用代码	11630000015000564G

第 3 条

行政许可决定文书号	宁市监登字2023第000743号
行政许可决定文书名称	登记通知书
许可证书名称	——
许可类别	其他-变更
许可编号	——
许可决定日期	2023-03-31
有效期自	2023-03-31
有效期至	2099-12-31
许可内容	营业执照
许可机关	西宁市行政审批服务局
许可机关统一社会信用代码	11630100MB0Q66927D
数据来源单位	西宁市行政审批服务局
数据来源单位统一社会信用代码	11630100MB0Q66927D

第 4 条

行政许可决定文书号	‹宁中税›许准字‹2020›第‹676›号
行政许可决定文书名称	增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批
许可证书名称	——
许可类别	普通
许可编号	——
许可决定日期	2020-05-21
有效期自	2020-05-21
有效期至	2099-12-31
许可内容	准予行政许可文书内容：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，决定准予你（单位）取得《增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批》
许可机关	国家税务总局西宁市城中区税务局第一税务分局(办税服务厅)
许可机关统一社会信用代码	116301000150119928
数据来源单位	国家税务总局西宁市税务局
数据来源单位统一社会信用代码	116301000150119928

青海泽标建设工程有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91630100MA759T5Q75

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3."信用中国"网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉　　下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	李积英	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2020-04-07	住所	青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

行政管理 4　诚实守信 2　严重失信 0　经营异常 0　信用承诺 0　信用评价 0　司法判决 0　其他 0

全部 2　纳税信用A级纳税人 2

第 1 条

纳税人名称	青海泽标建设工程有限公司
纳税人识别号	91630100MA759T5Q75
评价年度	2024
数据来源	国家税务总局

第 2 条

纳税人名称	青海泽标建设工程有限公司
纳税人识别号	91630100MA759T5Q75
评价年度	2023
数据来源	国家税务总局

青海泽标建设工程有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91630100MA759T5Q75

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3."信用中国"网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉　　下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	李积英	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2020-04-07	住所	青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

行政管理	诚实守信	严重失信	经营异常	信用承诺	信用评价	司法判决	其他
4	2	0	0	1	0	0	0

很抱歉，没有找到您搜索的数据

青海泽标建设工程有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91630100MA759T5Q75

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3."信用中国"网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉　　下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	李积英	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2020-04-07	住所	青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

行政管理	诚实守信	严重失信	经营异常	信用承诺	信用评价	司法判决	其他
4	2	0	0	0	0	0	0

很抱歉，没有找到您搜索的数据

青海泽标建设工程有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91630100MA759T5Q75

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3."信用中国"网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉　　下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	李积英	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2020-04-07	住所	青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

行政管理	诚实守信	严重失信	经营异常	信用承诺	信用评价	司法判决	其他
4	2	0	0	1	0	0	0

全部 1　　企业信用承诺信息（新标准） 1

第 1 条

承诺编码	63010020200407168227
承诺类型	主动型
承诺事由	主动型，自愿作出承诺
承诺内容	市场主体登记守信经营信用承诺
承诺作出日期	2020-04-07
承诺履行状态	全部履行
承诺受理单位	西宁市市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码	11630100MB0U891961

青海泽标建设工程有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91630100MA759T5Q75

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3."信用中国"网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉　　下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	李积英	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2020-04-07	住所	青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

行政管理	诚实守信	严重失信	经营异常	信用承诺	信用评价	司法判决	其他
4	2	0	0	1	0	0	0

很抱歉，没有找到您搜索的数据

青海泽标建设工程有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91630100MA759T5Q75

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3."信用中国"网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉　　下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	李积英	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2020-04-07	住所	青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

行政管理	诚实守信	严重失信	经营异常	信用通告	信用评价	司法判决	其他
4	2	0	0	1	0	0	0

很抱歉，没有找到您搜索的数据

青海泽标建设工程有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91630100MA759T5Q75

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3."信用中国"网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉　　下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	李积英	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2020-04-07	住所	青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

行政管理	诚实守信	严重失信	经营异常	信用承诺	信用评价	司法判决	其他
4	2	0	0		0	0	0

很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 信息公示 > 行政管理信息查询
行政管理信息查询
行政许可
行政处罚
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索数据

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

青海泽标建设工程有限公司 查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据





信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 信息公示 > 经营（活动）异常名录信息查询
经营（活动）异常名录信息查询
青海泽标建设工程有限公司
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 信息公示 > 统一社会信用代码查询
统一社会信用代码查询
青海泽标建设工程有限公司
查询
检索条件：青海泽标建设工程有限公司
根据当前筛选条件，共找到 1 条结果
主体名称
统一社会信用代码
纳税人识别号
工商注册号
青海泽标建设工程有限公司
91630100MA7
——
——




中国执行信息公开网
司法为民 公正司法
首页
执行公开服务
失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！
失信被执行人(自然人)公布
姓名/名称
证件号码
郑树
5102021973****0919
钟来平
5129211973****3853
雍先全
5129011961****2911
张雪飞
1302811988****005X
王久儒
1326231964****4535
失信被执行人(法人或其他组织)公布
姓名/名称
证件号码
河池市弘农加油站
9145120159****977J
河池市弘农加油站
9145120159****977J
河池市弘农加油站
9145120159****977J
上海立钧物资有限公司
70316927-5
浙江普利金塑胶有限责任公司
79336119-8
查询条件
被执行人姓名/名称:
青海泽标建设工程有限公司
身份证号码/组织机构代码:
91630100MA759T5Q75
省份:
----------全部----------
验证码:
PXKA
验证码正确!
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 91630100MA759T5Q75 青海泽标建设工程有限公司相关的结果.
限制高消费令

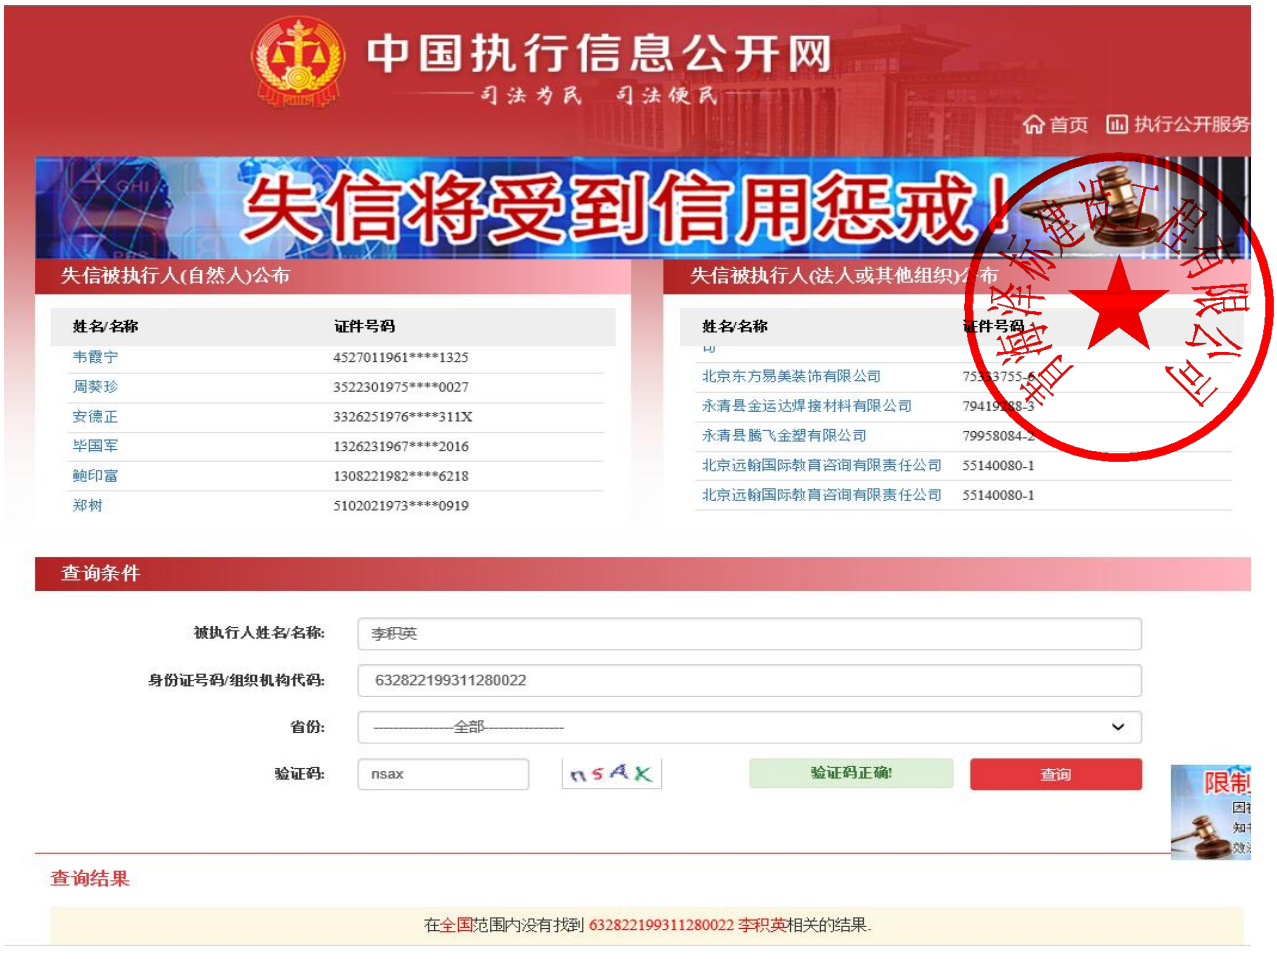
中国执行信息公开网
司法为民 公正司法
首页
执行公开服务
失信将受到信用惩戒！
失信被执行人(自然人)公布
姓名/名称
证件号码
韦霞宁
4527011961****1325
周葵珍
3522301975****0027
安德正
3326251976****311X
毕国军
1326231967****2016
鲍印富
1308221982****6218
郑树
5102021973****0919
失信被执行人(法人或其他组织)公布
姓名/名称
证件号码
北京东方易美装饰有限公司
永清县金运达焊接材料有限公司
永清县腾飞金塑有限公司
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
查询条件
被执行人姓名/名称:
李积英
身份证号码/组织机构代码:
632822199311280022
省份:
----------全部----------
验证码:
nsax
nsAX
验证码正确!
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 632822199311280022 李积英相关的结果.


中国执行信息公开网
司法为民 公正执法
首页
执行公开
失信被执行人(自然人)公布
姓名/名称 证件号码
毕国军 1326231967****2016
郑树 5102021973****0919
钟来平 5129211973****3853
雍先全 5129011961****2911
张登飞 1302811988****005X
丁朝伦 5102321963****6314
何智南 5130011977****0846
丁朝凤 5102321969****6327
管全胜 1326231964****2015
李红林 4209821978****1448
林建勇 5111241977****2617
蒋丙清 3326261966****0011
韦慧宁 4527011961****1325
安德正 3326251976****311X
孟全全 4114221984****0340
杨春玲 3326251958****582X
张刚 5102251976****4930
王桂来 1326231959****4058
胡超 1302811989****0219
郭营营 4104821995****3836
失信被执行人(法人或其他组织)公布
姓名/名称 证件号码
北京远瞻国际教育咨询有限责任公司 55140080-1
北京远瞻国际教育咨询有限责任公司 55140080-1
北京远瞻国际教育咨询有限责任公司 55140080-1
河池市弘农加油站 9145120159****977J
河池市弘农加油站 9145120159****977J
河池市弘农加油站 9145120159****977J
浙江普利金塑胶有限责任公司 79336119-8
河池市弘农加油站 9145120159****977J
河池市弘农加油站 9145120159****977J
北京远瞻国际教育咨询有限责任公司 55140080-1
北京远瞻国际教育咨询有限责任公司 55140080-1
北京德宇辛伏建筑劳务有限公司 59963962-7
[redacted]河百[redacted]集团有限公司 69167076-6
北京益思得瑞智能科技研究院有限公 MA005UR8-3
北京东方易美装饰有限公司 75333755-6
北京大家网教育科技有限公司 78618779-3
重庆市辰坤建设（集团）有限公司 9150011820****8966
北京凯轩建筑工程有限公司 08962733-5
安徽江淮电缆集团有限公司 15371204-1
深圳海斯迪能源科技股份有限公司 67185041-X
查询条件
被执行人姓名/名称: 陈慧
身份证号码/组织机构代码: 150102196706152064
省份: ----------全部----------
验证码: rleq
RLeQ
验证码正确!
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 150102196706152064 相关的结果.


欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 信息公示 > 诚实守信相关荣誉查询
诚实守信相关荣誉查询
查询
查询结果
主体名称
青海泽标建设工程有限公司
记录次数
2
统一社会信用代码
91630100MA759T5Q75


欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 信息公示 > 诚实守信相关荣誉查询
诚实守信相关荣誉查询
李积英
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据

欢迎来到信用中国　　通知公告 | 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示　信用动态　信用立法　政策法规　信用承诺　城市信用　走进信用

首页 > 信息公示 > 诚实守信相关荣誉查询

诚实守信相关荣誉查询

陈慧 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体
重大税收违法失信主体
青海泽标建设工程有限公司
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体
重大税收违法失信主体
李积英
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

陈慧 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 专项查询 > 安全生产严重失信主体名单信息查询（自然人）
安全生产严重失信主体名单信息查询（自然人）
李积英
0022
查询
请输入自然人信息，查询是否存在相关数据



欢迎来到信用中国　　通知公告 | 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾　请输入主体名称或者统一社会信用代码　搜索

信息公示　信用动态　信用立法　政策法规　信用承诺　城市信用　走进信用

首页 > 专项查询 > 安全生产严重失信主体名单信息查询（自然人）

安全生产严重失信主体名单信息查询（自然人）

陈慧　2064　查询



该自然人不存在相关数据




欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 专项查询 > 重点领域查询
拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单
青海泽标建设工程有限公司
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据



欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

李积英 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

欢迎来到信用中国　　通知公告 | 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾　请输入主体名称或者统一社会信用代码　搜索

信息公示　信用动态　信用立法　政策法规　信用承诺　城市信用　走进信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

陈慕　查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据






欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 专项查询 > 重点领域查询
统计严重失信企业名单
青海泽标建设工程有限公司
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


青海泽标建设工程有限公司
6301012258975


青海泽标建设工程有限公司


欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 专项查询 > 重点领域查询
统计严重失信企业名单
李积英
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

统计严重失信企业名单

陈慧 查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据





欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 社会组织严重违法失信名单

社会组织严重违法失信名单

青海泽标建设工程有限公司 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

青海泽标建设工程有限公司 6301012258975

青海泽标建设工程有限公司

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 社会组织严重违法失信名单

社会组织严重违法失信名单

李积英 查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据






欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单
政府采购严重违法失信行为记录名单
青海泽标建设工程有限公司
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


青海泽标建设工程有限公司
6301012258975


青海泽标建设工程有限公司


欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单
政府采购严重违法失信行为记录名单
李积英
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据

欢迎来到信用中国　　通知公告 | 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾　请输入主体名称或者统一社会信用代码　搜索

信息公示　信用动态　信用立法　政策法规　信用承诺　城市信用　走进信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

陈慧　查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据





（https://www.creditchina.gov.cn/）

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫
核验码

法人和非法人组织公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 青海泽标建设工程有限公司

统一社会信用代码： 91630100MA759T5Q75

报告编号： 202507141444293894A32

报告生成日期	2025年07月14日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：202507141444293894A32
生成时间：2025年07月14日 14:44:42

扫一扫
核验码

公共信用信息概览

青海泽标建设工程有限公司

存续　守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91630100MA759T5Q75	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	李积英
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2020-04-07
住所	青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室		

信用信息概要

行政管理	4条	诚实守信	2条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	1条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条

报告生成日期	2025年07月14日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

报告编号：202507141444293894A32
生成时间：2025年07月14日 14:44:42

报告说明

扫一扫
核验码

1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。

4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文

扫一扫
核验码

青海泽标建设工程有限公司

存续 守信激励对象

一、登记注册基础信息

| 基础信息

企业名称：	青海泽标建设工程有限公司
统一社会信用代码：	91630100MA759T5Q75
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	李积英
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：	2020-04-07
住所：	青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

二、行政管理信息 (共 4 条)

| 行政许可

第 1 条

行政许可决定文书号：	青西高路许〔2025〕2号
行政许可决定文书名称：	交通行政许可决定书
许可证书名称：	——
许可类别：	普通
许可编号：	——
许可决定日期：	2025-04-28
有效期自：	2025-04-28
有效期至：	2028-04-28
许可内容：	G0615德马高速K110+360米(下行线右幅)、K115+180米(上行线左幅)处从事增设平面交叉道口
许可机关：	青海省交通运输综合行政执法海西高速支队

许可机关统一社会信用代码：	1263000009160404 43
数据来源单位：	青海省交通运输厅
数据来源单位统一社会信用代码：	11630000015000556M

行政许可

第 2 条

行政许可决定文书号：	﹤青﹥JZ安许证字﹤2020﹥000038
行政许可决定文书名称：	安全生产许可证
许可证书名称：	(青)JZ安许证字[2020]000038
许可类别：	核准
许可编号：	安全生产许可证
许可决定日期：	2023-05-30
有效期自：	2023-05-30
有效期至：	2026-06-04
许可内容：	建筑施工
许可机关：	西宁市行政审批服务局
许可机关统一社会信用代码：	11 100MB0066927D
数据来源单位：	青海省住房和城乡建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	11630000015000564G

行政许可

第 3 条

行政许可决定文书号：	宁市监登字2023第000743号
行政许可决定文书名称：	登记通知书
许可证书名称：	——
许可类别：	其他-变更
许可编号：	——
许可决定日期：	2023-03-31

有效期自：	2023-03-31
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	营业执照
许可机关：	西宁市行政审批服务局
许可机关统一社会信用代码：	11630100MB0Q66927D
数据来源单位：	西宁市行政审批服务局
数据来源单位统一社会信用代码：	11630100MB0Q66927D

行政许可

行政许可决定文书号：	〔宁中税〕许准字〔2020〕第〔676〕号	第 4 条
行政许可决定文书名称：	增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批	
许可证书名称：		
许可类别：	普通	
许可编号：		
许可决定日期：	2020-05-21	
有效期自：	2020-05-21	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	准予行政许可文书内容：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，决定准予你（单位）取得《增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批》	
许可机关：	国家税务总局西宁市城中区税务局第一税务分局(办税服务厅)	
许可机关统一社会信用代码：	116301000150119928	
数据来源单位：	国家税务总局西宁市税务局	
数据来源单位统一社会信用代码：	116301000150119928	

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 2 条)

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	青海泽标建设工程有限公司	第 1 条
纳税人识别号：	91630100MA759T5Q75	
评价年度：	2024	
数据来源：	国家税务总局	

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	青海泽标建设工程有限公司	第 2 条
纳税人识别号：	91630100MA759T5Q75	
评价年度：	2023	
数据来源：	国家税务总局	

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 1 条)

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	63010020200407168227	第 1 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	市场主体登记守信经营信用承诺	
承诺作出日期：	2020-04-07	

承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	西宁市市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11630100MB0U891961

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供


九、其他信息 (共 0 条)


查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

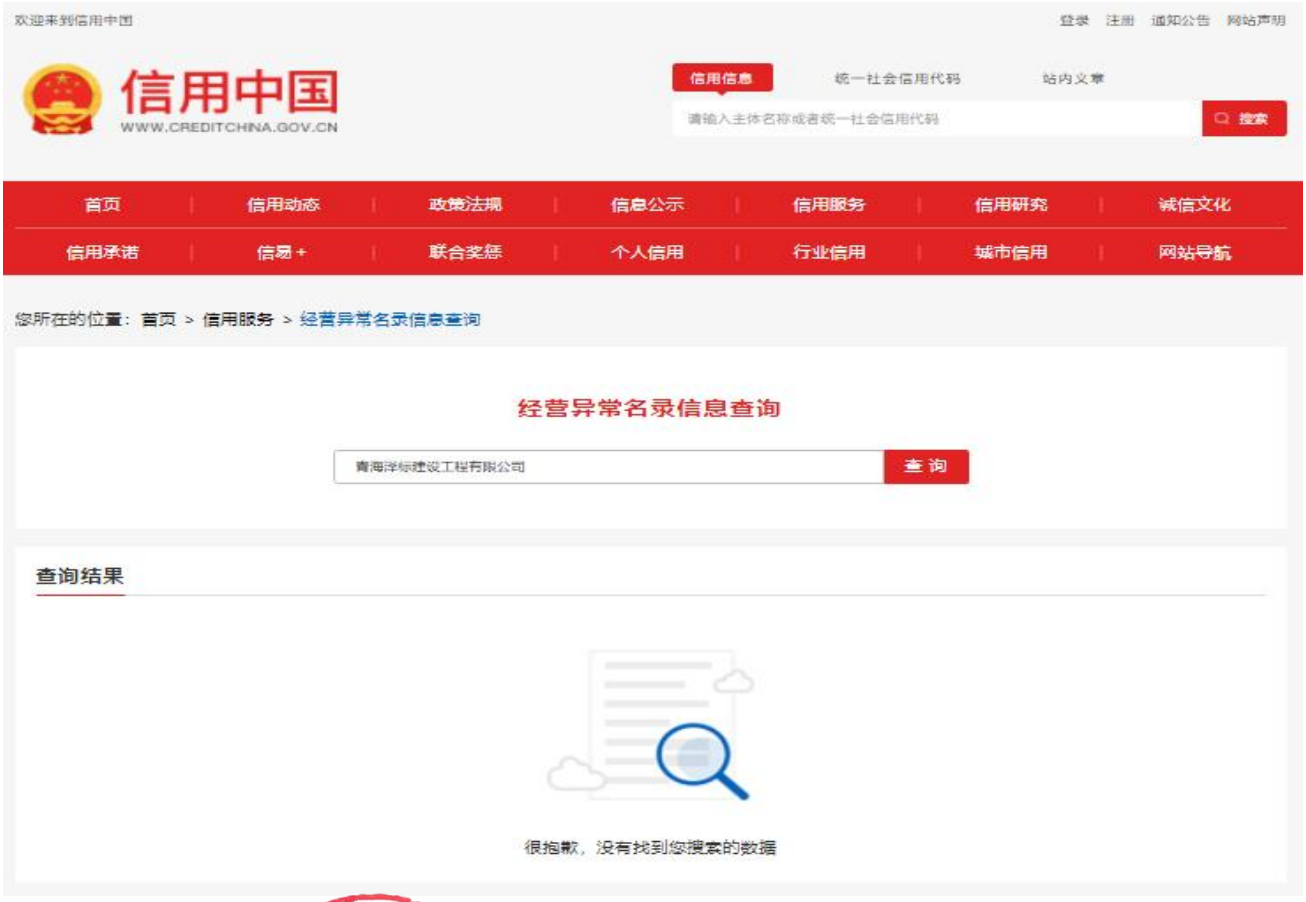
欢迎来到信用中国
登录 注册 通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
站内文章
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航
您所在的位置：首页 > 信用服务 > 经营异常名录信息查询
经营异常名录信息查询
青海洋标建设工程有限公司
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据

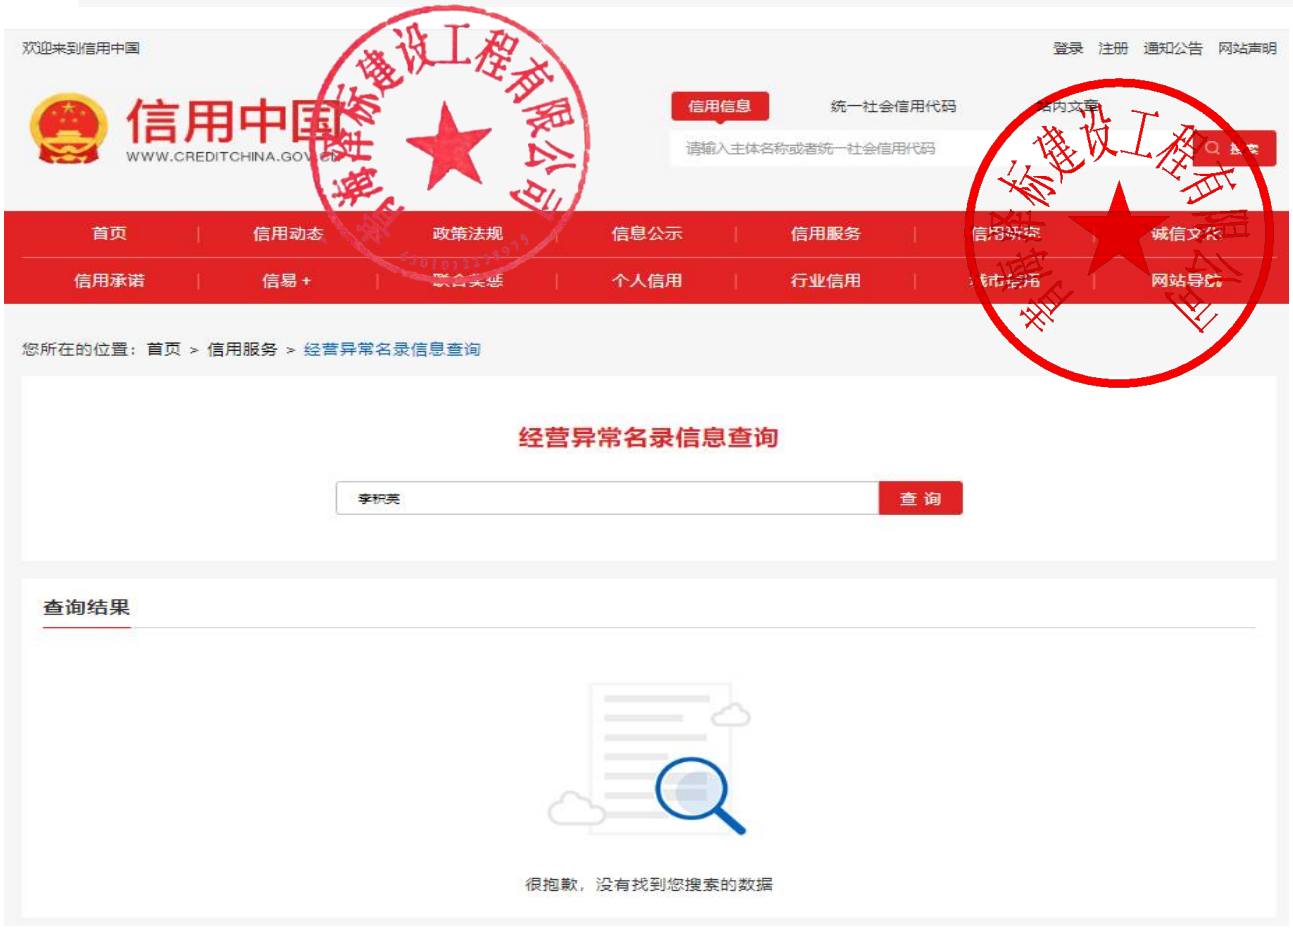
欢迎来到信用中国
登录 注册 通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
站内文章
请输入主体名称或者统一社会信用代码
首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 诚信文化
信用承诺 信易+ 个人信用 行业信用 网站导航
您所在的位置：首页 > 信用服务 > 经营异常名录信息查询
经营异常名录信息查询
李积芙
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据

重大税收违法案件管网查询

（http://qinghai.chinatax.gov.cn/web/zdsswfsxaj/zdaj.shtml）



中国政府采购网查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）




青海政府采购网查询

（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list?utm=sites_group_front.2ef5001f.0.0.7e104b20f2a711ecaff675ae6d179a62）



全国建筑市场监管公共服务平台（公司）

http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company?complexname=%E9%9D%92%E6%B5%B7%E6%B3%BD%E6%A0%87%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8

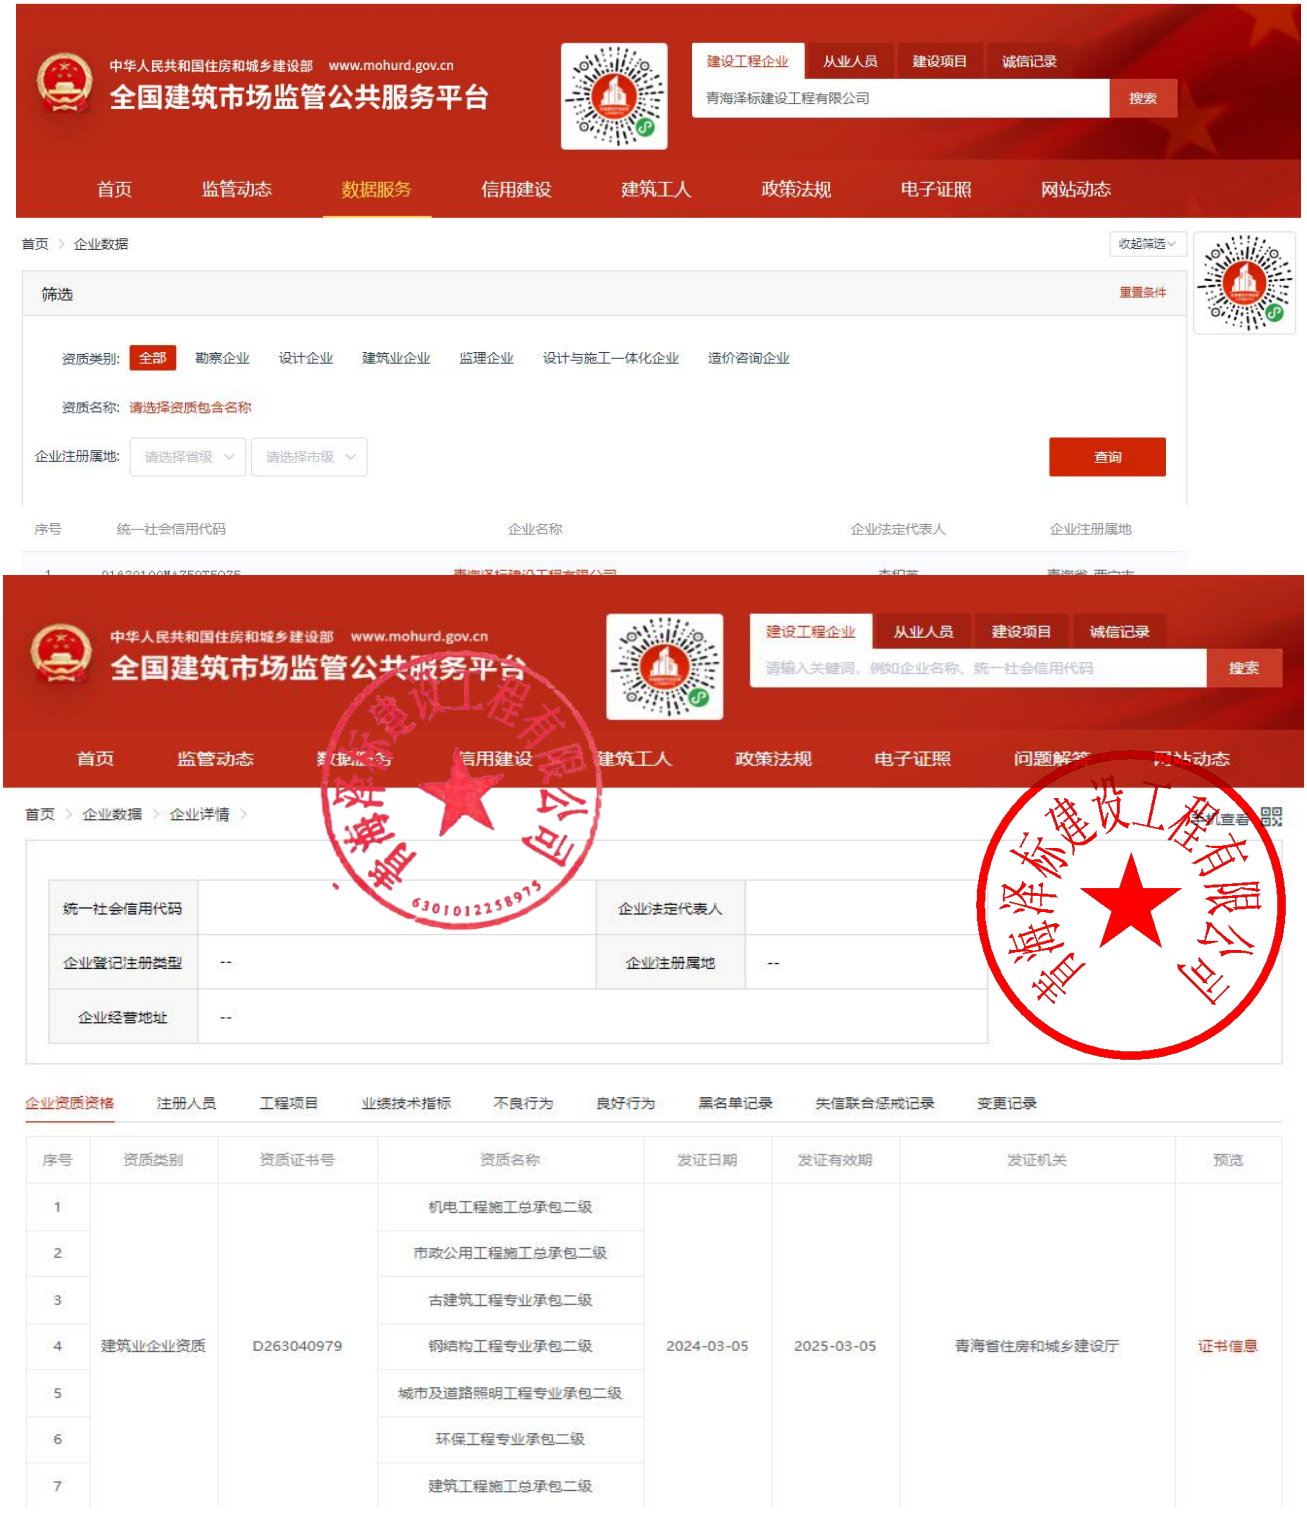


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
网站动态
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
青海泽标建设工程有限公司
青海省-西宁市
统一社会信用代码
91630100MA759T5Q75
企业法定代表人
李积英
企业登记注册类型
有限责任公司（自然人投资或控股）
企业注册属地
青海省-西宁市
企业经营地址
城中区南川东路85号40号楼2单元261室
企业资质资格
注册人员
工程项目
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
诚信记录主体及编号
决定内容
实施部门
决定日期与有效期
操作
暂无数据

建设工程企业
从业人员
建设项目
搜索
首页
监管动态
信用建设
建筑工人
政策法规
网站动态
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
青海泽标建设工程有限公司
青海省-西宁市
统一社会信用代码
91630100MA759T5Q75
企业法定代表人
李积英
企业登记注册类型
有限责任公司（自然人投资或控股）
企业注册属地
青海省-西宁市
企业经营地址
城中区南川东路85号40号楼2单元261室
企业资质资格
注册人员
工程项目
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
黑名单记录主体及编号
黑名单认定依据
认定部门
决定日期与有效期
暂无数据



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
网站动态
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
青海泽标建设工程有限公司
青海省-西宁市
统一社会信用代码
91630100MA759T5Q75
企业法定代表人
李积英
企业登记注册类型
有限责任公司（自然人投资或控股）
企业注册属地
青海省-西宁市
企业经营地址
城中区南川东路85号40号楼2单元261室
矿建小区
南川东路85号院
中油燃气CNG加气站
企业资质资格
注册人员
工程项目
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
失信记录编号
失信联合惩戒记录主体
法人姓名
列入名单事由
认定部门
列入日期
暂无数据


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
网站动态
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
青海泽标建设工程有限公司
青海省-西宁市
统一社会信用代码
91630100MA759T5Q75
企业法定代表人
李积英
企业登记注册类型
有限责任公司（自然人投资或控股）
企业注册属地
青海省-西宁市
企业经营地址
城中区南川东路85号40号楼2单元261室
矿建小区
南川东路85号院
中油燃气CNG加气站
企业资质资格
注册人员
工程项目
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
暂无数据

青海省工程建设监管合信用管理平台查询

（http://139.170.150.135/asite/cloud/index）




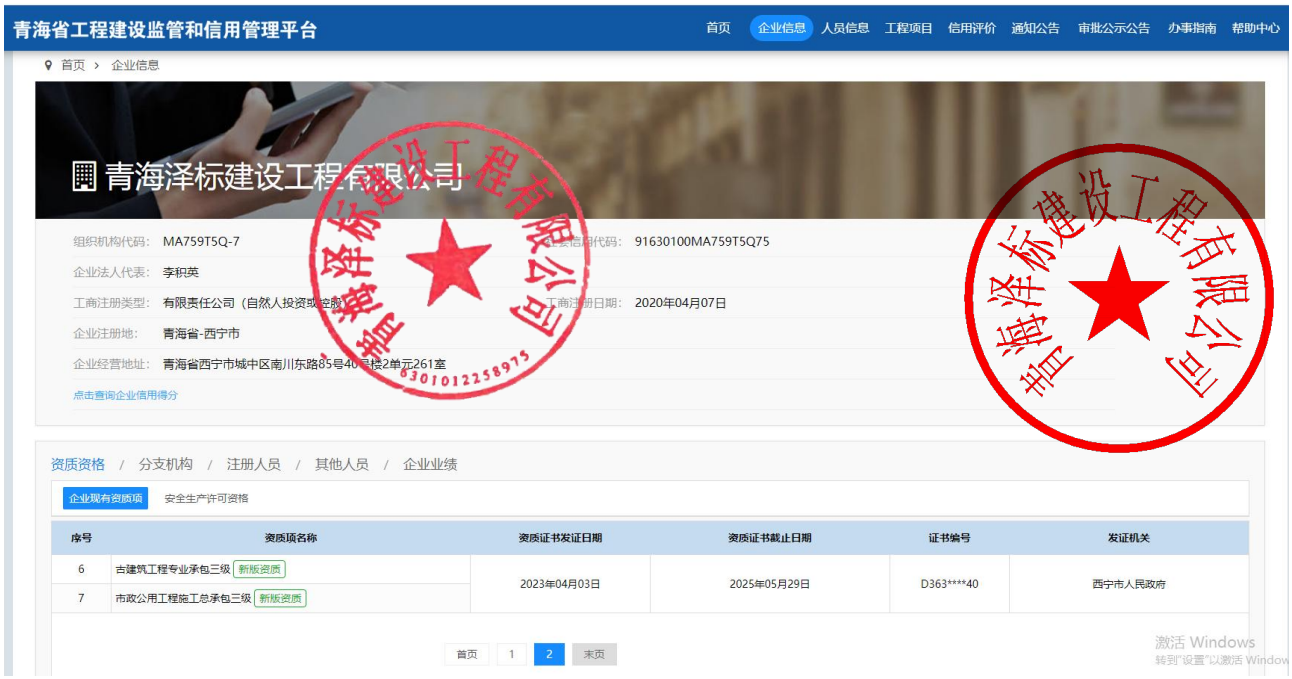



青海省工程建设监管和信用管理平台
首页
企业信息
人员信息
工程项目
信用评价
通知公告
审批公示公告
办事指南
帮助中心
首页 › 企业信息
青海泽标建设工程有限公司
组织机构代码： MA759T5Q-7
社会信用代码： 91630100MA759T5Q75
企业法人代表： 李积英
工商注册类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
工商注册日期： 2020年04月07日
企业注册地： 青海省-西宁市
企业经营地址： 青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室
点击查询企业信用得分
资质资格 / 分支机构 / 注册人员 / 其他人员 / 企业业绩
企业现有资质项
安全生产许可资格
安许证编号： （青）JZ安许证字[2020]000038
企业法定代表人： 李积英
有效期截止： 2023年06月04日
许可内容： 建筑施工
发证日期： 2023年04月03日
发证机关： 西宁市行政审批服务局
有效
激活 Windows


青海泽标建设工程有限公司
6301012258975


青海泽标建设工程有限公司


青海工程建设云 （青海省工程建设监管和信用管理平台）
返回首页
企业信用公示
Enterprise Credit Publicity
良好信用
不良信用
守信激励
企业名称：
青海泽标建设工程有限公司
企业类型：
施工企业
重置
立即查询
序号
企业名称
指标名称
信用分值
生效日期
暂无数据

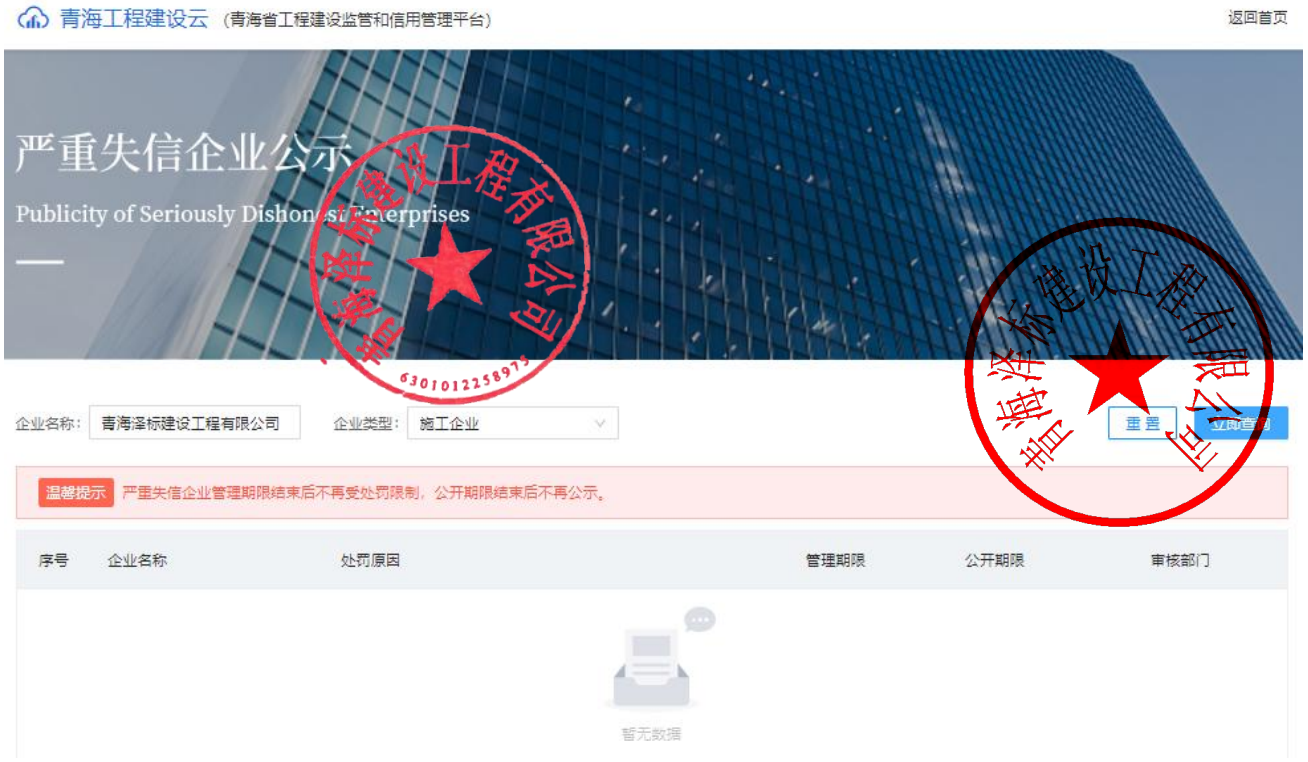
青海工程建设云 （青海省工程建设监管和信用管理平台）
返回首页
严重失信企业公示
Publicity of Seriously Dishonest Enterprises
企业名称：
青海泽标建设工程有限公司
企业类型：
施工企业
重置
温馨提示
严重失信企业管理期限结束后不再受处罚限制，公开期限结束后不再公示。
序号
企业名称
处罚原因
管理期限
公开期限
审核部门
暂无数据

青海工程建设云（青海省工程建设监管和信用管理平台）

返回首页

企业信用信息展示

Enterprise credit information display

企业名称：青海泽标建设工程有限

企业类型：施工企业

重置 立即查询

温馨提示 本省企业可直接查询信用分，外省企业需完成进青登记业务办理，1-2日才可查询到信用分值；
进青登记无效：可登录企业服务平台（新系统）办理进青登记业务或进青登记信息延续业务恢复进青登记正常状态；
资质无效：可登录企业服务平台（新系统）查看企业资质信息详情，根据不可用原因办理对应业务恢复资质正常状态。

序号	企业名称	企业类型	行政区划	上月末信用分值	当前信用分值
1	青海泽标建设工程有限公司	施工企业	青海省-西宁市	99分	96分

< 1 >

青海工程建设云（青海省工程建设监管和信用管理平台）

返回首页

青海泽标建设工程有限公司 施工企业

社会信用代码 91630100MA759T5Q75

企业成立日期 2020-04-07

企业注册地址 青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

企业法人代表 李积英

工商注册类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

企业注册区划 青海省-西宁市

2025年07月14日 15:00:24

96.00
当前信用分值

99.00
上月末信用分值

企业信用

全部 良好信用 一般信用 严重失信

序号	信用编号	生效截止日期	信用行为

青海工程建设云（青海省工程建设监管和信用管理平台）

返回首页

青海泽标建设工程有限公司 施工企业

社会信用代码 91630100MA759T5Q75
企业成立日期 2020-04-07
企业注册地址 青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

企业法人代表 李积英
工商注册类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
企业注册区划 青海省-西宁市

2025年07月14日 15:00:35

96.00	99.00
当前信用分值	上月末信用分值

企业信用

全部 良好信用 不良信用 严重失信

序号	信用编号	生效截止日期	信用行为

暂无数据

青海工程建设云（青海省工程建设监管和信用管理平台）

返回首页

青海泽标建设工程有限公司 施工企业

社会信用代码 91630100MA759T5Q75
企业成立日期 2020-04-07
企业注册地址 青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室

企业法人代表 李积英
工商注册类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
企业注册区划 青海省-西宁市

2025年07月14日 15:00:47

96.00	99.00
当前信用分值	上月末信用分值

企业信用

全部 良好信用 不良信用 严重失信

序号	信用编号	生效截止日期	信用行为

暂无数据

附件 10：投标保证金证明（若为保函格式自拟）

投标保证金证明

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

我方为（青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育））项目（采购项目编号为：青海鼎新公招（货物）2025-017；投标包号：（包六）递交保证金人民币 200000.00 元（大写：人民币**贰拾万元整**元）已于 2025 年 07 月 15 日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明、开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户　名：**青海泽标建设工程有限公司**

开户银行：**中国建设银行股份有限公司西宁上尕庄支行**

开户帐号：**63050137360700000179**

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李积英（签字或盖章）

2025年07月15日

保证金保函

政道担保
ZHENG DAO DAN BAO

投标保函

保函编号：ZDBH250714451548
查询编号：OY5EE96

致：玛沁县自然资源和林业草原局（受益人）

鉴于青海泽标建设工程有限公司（下称“投标人”）参加项目编号为青海鼎新公招（货物）2025-017 的青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六的投标。根据招标文件的规定，投标人须按规定的金额出具一份投标保函（下称“保函”）作为履行招标文件中规定的义务担保。

一、我司同意为投标人出具人民币（大写）贰拾万元整（小写）¥200,000.00 元的保函，作为向受益人的投标担保。本保函的条件是：如因投标人原因发生招标文件规定的投标保证金不予退还的情况，由出具保函的机构向受益人足额支付投标保证金。

二、因本担保发生的纠纷，可经双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向我司所在地人民法院提起诉讼。

三、我司提供的保证为一般责任保证，保证在收到受益人的书面要求，说明其索款是由于出现了上述任何一种原因的具体情况后，即凭受益人出具的索赔款凭证，向受益人支付上述款项。

四、本保函担保的保证期间为该工程的投标有效期（或延长的投标有效期）后 90 日（含 90 日），延长投标有效期无须通知我司，任何索款要求应在上述期限内交到我司。受益人延长投标文件有效期的决定，应通知我司。

担保人 ：广东省政道担保有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地　　址：惠州市惠阳区淡水东华大道和白云路交汇处诚杰国际商业中心 A 幢 21 层 06 号

邮 政 编 码：516000

电　话：0752-3556001　　传　真：0752-3556001

2025 年 07 月 14 日

保函真伪查询码

<u>基本存款账户信息</u>

基本存款账户信息

账户名称：　青海泽标建设工程有限公司

账户号码：　63050137360700000179

开户银行：　中国建设银行股份有限公司西宁上尕庄支行

法定代表人：
（单位负责人）　李积英

基本存款账户编号：J8[illegible]0014043503

建行西宁上尕庄支行

2023 年 09 月 15 日

（投标文件封面）

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合审查部分）

采购项目编号：青海鼎新公招（货物）2025-017

采购项目名称：青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育）

投 标 包 号：包六

投标单位：青海泽标建设工程有限公司（盖章）

2025 年 07 月 15 日

目录

附件 11：报价一览表……291

附件 12：分项报价表……292

附件 13：技术规格响应表……296

附件 14：投标产品相关资料……302

附件 15：投标人类似业绩证明材料……309

附件 16：中小企业声明函……372

附件 17：残疾人福利性单位声明函……374

附件 18：监狱企业证明资料（不属于监狱企业的无需提供）……375

附件 19：项目管理实施方案……376

附件 20：投标人认为在其他方面有必要说明的事项……500

附件 11：报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：青海泽标建设工程有限公司 **单位：人民币(元)**

项目名称（包号）	投标总报价	交 货（工） 期	交货地点	备注
青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025)退化草原修复工程（围栏封育)包六	大写：壹仟零玖拾陆万玖仟玖佰肆拾陆元整 小写：10969946.00 元	120（具体按合同约定执行）	拉加镇、东倾沟乡、雪山乡	/
其他承诺及需要说明的事项：保质保量的完成工作				

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2. 投标总报价包括产品费、安装费、施工费、人工费、机械费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

3. “交货（工）期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5. 投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6. 投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：青海泽标建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李积英（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

附件 12：分项报价表

分项报价表

投标单位名称：青海泽标建设工程有限公司

包号： 包六 **单位：人民币（元）**

序号	项目实施服务内容	产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	合计	备注
一	封育围栏	围栏采购及安装	/	/	/	/	/	/	/
1	封育围栏	围栏网片	91L8/110/50	青海泽标建设工程有限公司	646090.3	米	2.00 元	1292180.6 元	/
2	封育围栏	小立柱	尺寸长度：2007mm；热轧等边角钢（40.3×40.1×4.2）mm	青海泽标建设工程有限公司	60944	根	7.30 元	444891.2 元	/
3	封育围栏	中间柱	尺寸长度：2159mm；热轧等边角钢（ 70.1×70.1×7.0）mm	青海泽标建设工程有限公司	1615	根	25.00 元	40375.00 元	/
4	封育围栏	大立柱	尺寸长度：2153mm；热轧等边角钢（90.0×90.2×8.1）mm	青海泽标建设工程有限公司	2052	根	37.00 元	75924.00 元	/
5	封育围栏	支撑杆	尺寸长度：3010mm；电焊钢管（50.2）mm	青海泽标建设工程有限公司	6591	根	36.00 元	237276.00 元	/
6	封育围栏	双扇门	围栏门的框架采用 GB/T13793 中 φ25 的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构，单扇高为 1300 毫米，宽为 1500 毫米；原材料采用 30×3 毫米扁铁，40×40×4 毫米角钢，1.5 毫米钢板；围栏门的扁铁间距为 150 毫米；围栏门应焊接牢固，焊缝平整，无烧伤和虚焊；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。	青海泽标建设工程有限公司	218	付	36.00 元	7848.00 元	/

7	封育围栏	门柱	尺寸长度：2153mm；热轧等边角钢（90.2×90.1×8.1）mm	青海泽标建设工程有限公司	436	根	35.50 元	15478.00 元	/
8	封育围栏	地锚	尺寸长度：604mm；热轧等边角钢（40.3×40.2×4.1）mm	青海泽标建设工程有限公司	872	根	5.00 元	4360.00 元	/
9	封育围栏	镀锌拉丝	围栏顶部刺丝换成直径为 2.8 毫米的镀锌钢丝。抗拉强度应达到 1413MPa，锌层重量（热镀锌为 90g/m²，电镀锌为 47g/m²）。	青海泽标建设工程有限公司	646090.3	米	4.20 元	2713579.26 元	/
10	封育围栏	下拉柱	尺寸长度：604mm；热轧等边角钢（40.2×40.0×4.0）mm	青海泽标建设工程有限公司	12922	根	6.25 元	80762.50 元	/
11	封育围栏	绑钩	绑钩的材料应为抗拉强度为 475MPa。直径为 2.52 毫米的镀锌钢丝，每根长度 203 毫米。	青海泽标建设工程有限公司	581499	根	0.50 元	290749.50 元	/
12	封育围栏	挂钩	挂钩的材料应为抗拉强度为 475Mpa。直径为 2.52 毫米的镀锌钢丝，每根长度 203 毫米。	青海泽标建设工程有限公司	129217	根	0.50 元	64608.50 元	/
13	封育围栏	拉线	镀锌钢丝	青海泽标建设工程有限公司	5232	米	6.00 元	31392.00 元	/
14	封育围栏	网围栏安装	/	青海泽标建设工程有限公司	646090.3	米	8.00 元	5168722.40 元	/
15	封育围栏	运输费	/	青海泽标建设工程有限公司	1	/	501800.00 元	501020.00 元	/
投标总价		10969946.00 元							

注：1.本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3. 各投标人按照采购需求填写。

投标单位：青海泽标建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李帆英（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

附件 13：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称：青海经标建设工程有限公司

包号：包六

序号	招标文件产品技术参数、指标			投标产品技术参数、指标			
	产品名称	技术参数	数量	产品名称	技术参数	数量	偏离
	网围栏	一、封育围栏建设技术方案 1. 设计思路 围栏封育 385 万米，根据各项目户退化草地面积、草原生态补助奖励政策禁牧区草畜平衡区的划定、地形状况、牧户草场分界情况，按照实际需求，在草畜平衡区围建围栏封育。 在每个围建单元门上要标明项目名称、标段号、围栏长度、施工单位名称等； 每个围建单元通过四至界线航点或航迹定位，确定围栏长度。 2. 围栏建设标准 围栏材料、基本参数与施工安装均参照《编结网围栏》(JB/T 7138-2010）、《镀锌钢丝围栏网基本参数》（JB/T 7137-2007）、《编结网围栏架设规范》(JB/T 10129-2014)编结网围栏的规格（网片为缠绕式）、基本参数、 技术要求和检验规则执行。 2.1 编结网 网围栏选用 91L8×110×50 型编结网网围栏，编结网的规格及参数应符合下表规定。 表 5.2-1 编结网网围栏的规格及技术参数 单位：mm	646090.3 米	网围栏	我公司完全响应招标文件；服务期限：120（具体按合同约定执行）；建设地点：拉加镇、东倾沟乡；简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：围栏采购及安装 646090.3 米（详见招标文件内容）网围栏具体参数如下： 一、封育围栏建设技术方案 1. 设计思路 围栏封育 385 万米，根据各项目户退化草地面积、草原生态补助奖励政策禁牧区草畜平衡区的划定、地形状况、牧户草场分界情况，按照实际需求，在草畜平衡区围建围栏封育。 在每个围建单元门上要标明项目名称、标段号、围栏长度、施工单位名称等； 每个围建单元通过四至界线航点或航迹定位，确定围栏长度。 2. 围栏建设标准 围栏材料、基本参数与施工安装均参照《编结网围栏》（JB/T 7138-2010）、《镀锌钢丝围栏网基本参数》（JB/T 7137-2007）、《编结网围栏架设规范》（JB/T 10129-2014）编结网围栏的规格（网片为缠绕式）、基本参数、 技术要求和检验规则执行。 2.1 编结网 网围栏选用 91L8×110×50 型编结网网围栏，编结网的规格及参数应符合下表规定。 表 5.2-1 编结网网围栏的规格及技术参数 单位：mm	646090.3 米	0 偏离

规格	纬线根数	网宽公称尺寸	经线间距	钢丝公称直径			自上而下相邻两纬线间距
				边纬线	中纬线	经线	
91L8/110/50	8	1100	500	2.8	2.5	2.5	200、180、180、150、130、130、130

自上而下第四根纬线为直径 2.8 毫米的钢丝。

编结网的具体技术要求须满足《编结网围栏》（JB/T 7138-2010）的相关技术要求。

2.2 钢丝

考虑到网围栏刺丝对野生动物生存具有一定的威胁，将围栏顶部刺丝换成直径为 2.8 毫米的镀锌钢丝。抗拉强度应达到 900~1500MPa，锌层重量（热镀锌不小于 90g/m2，电镀锌不少于 45g/m2）。

2.3 支撑件

钢制支撑件的规格及参数应符合下表规定。

表 5.2-2 支撑件的规格及技术参数

名称	尺寸长度≥mm	材料规格 mm
大立柱、门柱、角柱	2000	热轧等边角钢 90×90×8
中间柱	2000	热轧等边角钢 70×70×7
小立柱	2000	热轧等边角钢 40×40×4
地锚、下立柱	600	热轧等边角钢 40×40×4
支撑杆	3000	电焊钢管 50
小立柱横梁	200	热轧等边角钢 40×40×4

支撑件的具体技术要求须满足《编结网围栏》（JB/T 7138-2010）的相关技术要求。支撑件表面应统一涂绿色防锈漆，确保涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。

2.4 连接件

（1）绑钩：绑钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa。直径为 2.50 毫米的镀锌钢丝，每根长度 200 毫米。

（2）挂钩：挂钩的材料应为抗拉强度不低于 350Mpa。直径为 2.50 毫米的镀锌钢丝，每根长度 200 毫米。每 10

规格	纬线根数	网宽公称尺寸	经线间距	钢丝公称直径			自上而下相邻两纬线间距
				边纬线	中纬线	经线	
91L8/110/50	8	1100	500	2.8	2.5	2.5	200、180、180、150、130、130、130

自上而下第四根纬线为直径 2.8 毫米的钢丝。

编结网的具体技术要求须满足《编结网围栏》（JB/T 7138-2010）的相关技术要求。

2、钢丝

考虑到网围栏刺丝对野生动物生存具有一定的威胁，将围栏顶部刺丝换成直径为 2.8 毫米的镀锌钢丝。抗拉强度应达到 1413MPa，锌层重量（热镀锌为 90g/m²，电镀锌为 47g/m²）。

3、支撑件

钢制支撑件的规格及参数应符合下表规定。

表 5.2-2 支撑件的规格及技术参数

名称	尺寸长度 mm	材料规格 mm
大立柱、门柱、角柱	2153	热轧等边角钢 90. ×90. 2×8. 1
中间柱	2159	热轧等边角钢 70. 1×70. 1×7. 0
小立柱	2007	热轧等边角钢 40. 3×40. 1×4. 2
地锚、下立柱	604	热轧等边角钢 40. 2×40. 0×4. 0
支撑杆	3010	电焊钢管 50. 2
小立柱横梁	208	热轧等边角钢 40. 1×40. 0×4. 2

支撑件的具体技术要求须满足《编结网围栏》（JB/T 7138-2010）的

米 2 个。

2.5 围栏门

围栏门的框架采用 GB/T13793 中φ25 的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构,单扇高为 1300 毫米,宽为 1500 毫米；原材料采用 30×3 毫米扁铁，40×40×4 毫米角钢，1.5 毫米钢板；围栏门的扁铁间距为 150 毫米；围栏门应焊接牢固，焊缝平整，无烧伤和虚焊；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。

围栏门的具体技术要求须满足《编结网围栏》（JB/T 7138-2010）的相关技术要求。

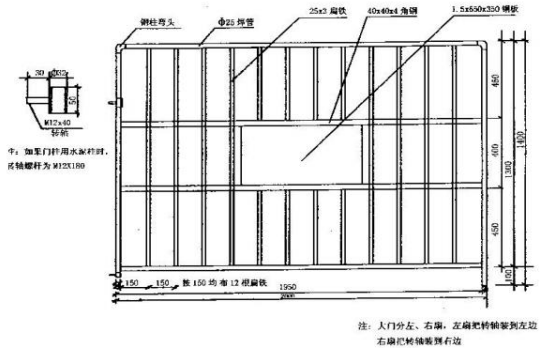


图 5.2-1 网围栏配套大门

3. 标志、包装、运输及贮存要求

（1）每卷编结网、钢丝应有标牌，标牌上应注明：

a. 制造厂名、厂址；

b. 产品名称；

c. 产品规格及标记；

d. 生产日期及出厂编号；

e. 执行标准。

（2）编结网卷外径不得大于 500mm，用直径不小于 2.0mm 的钢丝捆绑牢固，钢丝头不得外翘。

（3）钢制小立柱每 5~10 根一捆，用直径不小于 2.0mm 的

相关技术要求。支撑件表面应统一涂绿色防锈漆，确保涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。

2.4、连接件

（1）绑钩：绑钩的材料应为抗拉强度为 475MPa。直径为 2.52 毫米的镀锌钢丝，每根长度 203 毫米。

（2）挂钩：挂钩的材料应为抗拉强度为 475Mpa。直径为 2.52 毫米的镀锌钢丝，每根长度 203 毫米。每 10 米 2 个。

2.5、围栏门

围栏门的框架采用 GB/T13793 中φ25 的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构，单扇高为 1300 毫米，宽为 1500 毫米；原材料采用 30×3 毫米扁铁，40×40×4 毫米角钢，1.5 毫米钢板；围栏门的扁铁间距为 150 毫米；围栏门应焊接牢固，焊缝平整，无烧伤和虚焊；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。

围栏门的具体技术要求须满足《编结网围栏》（JB/T 7138-2010）的相关技术要求。

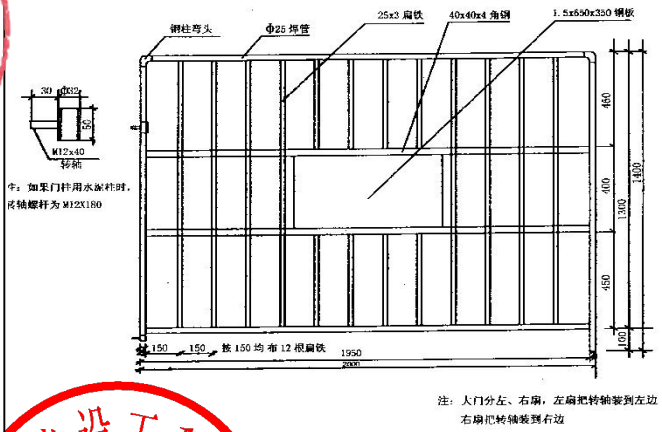


图 5.2-1 网围栏配套大门

3. 标志、包装、运输及贮存要求

（1）每卷编结网、钢丝应有标牌，标牌上应注明：

a. 制造厂名、厂址；

		钢丝捆绑牢固。 （4）大立柱、门柱应喷写生产企业名称、生产日期、项目名称及标段号、建设日期。 （5）围栏门的标志：左边为产品名称、生产单位、执行标准、生产日期，右边为项目名称及标段号、建设单位名称、施工单位名称、建设年月。 （6）挂钩、绑钩应入袋包装，袋口封闭良好。 （7）网围栏出厂时。应附下列文件： a. 产品合格证书； b. 安装说明书。 （8）运输及贮存时应避免与酸碱盐类物质接触。 （9）运输及贮存时应就地码放整齐。 4. 围栏施工安装 4.1 一般规定 （1）所有零部件必须检验合格，外购件必须有合格证明方可安装。 （2）网围栏的施工安装应参照《编结网围栏架设规范》（JB/T 10129-2014）以及本设计相关要求执行。 （3）施工人员应最受有关安全要求及劳动保护规定，工作时穿工作服并佩戴安全帽、防护手套、防护靴。 （4）不应使用拖拉机或其他机动车辆张紧编结网和镀锌钢丝。 4.2 围栏架设准备 （1）对围栏场地进行勘测，结合现场情况，按设计要求确定围栏线路及施工方案，围栏建设安装时必须留有野生动物迁徙通道或牧道。 （2）备好施工工具及安全保护用品，熟悉并掌握各类施工工具的结构特点及使用方法。 （3）清理围栏线路上的障碍物。 4.3 围栏定线			b. 产品名称； c. 产品规格及标记； d. 生产日期及出厂编号； e. 执行标准。 （2）编结网卷外径不得大于 500mm，用直径不小于 2.0mm 的钢丝捆绑牢固，钢丝头不得外翘。 （3）钢制小立柱每 5~10 根一捆，用直径不小于 2.0mm 的钢丝捆绑牢固。 （4）大立柱、门柱应喷写生产企业名称、生产日期、项目名称及标段号、建设日期。 （5）围栏门的标志：左边为产品名称、生产单位、执行标准、生产日期，右边为项目名称及标段号、建设单位名称、施工单位名称、建设年月。 （6）挂钩、绑钩应入袋包装，袋口封闭良好。 （7）网围栏出厂时。应附下列文件： a. 产品合格证书； b. 安装说明书。 （8）运输及贮存时应避免与酸碱盐类物质接触。 （9）运输及贮存时应就地码放整齐。 4. 围栏施工安装 4.1 一般规定 （1）所有零部件必须检验合格，外购件必须有合格证明方可安装。 （2）网围栏的施工安装应参照《编结网围栏架设规范》（JB/T 10129-2014）以及本设计相关要求执行。 （3）施工人员应最受有关安全要求及劳动保护规定，工作时穿工作服并佩戴安全帽、防护手套、防护靴。 （4）不应使用拖拉机或其他机动车辆张紧编结网和镀锌钢丝。 4.2 围栏架设准备 （1）对围栏场地进行勘测，结合现场情况，按设计要求确定围栏线路及施工方案，围栏建设安装时必须留有野生动物迁徙通道或牧道。		

		（1）平地定线 在围栏地块的线路两端各设一标桩，从起始点每隔 30m 各设一标桩，全线标桩完成后应连成直线。 （2）起伏地段定线 在围栏地块的线路两端各设一标桩，定准方位。中间遇小丘或凹地时，应按地形的复杂程度增设标桩，要求能同时观察到三个标桩并使各标桩连成直线。 4.4 立柱设置与安装 （1）配套网围栏根据地形平均 10 米设 1 根小立柱，平均每 400 米应设 1 根中立柱，每个单元拐角处或直线平均每隔 1000m 设 1 根大立柱； （2）在围栏线路的走向发生变化时，若围栏线路形成的最小夹角不大于 120 度时，应安装角柱，大于 120 度时应安装中间柱； （3）各种立柱应埋设牢固，与地面垂直，埋入地下部分不得少于 0.6 米。 （4）每根大立柱或角柱至少安装 2 根支撑杆，每根中间柱至少安装 1 根支撑杆，支撑杆的支撑方向应与围栏线路的方向一致。支撑杆的尾部翼板应完全埋入地下，并复土夯实。拧紧支撑杆与中间柱或角柱的联接螺栓。 （5）中间柱、小立柱安装后应与水平面垂直，在柱子高出地面部分的 1000mm 内，小立柱的倾斜应小于 50mm；中间柱倾斜应小于 10mm；角柱向外倾斜应小于 50mm。 4.5 围栏架设 （1）施工程序：固定门柱、角柱和中立柱，展开网片一固定起始端一专用 张紧器固定一夹紧纬线一实施张紧一绑扎固定网片一移至下一个网片段施工。 （2）从中间柱的一端开始，沿围栏线路铺放编结网，将编结网铺在围栏路线的内侧。铺放时应使编结网的纬线间距			（2）备好施工工具及安全保护用品，熟悉并掌握各类施工工具的结构特点及使用方法。 （3）清理围栏线路上的障碍物。 4.3 围栏定线 （1）平地定线 在围栏地块的线路两端各设一标桩，从起始点每隔 30m 各设一标桩，全线标桩完成后应连成直线。 （2）起伏地段定线 在围栏地块的线路两端各设一标桩，定准方位。中间遇小丘或凹地时，应按地形的复杂程度增设标桩，要求能同时观察到三个标桩并使各标桩连成直线。 4.4 立柱设置与安装 （1）配套网围栏根据地形平均 10 米设 1 根小立柱，平均每 400 米应设 1 根中立柱，每个单元拐角处或直线平均每隔 1000m 设 1 根大立柱； （2）在围栏线路的走向发生变化时，若围栏线路形成的最小夹角不大于 120 度时，应安装角柱，大于 120 度时应安装中间柱； （3）各种立柱应埋设牢固，与地面垂直，埋入地下部分不得少于 0.6 米。 （4）每根大立柱或角柱至少安装 2 根支撑杆，每根中间柱至少安装 1 根支撑杆，支撑杆的支撑方向应与围栏线路的方向一致。支撑杆的尾部翼板应完全埋入地下，并复土夯实。拧紧支撑杆与中间柱或角柱的联接螺栓。 （5）中间柱、小立柱安装后应与水平面垂直，在柱子高出地面部分的 1000mm 内，小立柱的倾斜应小于 50mm；中间柱倾斜应小于 10mm；角柱向外倾斜应小于 50mm。 4.5 围栏架设 （1）施工程序：固定门柱、角柱和中立柱，展开网片一固定起始端一专用 张紧器固定一夹紧纬线一实施张紧一绑扎固定网片一移至下一个网片		

小的一端靠向立柱，起始端留 50mm~80 mm 编结网。

（3）编结网的一端剪去一根经线，将编结网竖起，把每一根纬线线端与起始中间柱绑扎牢固，并使下边纬线与地面之间的距离不大于 150mm。

（4）每铺放围栏网到下一个中间柱时，均将编结网竖起并初步固定。若将两部分编结网连接在一起须用围栏线绞结器接头。

（5）安装张紧器张紧围栏，各纬线张紧力为 700N~900N，整片围栏受力应均匀。

（6）将围栏另一端相对中间柱的位置除去一根经线，自中纬线分别向上向下将每根纬线分别绕中间柱绞紧。

（7）将编结网自边纬线向中间逐一绑扎在立柱上，编结网的每根纬线均应与立柱绑结牢固，所有的紧固件不得松动。




图 5.4-1 网围栏拉设安装示意图

4.6 围栏门安装

（1）围栏门位置可根据牧户要求设置，在地势平坦处安装围栏门；大门应安装牢固，转动灵活。

（2）门柱的安装方法与角柱相同。每个门柱至少安装 2 根支撑杆以及 2 套拉线、地锚。

（3）在每个围建单元门上，左边为产品名称、生产单位、执行标准、生产日期，右边为项目名称及标段号、建设单位名称、施工单位名称、建设年月。

5.后期管护

按照谁受益、谁管护的原则，对建设后的围栏进行移交，

段施工。

（2）从中间柱的一端开始，沿围栏线路铺放编结网，将编结网铺在围栏路线的内侧。铺放时应使编结网的纬线间距小的一端靠向立柱，起始端留 50mm~80 mm 编结网。

（3）编结网的一端剪去一根经线，将编结网竖起，把每一根纬线线端与起始中间柱绑扎牢固，并使下边纬线与地面之间的距离不大于 150mm。

（4）每铺放围栏网到下一个中间柱时，均将编结网竖起并初步固定。若将两部分编结网连接在一起须用围栏线绞结器接头。

（5）安装张紧器张紧围栏，各纬线张紧力为 700N~900N，整片围栏受力应均匀。

（6）将围栏另一端相对中间柱的位置除去一根经线，自中纬线分别向上向下将每根纬线分别绕中间柱绞紧。

（7）将编结网自边纬线向中间逐一绑扎在立柱上，编结网的每根纬线均应与立柱绑结牢固，所有的紧固件不得松动。

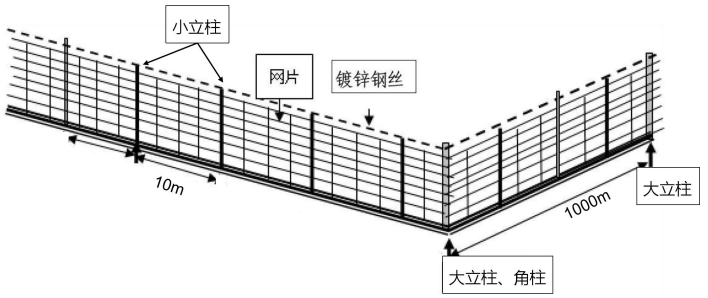


图 5.4-1 网围栏拉设安装示意图

4.6 围栏门安装

（1）围栏门位置可根据牧户要求设置，在地势平坦处安装围栏门；大门应安装牢固，转动灵活。

（2）门柱的安装方法与角柱相同。每个门柱至少安装 2 根支撑杆以及 2 套拉线、地锚。

（3）在每个围建单元门上，左边为产品名称、生产单位、执行标准、

		由受益牧户自行管护，对损坏的围栏应及时修补。同时，结合草原生态管护员职责，强化围栏后期管护。在每个围栏建设单元门上标明项目名称、围栏长度、建设单位名称、施工单位名称等重要信息,每个围栏建设单元通过 GPS 航迹、航点定位。			生产日期，右边为项目名称及标段号、建设单位名称、施工单位名称、建设年月。 5. 后期管护 按照谁受益、谁管护的原则，对建设后的围栏进行移交，由受益牧户自行管护，对损坏的围栏应及时修补。同时，结合草原生态管护员职责，强化围栏后期管护。在每个围栏建设单元门上标明项目名称、围栏长度、建设单位名称、施工单位名称等重要信息，每个围栏建设单元通过 GPS 航迹、航点定位。		

注：1. 本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况不一致的，按负偏离处理；直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3. 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标单位：青海泽标建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李积英（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

附件 14：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标人投标时提供能够证明相关产品技术参数响应的检测报告或相关资料。

CZ-JL-0136
公司地址：青海省西宁市生物园区银羚大街29号装备制造创业配套产业园19、20单元.
公司电话：0971-6240109
212901080001

检 验 报 告

持正检 WL241104005 号

产品名称：编结网围栏

委托单位：青海泽标建设工程有限公司

检验类别：委托检验

青海持正工程技术有限公司

二零二四年十一月六日

CZ-JL-0136

212901080001

编结网围栏检验报告

产品名称	编结网围栏	规格型号	91L8/110/50
委托单位	青海泽标建设工程有限公司	委托人	李积英
检验类别	委托检验	联系电话	13997165993
委托日期	2024 年 11 月 04 日	检测日期	2024 年 11 月 04 日~ 2024 年 11 月 06 日
检验依据	JB/T [illegible]38-20[illegible]		JB/T7137-2007
检测项目	编结网技术指标 、连接件技术要求、编结网用钢丝镀锌层重量及力学性能指标、刺钢丝(拉丝)镀锌层重量及力学性能指标、(绑钩、挂钩)直径及力学性能指标、 钢制支撑件规格与基本参数重量、水泥支撑件规格及基本参数。		
结论	经检验，样品所检项目符合技术要求。(检验结果仅对来样样品负责）。		

检测单位：　　批准：　　审核：　　试验：

CZ-JL-0136

212901080001

编结网围栏检验报告

序号	检测项目			技术要求	检测结果	单项评定
1	编结网技术指标	扣结（%）	沿经线方向(在100N力作用下位移不大于10mm)	统计指标合格率≥95	97	符合
			沿纬线方向(在100N力作用下位移不大于10mm)	统计指标合格率≥90	93	符合
		边线绕结（%）	沿纬线位移(在100N力作用下位移不大于10mm)	统计指标合格率≥85	88	符合
			绕结圈数	不小于2圈，统计指标合格率≥85	90	符合
		经线间距（%）		统计指标合格率≥85	97	符合
		经线间距（mm）		500，经线间距偏差±20	505，+5	符合
		纬线间距（mm）		纬线间距尺寸偏差为0~8（mm）	2	符合
		纬线根数（根）		8	8	符合
		单根纬线接头		≤1处	0	符合
		网卷展开长度(m)		≥100	100.3	符合
		网宽(mm)		1100，网宽允许偏差±20	1102，+2	符合

检测单位：

批准：　　审核：　　试验：

CZ-JL-0136

212901080001

编结网围栏检验报告

序号	检测项目		技术要求	检测结果	单项评定
2	连接件技术要求	围栏门	Φ25 直缝电焊钢管，围栏门采用双扇结构，单扇高为1300mm，宽为 1500mm，30×3 扁铁，40×40×4 角钢，1.5mm 钢板。间距 150mm，焊接牢固、焊缝平整，无烧伤和虚焊，围栏门应涂防锈漆和银粉、涂层均匀、无裸露和堆积表面。	满足要求	符合
		围栏门的重量（kg/扇）	—	25.0	—
3	编结网用钢丝镀锌层重量及力学性能指标	钢丝直径及允许偏差(mm) 边纬向	2.8±0.08	2.80	符合
		钢丝直径及允许偏差(mm) 中纬向	2.5±0.07	2.51	符合
		钢丝直径及允许偏差(mm) 经线、环扣线	2.5±0.07	2.52	符合
		抗拉强度 MPa（边纬线）	≥900	1413	符合
		抗拉强度 MPa（中纬线）	≥900	1165	符合
		抗拉强度 MPa（经线、环扣线）	≥550	705	符合
		镀锌层重量 g/m²（边纬向）	≥45	47	符合
		镀锌层重量 g/m²（中纬向）	≥40	40	符合
		镀锌层重量 g/m²（经线、环扣线）	≥40	41	符合
		缠绕试验-自身直径	芯棒上紧密缠绕 6 圈后，钢丝不得断裂	钢丝无断裂	符合
		缠绕试验-自身直径 4 倍	芯棒上紧密缠绕 6 圈后，锌层不得开裂及不能用裸手指擦掉	满足要求	符合

检测单位：

批准：

审核：

试验：

CZ-JL-0136

212901080001

编结网围栏检验报告

序号	检测项目		技术要求	检测结果	单项评定
4	刺钢丝(拉丝)镀锌层重量及力学性能指标	直径及允许偏差（mm）	2.8±0.08	2.82	符合
		抗拉强度（MPa）	350~660	528	符合
		镀锌层重量（g/m²）	≥45	46	符合
5	（绑钩、挂钩）直径及力学性能指标	尺寸长度（mm）	≥200	203	符合
		直径及允许偏差（mm）	2.5±0.07	2.52	符合
		抗拉强度（MPa）	≥350	475	符合
6	钢制支撑件规格与基本参数重量	钢制支撑件外观	门柱、角柱、中间柱、支撑件不得有焊接现象、各种柱杆均涂防腐锈漆、涂层应均匀、平滑、无明显皱纹、气泡	满足要求	符合
		门柱、角柱材料规格（mm）	热轧等边角钢 90×90×8 边宽度允许偏差±1.2 边厚度允许偏差±0.4	热轧等边角钢 90.0×90.2×8.1	符合
		中间柱材料规格（mm）	热轧等边角钢 70×70×7 边宽度允许偏差±1.2 边厚度允许偏差±0.4	热轧等边角钢 70.1×70.1×7.0	符合
		小立柱材料规格（mm）	热轧等边角钢 40×40×4 边宽度允许偏差±0.8 边厚度允许偏差±0.4	热轧等边角钢 40.3×40.1×4.2	符合
		下立柱、地锚材料规格(mm)	热轧等边角钢 40×40×4 边宽度允许偏差±0.8 边厚度允许偏差±0.4	热轧等边角钢 40.2×40.0×4.0	符合
		支撑杆材料规格（mm）	电焊钢管Φ50 外径允许偏差±0.5	电焊钢管 Φ50.2	符合

检测单位：

批准：　　审核：　　试验：

CZ-JL-0136

212901080001

编结网围栏检验报告

序号	检测项目		技术要求	检测结果	单项评定
7	钢制支撑件规格与基本参数重量	小立柱横梁材料规格（mm）	热轧等边角钢 40×40×4 边宽度允许偏差±0.8 边厚度允许偏差±0.4	热轧等边角钢 40.1×40.0×4.2	符合
		门柱、角柱尺寸长度（mm）	≥2150	2153	符合
		中间柱尺寸长度（mm）	≥2150	2159	符合
		小立柱尺寸长度（mm）	≥2000	2007	符合
		下立柱、地锚尺寸长度（mm）	≥600	604	符合
		支撑杆尺寸长度（mm）	≥3000	3010	符合
		小立柱横梁尺寸长度（mm）	≥200	208	符合
		网片重量（kg/100m）	—	47.3	—
		门柱、角柱重量（kg）	—	22.8	—
		中间柱重量（kg）	—	13.5	—
		小立柱重量（kg）	—	4.6	—
		下立柱、地锚重量（kg）	—	1.5	—
		支撑杆重量（kg）	—	13.0	—
8	水泥支撑件规格及基本参数	外观	外表面应光滑、没有裸筋、没有肉眼可见贯穿裂纹、预留孔不得堵塞	外表面光滑、没有裸筋、没有肉眼可见贯穿裂纹、预留孔无堵塞	符合
		长度（mm）	≥1920	2001	符合
		横截面积（cm^2）	≥22	104	符合

检测单位：检测专用章 6301012669973

批准：

审核：

试验：

附件 15：投标人类似业绩证明材料

投标人类似业绩证明材料

提供自 2022 年 01 月 01 日至今的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目。需提供有效的中标（成交）通知书或者包含合同首页、标的及金额所在页、采购合同签字盖章页的合同复印（或扫描）件。

企业名称：青海泽标建设工程有限公司（公章）

企业法定代表人：李积英（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

近年完成的类似项目情况表 01

项目名称	曲麻莱县麻多乡扎加村星宿海草原退化综合治理建设项目四标段
买方名称	曲麻莱县发展和改革局
买方联系人及电话	尼玛扎西、0976-8851800
合同价格	4771192.50 元
项目概况及投标人履约情况	退化草地治理，牧草种子，肥料，无纺布，机械台班，人工，鼠害防控，饵料，生物毒素，安装招鹰架，安装鹰巢架。 完成治理退化草地 9383 亩。已完成。保质保量，履约良好。
备注	已完成，后附中标通知书与合同

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标货物的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标货物的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

首页 > 交易信息 > 工程建设 > 中标结果公告

[玉树州·曲麻莱县][公开招标][材料设备]曲麻莱县麻多乡扎加村星宿海草原退化综合治理建设项目 标段四[已发中标结果公告]

【信息时间：2022/05/03 12:28:05 阅读次数：19】【我要打印】【关闭】

曲麻莱县麻多乡扎加村星宿海草原退化综合治理建设项目 标段四（设备、材料、货物（技术服务））中标结果公告

（招标编号：E6301000076035137001004）

本项目已于2022年04月29日至2022年05月02日发布中标候选人公示，公示期内无异议，确定第1名中标候选人为中标人，现将中标结果公告如下：

盖章：　　发布日期：2022年05月03日

招标人	曲麻莱县发展和改革局			
代理机构	青海中树工程项目管理有限公司			
中标结果				
中标候选人名称	资格能力条件	中标价	交货（服务）期（天）	货物（服务）质量
青海泽标建设工程有限公司	完全响应	4771192.00元	60 （按合同约定执行）	合格

中标通知书

青海泽标建设工程有限公司：

曲麻莱县发展和改革局“曲麻莱县麻多乡扎加村星宿海草原退化综合治理建设项目四标段”国内公开招标代理工作已于2022年04月28日完成。招标编号：青海丰树公招（货物）2022-007。经评标委员会评审，现确定你单位为中标人。中标详情如下：

中标内容	交货时间	交货地点
退化草地治理，牧草种子，肥料，无纺布，机械台班，人工，鼠害防控，饵料，生物毒素，安装招鹰架，安装鹰巢架。	60天（按合同约定执行）	玉树州曲麻莱县麻多乡
中标金额（元）	肆佰柒拾柒万壹仟壹佰玖拾贰元伍角零分（￥4771192.50）	

你单位收到中标通知书后，尽快与曲麻莱县发展和改革局签订合同。

招 标 人：曲麻莱县发展和改革局（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

签发单位：青海丰树工程项目管理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

签发日期：2022年05月06日

曲麻莱县麻多乡扎加村星宿海草原退化综合治理建设项目

合同文本

第 四 标段

二0二二年五月

曲麻莱县麻多乡扎加村星宿海草原退化综合治理建设项目

施工合同

第 四 标段

业主单位：曲麻莱县发展和改革局 （以下简称甲方）

施工单位：青海泽标建设工程有限公司 （以下简称乙方）

甲、乙双方根据 2022 年 4 月 28 日关于曲麻莱县麻多乡扎加村星宿海草原退化综合治理建设项目（项目名称）的招标文件要求和招标代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，

一、工程建设地点、面积及合同金额：

1、施工地点：玉树州曲麻莱县麻多乡

2、建设任务及面积：完成治理退化草地 9383 亩。

3、合同金额：大写：肆佰柒拾柒万壹仟壹佰玖拾贰元伍角整（小写：4771192.50 元）

二、技术方案：

1、退化草地治理工程

（一）、建设规模

草原退化综合治理工程 9383 亩。选择在麻多乡扎加村星宿海实施。

（二）、地块选择

地块选择根据退化草原地形地面确定本区域，主要对中度退化草地采用划破草皮施肥改良的措施和技术路线进行修复。优先选择平均 坡度 15° 左右，平均土层厚度为 30cm 左右，草地植被盖度

在 20~30%之间的草场上。在不破坏原生植被的前提下，对退化草原通过施肥、免耕补播改良措施进行治理。

（三） 、技术流程

地块选择→牧草品种搭配→免耕作业→无纺布保护

（四）、主要技术措施

（1）鼠害建前防治和建后控制

在种草治理前，对实施区域的鼠害进行防治，在半人工草地建植后，对鼠害情况监测和控制，确保建植成效。

（2）草地建植方法

①牧草种子

牧草品种：选用青海当地生产的、适宜青藏高原生长的多年生禾本科牧草品种，以市场供种相对充足的上繁草垂穗披碱草和下 繁草青海冷地早熟禾、青海中华羊茅合理搭配。

垂穗披碱草：多年生草本，疏丛型上繁草，须根发达，秆丛生，要株高 100-123 厘米，具 2-3 节，叶长 3-20 厘米，宽 0.7-1.0 毫米，无毛或疏生柔毛。穗状花序紧密，小穗稍偏于穗轴一侧，弯 拱下垂带紫色，穗长 15. 6-18.5 厘米，含 2-4 小花，颖顶端渐尖或具长 2-4 毫米短芒；外稃背部密生短毛，顶端延伸一粗糙、反 曲或稍制之芒，芒长 14-24 毫米；颖果披针形，千粒重 3.4-4.5 克，生育期 121-430 天，能耐－35℃的低温侵袭，年降水量 400 毫米的高寒地区种植。

青海中华羊茅：属本科多年生草本植物须根发达，茎杆直立疏丛型，盛花期株高 60-90 厘米，圆锥花序开散，种子千粒重 0.6-0.8 克，具抗寒，耐盐碱，较耐旱，分蘖多，返青早，枯黄晚，草质柔软，品质优良，适口性好，生长年限较长等优点，年降雨量 400 毫米左右的高寒地区种植，是建立刈牧兼用人工草地的优良草种，特别适宜作为中繁草参加混播，也是补播改良退化天然草地的优良草种。

青海冷地早熟禾：多年生疏丛型禾草，须根系，具沙套，根系多集中在 10-18 厘米土层中。茎直立、稍[illegible]，株高 50-65 厘米，具 2-3 节。叶长 3-9.5 厘米，宽 0.7-3 毫米，圆锥花序，长 4.5 厘米，通常每节具 2-3 个分枝，整穗灰绿带紫色，小穗含 1-2 小花，颖果纺锤形，长约 3 毫米，千粒重 0.22-0.42 克。抗旱、耐寒、分蘖力强、再生性好、草质优良，年降水量 400 毫米的高寒地区种植。

种子质量：要求达到国家规定的三级标准以上（种子纯净度、发芽率执行标准为 GB 6142-2008、青海中华羊茅种子质量分级 DB63/T1063-2012）。全部采用断芒、精选、定量包装的牧草种子。种子质量要求标准详见表 4。

种子必须达到国家牧草种子三级以上分级标准；种子包装一律采用净重 25 公斤的定量包装，包装袋面要标明种子名称、供应单位，袋口挂种子标签，标明种子名称、产地、发芽率、净度。籽种

质量除质检部门每批次的检验报告外，中标企业供应的籽种 每袋须有合格证。

种子检验：种子质量控制采取现场抽样统一委检，以检验结果为准。

建设单位、监理方、中标方三方共同抽样封存，由专人统一保 管，统一送检，送检结果与送货、投标检验报告相比较后做结算。如果送货的 检验报告与投标的检验报告不符，种子用价（净度*发芽率）等于 或高于投标检验报告视为合格，反之种子用价低于投标检验报告将视为不合格，进行相应扣款处理。按照同比例扣除该批货物， 委托检验结果低于三级标准的，除按比例扣除该批次货物的货款以外，另外按该种子播种面积同比例扣除人工费及机耕作业费。

表4 种子质量要求标准

序号	名称	级别	净度/%≥	发芽率/%≥	种子用价/%≥	其他植物种子数/粒/克≥	水分/%≤	备注
1	垂穗披碱草	一	95	85	80.7	2	11	参照垂穗披碱草的标准
		二	90	80	72	3	11	
		三	85	75	63.7	5	11	
2	青海冷地早熟禾	一	96	85	81.6	2	11	参照青海冷地早熟禾的标准
		二	93	80	74.7	3	11	
		三	90	75	67.5	5	11	
3	青海中华羊茅	一	98	90	88.2	2	11	参照青海中华羊茅的标准
		二	95	85	80.7	3	11	
		三	90	80	72.0	5	11	

表 4 种子质量要求标准

②农艺措施

地面处理→+十字交叉播种（免耕机）+施肥

施工中采用 19 行及以上免耕播种机（幅宽 2.8 米以上）和大马力动力机械（配套动力 90 马力及以上）进行作业（免耕机前 放袋子，挡风以免种子垂落） 。农艺措施中掌握好播种量、播种 深度和镇压的工序非常重要。

③播种期

适宜播种期为 5 月～6 月。

④播种量

播种量遵循适量播种，合理密植的原则。混播草地总播种量 5.00 公斤/亩，分别为垂穗披碱草 2.50 公斤/亩、青海冷地早熟禾 1.00 公斤/亩、青海中华羊茅 1.50 公斤/亩。

⑤播种深度

小粒草籽播种深度 0.5～1 厘米，大粒草籽播种深度 2～3 厘米。

⑥施肥

选用的肥料为复合肥和有机肥，施入量为复合肥（含磷酸二铵、尿素等)8.8 公斤/亩，有机肥 58.51 公斤/亩。肥料标准详见表 5 及表 6。

表5 复合肥质量标准

项目	指标		
	高浓度	中浓度	低浓度
总养（N+p250+k20）	40.0	30.0	25.0
水溶性磷占有效磷百分比	70	50	40
水分（H02）	2.0	2.5	5.0
粒度（1.00-4.75mm 或 3.35-5.60mm）	9.0	90	80
氯离子（CT）	3.0		
有机质的质量分数（以烘干基计）/（%）	45		
总养分（氮+五氧化二磷+氯化钾）的质量分数（以烘干基 计）/（%）	5.0		
水分（鲜样）的质量分数/（%）			
酸碱度（PH）	5.5-8.5		
注： 1、 组织产品的单一养分含量不得低于4.0%，且单一养分测定值与标明负值偏差不得大于1.5%。 2 、以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为:“枸溶性磷”，可不控制” 水溶性磷占有效磷百分率指标。若有氮，钾二元肥料，也不控制“水溶性磷占有效磷百分率” 指标。3 如产品氮离子含量大于 3.0%，并在包装容器上有“含氮”可不检验该项目；包装容器为标明“含氮”时，必须检验氯离子含量。			

表6 有机肥质量标准

项目	指标
有机质的质量分数（以烘干基计）/（%）≥	45
总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数/（%）≥	30
水分（鲜样）的质量分数%≤	30
酸碱度（PH）	5.5-8.5

⑦镇压和无纺布保护

播种完成后进行镇压和铺盖无纺布。

加盖无纺布保水保温，防止水土流失，无纺布应满足易风化、抗辐射、污染指数低等特性(建议采用宽为 3 米的无纺布，每平方米重 20-22 克)。无纺布铺设应依据地形条件铺设（建议沿坡 面顺铺） ，与地面贴实，条与条之间重叠 5cm 左右，用土或石 块间隔压紧压实，防止吹胀或雨水冲毁。

（3）管护与利用

草地建植后的管护与合理利用是项目成败的关键之一，种植后一定要采取围栏封育措施加以保护，同时要实行科学管理和合理 利用，以利于植物生长和植被更新。草地建植后要制定详细的管 护利用措施，并落到实处。

①鼠害控制。在退化草地治理后，必须加强鼠害的监测和控制，并将其纳入退化草地治理后管护的一项重要内容，进行长期监控。通过在治理区内采用生物药剂防治高原鼠兔，有效地控制草地地 面害鼠的种群密度，减轻害鼠对草地的危害。通过长期控制，达 到天敌、鼠类和牧草食物链间的生态平衡，使草地生态系统趋于良性循环。

②合理利用。为保证牧草的充分生长和草地可持续利用，除及时进行围栏封育保护和继续控制鼠害，还要制定科学合理的管护 利用制度。 自草地建植后三年内要禁止放牧，以后在牧草停止生 长期间可适当轻牧利用，亦可结合牧草刈割利用。

2、鼠害防控技术方案

（一）建设规模

退化草地治理工程鼠害防控 9383 亩。选择在麻多乡扎加村星宿海实施。

（二）防控对象

高原鼠兔

（三）密度调查

鼠兔采用夹日法和有效洞口统计法。选择有代表性地段做样方，样方面积为 1 亩，取样数量不得少于调查面积的万分之一。

（四）防控区域确定

县鼠害预测预报站的调查和监测数据是本项目确定高原鼠兔防控规模、布局的重要依据。县草原站预测预报数据显示，该县今年确定的项目建设区达到危害标准，为本年度防控区域。

（五）防控药剂

D 型肉毒素（2021 年曲麻莱县部分鼠害防控采用 C 型肉毒素）

（六）饵料

选用小麦

（七）毒饵配制

在拌饵容器内倒入适量清水，要求不宜用碱太大的水，略偏酸性或 pH 值 6 左右为好。

毒饵配制按药品说明进行，生物毒素、饵料和水的配制比例为 1ml:1kg:80ml，充分搅拌。

毒饵配制好后盖好塑料布焖制 10 小时以上。

（八）施饵

（1）投饵量：采用洞口投饵法，每亩需毒素 0.1ml、饵料 0.1kg，每洞投放毒饵 15～20 粒。

（2）投饵方法：要求投放饵料离有效洞口 7～10cm 处，投洞 率 90%以上。另在害鼠密度大，分布均匀的地区采用带状投饵，每 隔 10m 均匀地撒施一条毒饵带。投饵后禁牧 8～10 天。

（3）作业要求：投饵时要求每 20～30 人为一组，每两个投饵人员之间间隔 2～3m，一字排开，同一方向同步进行投饵，大面 积投饵后，遇大风、降雪等特殊天气影响防控效果，必须补施毒饵。

（九）防控期

植草前用生物毒素方式进行鼠害防治

（十）防控效果检查

防效检查从施药后第 7 天开始，采用堵洞法来计算防控效果，计算公式：R （%） =（A-B）/A×100%。式中：R 为有效洞口减 退率；A 为防控前有效洞口；B 为防控后有效洞口；投饵后第 8 天 调查防控效果要求达 90%以上。

（十一）杀鼠剂及毒饵管理

严格遵守毒药保管、运输、储藏、使用的有关规定，加强安全 保护措施，防控前技术人员负责向施药人员讲解有关技术和操作 规程，以及毒性药品的安全使用知识。并应现场示范操作，使防 控人员全面熟悉用药知识方可施药。同时要宣传鼠害防控的意义 和重要性，

并应示范操作，直到防控人员全面掌握以后才开始施 药。毒饵要随用随配，当天剩余的毒饵，也要在 1-4℃库房中保 存，以防降低药效。施教过程中技术人员应现场检查指导，发现问题及时纠正。

（十二）注意事项

（1） 禁牧： 施药前应及时通知防控区域所有牧户及时将牲畜 转移至防控区外草场放牧，防控区在施药后 8-10 天内实行禁牧。

（2）跨界防控：对跨村、跨乡、跨县的防控区，要向对方区域进行延伸防控，跨村的防控区域向对方区域延伸 30m，跨乡的防 控区域向对方区域延伸 50 米，跨县的防控区域向对方区域延伸 100 米。

（3）作业时应注意的事项：①必须配带口罩、手套等防护用品；②讲究卫生，注重安全；③严禁在作业时抽烟、酗酒；④严禁不顾整体，越队前 行或掉队等现象发生；⑥必须做到有序移行，认真作业。

（十三）监督指导

为了保证鼠害防控的效果，提高防控质量，鼠害防控前对所有参与人员进行技术指导。

即必须在防前一周对参与本次防控的具体工作人员进行技术指导。

（1）指导对象。施工人员和参加鼠害防控的有关管理人员。

（2）指导内容。鼠害防控、毒饵拌制技术及毒饵投放技术； 防前、防后的鼠害密度调查、调查样方设置及防控建设的自我防护 知识和实地操作技术等。

（3）指导方法。一是项目建设前的指导。由县级技术人员进行鼠害防控的技术培训，包括毒饵的配制、毒饵的投放及投放量、 样方设置及周围环境、安全防护措施等。然后由经培训的业务骨 干在防控前对各队抽调的干部和投饵劳动力，进行为期 1 天培训。

二是防控区实地培训。由技术人员实地讲解，向参与防控的每位 人员详细讲解防控要领即见洞投饵，投饵数量控制在 15-20 粒、投饵率必须达到 90%以上；作业方向为顺风而行、人员相互间隔距 离适当。

（4）技术监督。防控过程中，施工队要聘请相应专业技术人员进行现场跟踪指导和技术把关，及时处理相关问题。州县草原站 专业人员进行监督指导。

3、鹰巢技术方案

（一）建设规模

退化草地治理工程鼠害防控 9383 亩。安装招鹰架 13 座，安装 鹰巢架 3 座。全部选择在麻多乡扎加村星宿海实施。

（二）基本思路

根据青海省和甘肃省鹰架招鹰控制鼠害的试验研究表明，鹰类在捕食区捕食活动时，每次飞行直线距离大约为 500 米～600 米，一只鹰活动控制草地鼠害半径范围约为 730 米，因此，合理设立 鹰

架、鹰巢，改善鹰的栖息环境，可提高鹰的繁殖率，扩大其种 群数量。

根据青海省鹰架招鹰控制草地鼠害技术，每座鹰架可控制面积 735 亩。鹰架与鹰巢的比例为 4 ： 1。

（三）地点的选择

建设鹰架的地段应选择在有害鼠猛禽类天敌，地面平坦、开阔，远离高山、悬崖、沟底、树林、道路及定居点，草地植被稀疏、 植株低矮的退化草地，害鼠种群密度为有效洞口≤100 个/hm2 的 最适栖息地，使其生活习性与生态要求一致。

（四）招鹰架的类型、材质及规格

（1）类型

招鹰架由立柱、鹰架和鹰巢三部分组成，其中：立柱分为鹰架 立柱和鹰巢立柱两种类型；鹰架分落鹰架和落鹰台两种类型；鹰巢分鹰巢架和鹰巢栏两种类型。

（2）材质

招鹰架材质为钢筋混凝土及钢材焊接。

（3）规格

①鹰（巢）架立柱鹰架立柱采用小头边长为 100mm，大头边长 为 120mm，

高 5000mm 的钢筋水泥立柱。

鹰巢立柱采用小头边长为 120mm，大头边长为 140mm，高 7000mm 的钢筋水泥立柱。

水泥立柱为钢筋混凝土浇筑，水泥用 42.5 级普通硅酸盐水泥，内置Φ12mm 螺纹钢立筋 4 根，每隔 150mm 加Φ6.5mm 箍筋一道，用扎丝捆绑在螺纹钢上，立柱顶部内置Φ40mm 钢管 200mm，距顶 部 700mm 处预留固定孔。

②鹰架

落鹰架用 60mm×30mm×4mm 槽钢焊接成的“十”字形，上横梁 长 500mm，下横梁长 1500mm，两横梁用槽钢在中间连接，间距为 250mm。上、下横梁槽钢中间安装木料，采用扁铁固定。 在鹰架 底端的下横梁中间焊接上Φ30mm 的钢管 200mm， 插入立柱顶端 用钢板固定的（Φ40mm）钢管内固定。下横梁两端焊接上 40mm× 40mm×4mm 的角钢 80mm，打上孔，将 800mm 长的 30mm×30mm×3mm 的角钢两根，用 10mm×120mm 的螺丝在离立柱顶端 700mm 的孔眼 上固定。

落鹰台用钢筋混凝土浇筑的上大下小的双层连体八角形，上层对角直经 380mm，厚 4 mm；下层对角直经 300mm，厚 4 mm 。内置Φ6.5mm 焊接成上大下小的双层网状箍筋，在下层八角形中心设置Φ30mm 钢管 200mm，插入立柱顶端用钢板固定的（Φ40mm）钢管内固定。浇筑用水泥为 42.5 级普通硅酸盐水泥。

③鹰巢

鹰巢架灌木筐的规格为：上口直径为 600mm，高 400mm。鹰巢 的规格为：用 30mm×30mm×3mm 角钢焊接成下小上大的六面体， 上六边形边长为 400mm，下六边形边长为 330mm，高为 300mm；横 梁的规格：60mm×30mm×4mm 的槽钢 2000mm，槽内安装木料，用 扁

铁固定。将鹰巢焊接在横梁的中间，把灌木筐稳固在鹰巢内， 横梁底端中间焊接上直径为 30mm 的钢管 200mm，插入立柱顶端 用钢板固定的（Φ40mm）钢管内固定。

横梁两端焊接上 40mm×40mm×4mm 的角钢 80mm，打上孔， 将 800mm 长的 30mm×30mm×3mm 的角钢两根，用 10mm×120mm 螺丝在离立柱顶端 700mm 的孔眼固定。

鹰巢栏用 40 mm ×40 mm ×4 mm角钢， 弯成直经 600mm 和 150mm 的外圆和内圆，并等距离打 6 个护栏固定孔。取Φ12mm 螺纹钢 600mm 六根，顶端 100mm 处弯圆，护栏长 250mm，350mm 处 弯成 90° 角， 分别穿入外圆和内圆护栏固定孔内，最后在末端 焊Φ30mm 钢管 200mm，插入立柱顶端用钢板固定的（Φ40mm）钢 管内固定。在螺纹钢之间用直径Φ6.5mm 钢筋焊接成网状，构成 鹰巢的底部。

（五）招鹰架的布局及安装

（1）鹰架（巢）的布局

鹰架(巢)纵横间隔距离为 700m，每座鹰架(巢)控制面积 49hm2。鹰架与鹰巢的比例为 4 ： 1，鹰架（巢）一字形排列， 每隔四个鹰架埋设一个鹰巢。

（1） 鹰架（巢）的安装

①安装前的准备施工前，结合 1 ： 2000 地形图对控制区域进行 实地勘察，依据实施方案，规划设计安装线路和鹰架、鹰巢位点分布图，制定安装技术要点和工程进度表，并分发给各施工组。

②安装位点采用人工拉线和使用全球定位系统（GPS）相配合的方法进行定位，如遇沟渠、陡崖、沼泽地、道路等而无法作为位 点，位点可向前或向后移动适当位置。

③安装建设

将鹰巢架（栏） 、落鹰架（台）、固定横梁等部件安装固定在鹰架（巢）立柱上，拧紧连接固定螺栓，并检查各连接部件有 无松动。鹰架（巢）立柱置入地下 1000mm，并灌注半径 250mm、 高 500mm 的水泥基座。

④登记编号

安装完毕后，每一座鹰架（巢） 都要统一编号造册，登记坐标位置并标注在 1 ： 2000 地形图上，以备检查维护。

（六）效果调查及方法

（1）调查内容

鹰架利用率的调查：在控制区域，对鹰架上及其四周地面鹰类排泄的粪便、唾余物（食团）及鼠类的内脏、毛皮等物的调查，以确定该鹰架有鹰的栖息而被利用。

鹰巢筑巢率的调查：在控制区域，对设置的鹰巢进行调查，统 计出有鹰新建及繁殖的鹰巢。

害鼠有效洞口减退率的调查：用堵洞盗洞法调查有效洞口减退率，将样方内所有的鼠洞用土堵上，24 小时后检查，被鼠盗开的 洞口为有效洞。

铁固定。将鹰巢焊接在横梁的中间，把灌木筐稳固在鹰巢内， 横梁底端中间焊接上直径为 30mm 的钢管 200mm，插入立柱顶端 用钢板固定的（Φ40mm）钢管内固定。

横梁两端焊接上 40mm×40mm×4mm 的角钢 80mm，打上孔， 将 800mm 长的 30mm×30mm×3mm 的角钢两根，用 10mm×120mm 螺丝在离立柱顶端 700mm 的孔眼固定。

鹰巢栏用 40 mm ×40 mm ×4 mm角钢， 弯成直经 600mm 和 150mm 的外圆和内圆，并等距离打 6 个护栏固定孔。取Φ12mm 螺纹钢 600mm 六根，顶端 100mm 焊成圆，护栏长 250mm，350mm 处 弯成 90° 角， 分别穿入外圆和内圆护栏固定孔内，最后在末端 焊Φ30mm 钢管 200mm，插入立柱顶端用钢板固定的（Φ40mm）钢 管内固定。在螺纹钢之间用直径Φ6.5mm 钢筋焊接成网状，构成 鹰巢的底部。

（五）招鹰架的布局及安装

（1）鹰架（巢）的布局

鹰架(巢)纵横间隔距离为 700m，每座鹰架(巢)控制面积 49hm2，鹰架与鹰巢的比例为 4 ： 1，鹰架（巢）一字形排列，每隔四个鹰架埋设一个鹰巢。

（1） 鹰架（巢）的安装

①安装前的准备施工前，结合 1 ： 2000 地形图对控制区域进行 实地勘察，依据实施方案，规划设计安装线路和鹰架、鹰巢位点分布图，制定安装技术要点和工程进度表，并分发给各施工组。

②安装位点采用人工拉线和使用全球定位系统（GPS）相配合的方法进行定位，如遇沟渠、陡崖、沼泽地、道路等而无法作为位 点，位点可向前或向后移动适当位置。

③安装建设

将鹰巢架（栏） 、落鹰架（台）、固定横梁等部件安装固定在鹰架（巢）立柱上，拧紧连接固定螺栓，并检查各连接部件有 无松动。鹰架（巢）立柱置入地下 1000mm，并灌注半径 250mm、 高 500mm 的水泥基座。

④登记编号

安装完毕后，每一座鹰架（巢）都要统一编号造册，登记坐标位置并标注在 1 ： 2000 地形图上，以备检查维护。

（六）效果调查及方法

（1）调查内容

鹰架利用率的调查：在控制区域，对鹰架上及其四周地面鹰类排泄的粪便、唾余物（食团）及鼠类的内脏、毛皮等物的调查，以确定该鹰架有鹰的栖息而被利用。

鹰巢筑巢率的调查：在控制区域，对设置的鹰巢进行调查，统计出有鹰新建及繁殖的鹰巢。

害鼠有效洞口减退率的调查：用堵洞盗洞法调查有效洞口减退率，将样方内所有的鼠洞用土堵上，24 小时后检查，被鼠盗开的 洞口为有效洞。

$$\text{有效洞口减退率（%）} = \frac{A-B}{A} \times 100 \quad \text{……（1）}$$

A：鹰架安装前有效洞口数；B：鹰架安装后有效洞口数 （2）调查方法

将整个控制区域以自然山水、道路为界，划分为若干控制小区，在控制小区内每 1 ×103hm2，即十座鹰架（8 座落鹰架、2 座鹰 巢架）作为一个调查单元，依据不同草地类型或生境，选择有代 表性地段进行取样调查，取样数量 1 个（8 座落鹰架、1 座鹰巢 架），进行鹰架利用率、筑巢率及有效洞口减退率的调查， 在进 行有效洞口减退率调查时，样方面积为 1/4hm2～1hm2。建设面积 大于 3.33×105hm2，调查样方为 1/4hm2，小于（包括） 3.33× 105hm2，调查样方为 1hm2。

（3）检查验收

①验收人员及验收材料 ——验收人员省、州（地）、市业务主管部门，当地财政部门，负责技术指导人员（工程管理人员）与受益者的代表共同组成。 ——验收材料 由建设单位提交，内 容应主要包括实施的面积、时间、采取的方法、控制效果等。

②验收时间及内容 ——验收时间 鹰架建设后当地优势害鼠种群历时一个繁殖期后。 ——验收内容 实施的面积、鹰架（巢） 的数量及埋设的质量（鹰架间距、高度、基座） 、控制效果等。 ——验收标准 检查验收时应考查以下几项指标：鹰架利用率达≥ 90%，筑巢率≥30%，鹰架（巢）不得倾斜、倒塌；害鼠有效洞口 减退率

达≥10%。 ——验收意见 根据现场检查情况，做出结论， 写出验收意见。

三、建植指标：

通过建植多年生人工草地植被；使项目区草原退化综合治理得到有效治理，植被迅速恢复，使项目建设区的草地退化和水土流失状况得以控制，改善草地生态系统的恶化状况，并通过合理保护及利用措施，促进草地生态系统良性循环。

完成治理退化草地 9383.1亩。具体完成如下技术指标：

1、对该类草地建立多年生混播人工草地，建植当年每平方米出苗达到 300 株以上；第二年植被平均总盖度达到 55%以上。

2、依照《草地鼠害防控技术规程》DB63/T787—2009 的要求，防控后的技术指标达到：防控率达到 90%以上，使项目区每公顷草地高原鼠兔有效洞口数控制在 8 个以下。

3、鹰架控制鼠害：鹰架利用率达≥90%，筑巢率≥30%，害鼠有效洞口减退率达≥10%。

四、施工时间：

工程进度安排

（一）项目建设期限项目建设期 1 年。

（二）项目实施进度

2021 年 11 月前完成项目前期工作；

2021 年 12 月进行招标工作；

2022 年 2 月底前完成物资准备；

2022 年 3-4 月鼠害防控；

2022 年 3—7 月份进行鹰架，鹰巢安装、草地建植和围栏安装；

2022 年 8-9 月苗情监测；

2023 年 8 — 10 月自查验收合格后申请省级验收。

五、施工资金的结算：

1、乙方人员、设备等进场后经甲方确认后拨付合同金额的 40% ；2、乙方施工完成 100%工程量并经监理签字认可和甲方初验合格后，经甲方及相关监督部门检查，达到当年建设指标并通过县级自查验收合格后，拨付合同金额的 40% ；3、通过省、州级竣工验收合格，测苗率达到作业设计要求，拨付合同金额的 20% ；（工程量以现场实际发生为准，竣工结算按最终财务审计报告为准）

六、乙方职责：

1、施工质量和数量不符合招标文件和施工合同所规定的要求，并由此造成的损失全部由乙方承担。

2、无特殊自然原因，建设指标每下降 5%，扣除施工总资金的 10%作为乙方的罚金。

3、乙方须按期完成施工任务，如人员和机械不足额到位完不成施工任务的，除扣除未完成的全部施工资金外，还要按比例（人工缺口比例）扣除已施工资金（如：人员缺口 10%，扣除 10%的施工资金）。

4、因施工工期短，加之施工地区地势、气候等条件限制，中标单位按作业设计要求配备足量的机械设备和人员。中途未通过监理机构同意擅自缩减设备数量、更换机械设备并降低性能指标的、随意减少施工作业人员人数的，将扣除施工单位施工资金的10%作为罚金。

5、乙方务必要保护野生动植物，不准采挖虫草，不乱扔生活垃圾。

6、在高海拔作业各施工队配备必要的应急所需医疗器材及交通工具，无应急药品及交通工具者，不予进场施工。

7、乙方的人员在施工期内因施工操作不当，不加约束施工人员在高海拔地区饮酒等管理不当，所造成的伤亡事件由乙方负担全部责任。

8、合同履行期间，乙方不得或者无力履行合同，提出终止合同者，除不支付任何资金外，甲方报请上级主管部门予以通报，并取消乙方在本省范围内草原退化综合治理工程中的投标资格。

七、甲方职责：

1、甲方要安照乙方的当年施工进度，及时组织人员进行验收，并按期向乙方支付资金，不得无故拖延。

2、甲方负责确定具体的施工地块，并落实施工地块的管护责任，管护不到位造成的损失由甲方负担，不得转嫁给乙方。

3、乙方施工质量和数量不符合招标文件锁规定的要求，甲方有

权随时终止合同。

4、乙方若出现非法分包、转包等行为，甲方有权解除施工合同，并有权要求施工单位赔偿损失并负法律责任。

八、本合同未尽事宜，双方协商解决。

九、本合同一式八份。

十、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

单位名称：曲麻莱县发展和改革局

法人或代理人签字：

开户银行：农行曲麻莱县支行

账号：2875 0001 0400 0315 4

电话：0976-8851800

乙方（盖章）：

单位名称：青海泽标建设工程有限公司

法人或代理人签字：

开户银行：中国建设银行股份有限公司西宁上尕庄支行

账号：6305 0137 3607 0000 0179

行号：105851002602

电话：13997165993

邮政编码：810000

合同签订地点：

合同签订时间：2022年5月7日

登记通知书

（宁市监）登字[2023]第 000743 号

青海泽标建设工程有限公司（市场主体名称）：

你单位提交的注册资本、股东出资额、经营范围、执行董事、经理、法定代表人变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

（登记机关盖章）

2023 年 03 月 31 日

注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

（三）、近年完成的类似项目情况表 02

项目名称	黄河源园区 2021 年第二批林业草原生态保护恢复资金黑土坡治理建设项目 标段二
买方名称	黄河源园区国家公园管理委员会
买方联系人及电话	杨川、0975-5952016
合同价格	1412595.00 元
项目概况及投标人履约情况	治多村黑土滩施工 1800 亩牧草种子，同德短芒披碱草 5400kg、青溶冷地早熟禾 3600kg、青海中华羊茅 900kg。同德小花碱茅 90[illegible]g、牧草专用肥 2700kg、颗粒有机肥 223200kg；已完成。保质保量，履约良好。
备注	已完工，后附中标通知书与合同

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标货物的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标货物的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

黄河源园区2021年第二批林业草原生态保护恢复资金黑土坡治理建设项目 标段二（设备、材料、货物（技术服务））中标结果公告

（招标编号：E6301000076036378001002）

本项目已于2022年06月20日至2022年06月23日发布中标候选人公示，公示期内无异议，确定第1名中标候选人为中标人，现将中标结果公告如下：

盖章：　　发布日期：2022年06月27日

招标人	黄河源园区国家公园管理委员会			
代理机构	青海耀川工程项目管理有限公司			
中标结果				
中标候选人名称	资格能力条件	中标价	交货（服务）期（天）	货物（服务）质量
青海泽标建设工程有限公司	符合招标文件要求	1412595.000元	60（具体时间按合同约定执行）月	合格

青海耀川工程项目管理有限公司

中标通知书

青海泽标建设工程有限公司：

黄河源园区2021年第二批林业草原生态保护恢复资金黑土坡治理建设项目标段二（招标编号：E6301000076036378001002）的评审工作已经结束，经评审委员会认真评审推荐并经招标人黄河源园区国家公园管理委员会确认，贵公司为该项目的中标单位。

中标内容：黄河源园区2021年第二批林业草原生态保护恢复资金黑土坡治理建设项目 标段二

中标金额：1412595.00元

请贵公司在本通知书发出之日起30日内，与招标人办理签定合同等有关事项。

特此通知！

招　标　人：黄河源园区国家公园管理委员会

招标代理机构：青海耀川工程项目管理有限公司

2022年06月24日

主题词：中标通知书

抄　送：黄河源园区国家公园管理委员会

青海耀川工程项目管理有限公司　　2022年06月24日印发6份

黄河源园区 2021 年第二批林业草原生态保护恢复资金黑土坡治理建设项目

合同文本

标　　段：二标段

合同编号：2021-HTP-2

黄河源园区国家公园管理委员会生态保护站

二 0 二二年六月

合同文本

业主单位：（以下简称甲方）黄河源园区国家公园管理委员会生态保护站

施工单位：（以下简称乙方）青海泽标建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及《黄河源园区2021年第二批林业草原生态保护恢复资金黑土坡治理建设项目作业设计》要求，为保质保量完成黄河源园区2021年第二批林业草原生态保护恢复资金黑土坡治理建设项目施工任务，经甲乙双方协商，签订本合同。

一、黑土坡治理建设项目工程地点、建设内容及中标价格

1、实施地点：玛多县黄河乡热曲村

2、建设内容：黑土坡治理面积1800亩，牧草种子，同德短芒披碱草5400kg，青海冷地草旱studied4360kg，青海冰草900kg，同德小花碱茅900kg，牧草专用肥27000kg，复合肥22500kg

3、中标总价：（人民币）大写：壹百叁拾壹万贰仟陆佰玖拾伍元

小写：￥1312695.00元

（包括材料长途运输费及装卸费）。

4、人员及机械：人工种草2250工日、铺膜人工900工日。

二、主要技术措施及要求

1、黑土坡治理技术方案：采用人工种草+铺设无纺布+建后管护

（1）草种选择：选用青海当地生产的、适宜玛多县生长的耐盐碱多年生禾本科牧草品种同德短芒披碱草、青海冷地

早熟禾、青海中华羊茅、同德小花碱茅。

①种子质量必须达到国家规定的三级标准以上(种子纯净度、发芽率执行标准为 GB6142-2008、DB63/T760-2008、DB63/T1332-2014、DB63/T1063-2012），全部采用断芒、精选、定量包装的牧草种子（要求具有相关部门出具的种子质量检验报告）。所需牧草种子包装一律采用净重 25kg 的定量包装，包装袋面要注明种子名称、供应单位，袋口挂种子标签，标明种子名称、产地、发芽率、净度。籽种质量除质检部门每批次的检验报告外，供应的籽种每袋须有合格证。

②种子检验：种子质量控制采取现场抽样统一委托权威机构检验，由建设单位、监理方、中标方三方共同抽样封存，由专人统一保管，统一送检，送检结果与送货、投标检验报告相比较后做结算。

③肥料选择：牧草专用费、颗粒有机肥。

④肥料质量：肥料质量要求达合格标准，全部采用定量包装的颗粒有机肥（要求具有化肥质量检测部门出具的质量检验报告）。肥料质量除质检部门每批次的检验报告外，中标企业供应的肥料须有合格证，牧草专用肥是一种掺混肥料（BB 肥），参照(掺混肥料(BB 肥)国家标准 GB21533-2008)，要求其总养分 N+P2O5+K2O≥35%。颗粒有机肥质量标准执行（NY525-2021）。

（2）播种量、施肥量

①总播种量为 6.0kg/亩，其中同德短芒披碱草 3.0 kg/亩、青海冷地早熟禾 2.0 kg/亩、青海中华羊茅 0.5 kg/亩、同德小花碱茅 0.5 kg/亩；施肥量为 139kg/亩，其中：牧草专用肥 15kg/亩，颗粒有机肥 124kg/亩。

②农艺措施：整地（施撒肥料+耙碎平整）+拌种+撒播草籽+耙地覆种（镇压）+覆盖无纺布。

1） 整地（施撒肥料+耙碎平整）

按照每亩施肥量 139kg，（牧草专用肥 15kg，颗粒有机肥 124kg）称量好后，采用手工施撒方式均匀撒在坡面上，作业过程中，在坡度较缓区域选用播种器进行人工手撒，在坡度较陡区域先沿等高线用钉齿耙松土，再进行撒播，然后人工往复拉推，保证肥料入土覆盖，施撒时沿等高线行进，往复式行进施撒，做好标记，保证不漏行，整地人员在培训熟练后，建议按 3-5 人一组，采用钉齿耙，沿等高线对施撒肥料的地块人工往复拉推 2-5 遍，耙碎平整地面并将肥料耙入土壤，深度以 5cm 为宜，达到播种坪床要求。

2） 拌种

根据施工进度将草种按每亩的播种量称量好，然后分次分层按量倒在塑料布或专用拌种区，再倒入一定量的土用铁锹或木锨倒拌 3-5 次，充分拌匀，拌好种子应随伴随用，当

天拌种当天用完，禁止堆放或装袋留存时间过长（建议不超过 12 小时）。

3） 撒播（播种）

播种作业建议在无风或微风条件下进行，作业过程中，坡度较缓的区域采用手摇播种器播种，沿山坡等高线，轻摇播种器匀速播种，在坡度较陡区域选用人工手撒播种，撒播时要用手腕尽力抖开，使大小粒种子播撒均匀，为保证播种足量且均匀，建议先展试验，确定播种速度和播种遍数。

4） 耙地覆种

播种后，建议按 3-5 人一组，采用钉齿耙，沿等高线对播种的地块人工往复轻拉轻推 2-3 遍，并用耙背轻拉磨平，保证种子和肥料入土覆盖，种子及肥料入土率高于 80%以上，播种深度掌握在 1.0cm-2.5cm 之间，同时建议用脚踩实或木板拍实或其他方式压实，达到镇压作用。

5） 铺设无纺布

撒播完成后，加盖无纺布保水保温，防止水土流失，无纺布应满足易风化、抗辐射、污染指数低等特性（建议采用宽为 1.8 米的无纺布，每平方米重约 20±2 克）。无纺布铺设应依据地形条件铺设（建议沿坡面顺铺），与地面贴实，条与条之间重叠 5cm 左右，用土或石块间隔压紧压实，镇压时应铺设一条镇压一条，避免对草种的多次碾压践踏。

三、施工时间

施工期从2022年6月30日至____年____月____日，共____天。

四、施工资金的结算

合同签订后进场后支付中标总价的45%的工程款，其中15%为履约保证金（5%为农民工工资保证金，10%为工程质保金），该15%的履约保证金在乙方收到第一批款项后转至黄河源园区国家公园管理委员会的基本账户中（户名：黄河源园区国家公园管理委员会；账号：28-830001040003273；开户行：中国农业银行股份有限公司玛多县支行）；完成项目所有建设任务及按《青海省林业和草原生态建设项目管理办法》要求完成档案整理工作（资料一式三份），经甲方及工程监理签字确认后可支付40%，通过县级自查验收后，再支付中标总价资金的10%；省级验收时施工方必须在场，现场确认面积和植被盖度，验收合格后支付5%的资金，面积和植被盖度达不到技术指标要求，下年度继续种植直到达到要求和标准。

五、乙方未能履行合同，应负责以下责任：

1、施工质量和数量不符合招标文件所规定的要求，并由此造成的损失全部由乙方承担。

2、施工所需的草籽、牧草专用肥、颗粒有机肥、人员

必须按设计要求和投标文件承诺执行，若质量、数量达不到要求，造成工程延误，取消施工企业在本园区范围内黑土坡工程3-5年的投标资格。

3、无特殊自然因素，建设指标每下降5%，扣除施工总资金的10%作为乙方的罚金。

4、乙方须按期完成施工任务，如果机械不能足额到位完不成施工任务的，除扣除未完成的全部工资外，还要按比例（人员缺口比例）扣除已施工资金（如：人员缺口10%，扣除施工总资金的10%作为乙方的罚金）。

5、合同履行期间，乙方不能或者无力履行合同，提出中止合同者，除不支付任何资金外，甲方报请上级主管部门予以通报，并取消乙方在本园区范围内黑土坡项目中3-5年的投标资格。

6、省联查验收、建设单位自查项目验收期间施工单位负责人及项目经理必须到项目实施现场。

7、乙方按照《保障农民工工资支付条例》的有关规定及时发放农民工工资，对施工人员无故不发工资，造成的后果由乙方承担。

六、甲方职责：

1、甲方要按照乙方的当年施工进度，及时组织人员进行验收，并按期向乙方支付资金，不得无故拖延。

2、甲方负责确定具体的施工地块，并落实沙化治理草地的管护责任，管护不到位而造成的损失由甲方负担。

3、若乙方不履行投标文件中项目经理、技术人员、机械设备不到场的，甲方有权终止合同。

4、在合同履行期间，乙方人员伤亡或意外事故，全部由乙方承担，与甲方无任何责任。

七、本合同未尽事宜，双方协商解决。

八、本合同一式七份，甲乙双方各执一份，存档一份，相关单位一份。

九、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

单位名称：黄河源园区国家公园管理委员会生态保护站

法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

电话：0975-5952016

邮政编码：813599

乙方：

单位名称：青海泽标建设工程有限公司

法定代表人签字（盖章）：李积芳

被授权人签字（盖章）：

开户银行：中国建设银行股份有限公司西宁上滨路支行

帐　　号：63050137360700000179

电　　话：13997165993

签约地点：玛多县

法定代表人盖章：

代理机构（签章）

单位名称：青海耀山工程项目管理有限公司

2022 年 7 月 14 日

登记通知书

（宁市监）登字[2023]第 000743 号

青海泽标建设工程有限公司（市场主体名称）：

你单位提交的注册资本、股东出资额、经营范围、执行董事、经理、法定代表人变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

（登记机关盖章）

2023 年 03 月 31 日

注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

（三）、近年完成的类似项目情况表 03

项目名称	青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2023 年度退化草原修复工程)标段三十
买方名称	曲麻莱县发展和改革局
买方联系人及电话	尼玛扎西、0976-8851800
合同价格	8849891.51 元
项目概况及投标人履约情况	人工种草 25880 亩包括：同德短芒披碱草、青海草地早熟禾、青海中华羊茅、牧草专用肥、颗粒有机肥等已完成。质保量，履约良好。
备注	已完工，后附中标通知书与合同

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标货物的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标货物的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

[玉树州·曲麻莱县][公开招标][材料设备]青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2023年度退化草原修复工程)标段三十[已发中标结果公告]



【信息时间:2024-02-01】 【阅读次数: 367 】 打印 关闭

青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2023年度退化草原修复工程)标段三十货物
中标结果公告
（货物类型）

（招标编号：E6301000076048320001030）

本项目已于2024年01月26日至2024年01月29日发布中标候选人公示，公示期内无异议，确定第1名中标候选人为中标人，现将中标结果公告如下：

盖章：

发布日期：2024年02月01日

招标人	曲麻莱县发展和改革局			
代理机构	青海凌星项目管理有限公司			
中标结果				
中标人名称	资格能力条件	中标价	交货（服务）期（天）	货物（服务）质量
青海泽标建设工程有限公司	完全响应	8849891.510元	360 （按合同约定执行）月	合格

青海凌星项目管理有限公司

中 标 通 知 书

青海泽标建设工程有限公司：

兹通知，由青海凌星项目管理有限公司组织，贵公司参加的“青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2023 年度退化草原修复工程)标段三十”（项目编号：青海凌星公招（货物）2023-202），经专家小组评定贵公司为本次项目的中标单位。

项目名称	青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2023 年度退化草原修复工程)标段三十
招标人	曲麻莱县发展和改革局
投标报价	8849891.51 元（捌佰捌拾肆万玖仟捌佰玖拾壹元伍角壹分）
交货期	360 日历天（按合同约定执行）

收到本通知书后 30 天内，请与招标单位联系，洽谈有关合同事宜。

招标人：_____　　采购代理机构：_____

（单位盖章）　　（单位盖章）

青海凌星项目管理有限公司

2024 年 02 月 02 日

Qinghai lingxing project management co. LTD

地址：青海省西宁市城中区南山路 15 号（城馨天悦 3 号楼二楼）

邮编：810001 联系电话：0971-8211766 传真：0971-8213766

扫描全能王 创建

青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目（2023 年度退化草原修复工程）施工合同书标段 三十

施工合同

发包单位：曲麻莱县发展和改革局

承建单位：青海泽标建设工程有限公司

签订日期：2024 年 2 月 5 日

扫描全能王 创建

施工合同

发包单位（以下简称甲方）： 曲麻莱县发展和改革局

承建单位（以下简称乙方）： 青海泽标建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方按照作业设计要求施工及有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目（2023年度退化草原修复工程）标段三十。

2. 工程地点：玉树州曲麻莱县。

3. 建设内容：围栏封育666万米、人工种草50万亩、退化草地改良10万亩。

二、承包范围、合同工期

1 承包范围：人工种草25880亩（具体按招标文件及工程量清单所含全部内容，严格按照投标文件承诺的事宜履行。

2. 合同工期：

计划开工日期：2024年5月。

计划竣工日期：2024年6月。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

扫描全能王 创建

三、 签订本项目合同的依据

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招、投标文件及澄清（变更）公告等；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）作业设计及图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、建设目标

1、草原改良 10.0 万亩（含鼠害防控），项目实施完成后项目区次年平均植被盖度提高 8%以上；高原鼠兔防控 10.0 万亩，每公顷有效洞口≤8 个或平均防控效果≥90%；

2、人工种草 50.0 万亩，项目实施后项目区当年牧草出苗数达到 180 株/平方米以上，项目建设次年植被盖度提高 10%-15%之间；

扫描全能王 创建

3、围栏建设：围栏封育 666 万米，通过项目实施使项目区退化草原得到充分休养生息，恢复草原自然调节功能，天然草原得到合理利用，促进草原生态系统良好发展。

五、施工质量要求

地块选择→草种组合搭配→施肥与播种→围栏建设→建后管护

在已确定的地块按照地形将拐点位置利用 GPS 定位进行标记，确定地块路线。

1、**技术方案**

1）、区域选择

选择植被盖度在 7～19%之间，土层厚度在 22-35cm 之间，坡度在 6-16 度之间的退化草地进行恢复治理。

2）、农艺措施

根据项目区地形条件，在施工过程中结合实际条件分别按不同地块以机械作业为主人工作业为辅的作业方式施工，人工作业由施工单位根据现场实际自行安排进行种植，人工费用类同机械跟班人工费。

（1）机械作业

免耕机械作业：使用 19 行以上分层免耕播种机进行播种，配套动力 90 马力以上，采用十字交叉，完成施肥、播种、覆土、镇压作业。

免耕机：选择适于退化草地改良治理的中、大型免耕机，

扫描全能王 创建

机身系铁链或轮胎镇压 1-2 遍。

机械检查：使用前，要对破土器（波纹盘）、开沟器（双圆盘）、覆土器（镇压轮）、弹簧、输种管、齿轮等检查校正，达到良好作业。

排种量调校：依据补播草种和基肥，调整肥料、大粒种子和小粒种子排量，检查疏通排种口。标定作业距离，精确称量肥料、大粒种子、小粒种子，按调校顺序，按设计播种（肥）量，分别调校排量，精度达到 98%以上。

防风措施：根据作业区气候条件，在补播机输种管前方加设挡风板，防止在大风天气作业时种子被吹散。

作业质量：每作业 2-3 亩，在作业线上间隔 5m 选择 5 个点，检查是否存在断条，同时检查播种深度，及时调校输种管。

播种深度：大粒牧草种子控制在 2-3 cm之间、小粒牧草种子控制在 1-2 cm之间。

3）、草种选择

选用青海当地生产的、适宜青藏高原生长、市场供应量充足的同德短芒披碱草、青海冷地早熟禾和青海草地早熟禾，种子质量要求达到国家规定的三级标准以上（种子净度、发芽率执行标准为 GB6142-2008、DB63/T1064-2012）。全部采用精选、断芒、定量包装的草种，要求草种检验机构出具种子质量检验报告。

扫描全能王 创建

表 5-3-1 种子质量要求标准

序号	名称	级别	净度/% ≥	发芽率/% ≥	种子用价/%用	其它植物种子数/（粒/kg）≤	水分/% ≤	备注
1	同德短芒披碱草	一	95	85	80.7	2000	11	执行 GB6142-2008
		二	90	80	72.0	3000	11	
		三	85	75	63.7	5000	11	
2	青海冷地早熟禾	一	96	85	81.6	2000	11	参照普通早熟禾 GB6142-2008
		二	93	80	74.4	3000	11	
		三	90	75	67.5	5000	11	
3	青海草地早熟禾	一	85	85	72.3	2500	11	执行 DB63/1064-2021
		二	80	80	64.0	3500	11	
		三	75	75	56.3	5500	11	

4）、播种

播种量：总播种量 5.5 公斤/亩，其中同德短芒披碱草 3.5 公斤/亩，青海冷地早熟禾 1.0 公斤/亩、青海草地早熟禾 1.0 公斤/亩。

2、施肥

底肥品种为颗粒有机肥，施肥量为 46 公斤/亩，颗粒有机肥质量标准执行（NY/T525-2021）。牧草专用肥施肥量 18 公斤/亩；质量要求达合格标准（肥料总养分、水分、粒度等执行标准为（GB/T21633-2020）。

表 5-3-2 有机肥料的技术指标要求及检测方法

项　目	指 标	检测方法
有机质质量分数（以烘干基计）%	≥30	按照附录 C 的规定执行
总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计）%	≥4.0	按照附录 D 的规定执行
水分（鲜样）的质量分数%	≤30	按照 GB/T8576 的规定执行

扫描全能王 创建

酸碱度（pH）	5.5-8.5	按照附录E的规定执行
种子发芽指数（GI），%	≥70	按照附录F的规定执行
机械杂质的质量分数，%	≤0.5	按照附录G的规定执行

表5-3-3 牧草专用肥技术参数

序号	项目	单位	指标值
1	总养分（N+P2O5+K2O)的质量分数/	%	≧35.0
2	水溶磷占有效磷百分率/	%	≧60.0
3	水分（H2O）的质量分数/	%	≦2.0
4	粒度（2.00mm-4.00mm）/	%	≧70
5	总氮（N)的质量分数/	%	≧16.5 标明值：18.0
6	有效磷（P2O5)的质量分数/	%	≧10.5 标明值：12.0
7	氧化钾（K2O）的质量分数/	%	≧4.0 标明值：5.0

六、合同价款

合同价款：中标金额大写：捌佰捌拾肆万玖仟捌佰玖拾壹元伍角壹分（￥：8849891.51元）。

七、付款方式

乙方在签订合同后，由甲方支付乙方预付工程款(即中标总价款的)30%;待完成工程总量100%后由甲方支付乙方工程款(即中标总价款的)45%，经县级自查验收通过后，甲方支付乙方工程款(即中标总价款的)22%；待一年质保期结束后甲方支付乙方工程款3%(即质保金)。

八、合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。若发现有转让等行为，甲方将责令其改正、扣款及终止合同。

九、违约责任

1. 乙方所提供的施工、技术标准不符合作业设计要求的应及时更换；更换不及时的，按逾期处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 施工质量不符合招标文件所规定的质量要求。甲方项目县有权拒绝验收，所造成的经济损失由乙方承担。

3. 乙方须按期完成施工，如超出施工限期的应承担延期罚金，以每延误天按合同价的2%。

十、不可抗力

1. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在5-10天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2. 除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现恶劣天气、暴雨雪情况亦视为不可抗力。

十一、双方职责

1、甲方向乙方提供施工所需的作业设计，并设计合理性负责。

2、甲方要按照乙方的当年交工进度，及时组织人员进行验收，并按期向乙方支付资金，不得无故拖延。

扫描全能王 创建

3、乙方要按照项目档案管理办法和项目监理要求如实做好项目施工档案，配合监理建档和归档工作。若乙方提供档案资料不齐全，甲方不予支付工程款，直到档案资料齐全方可支付。乙方在项目竣工验收前向甲方提供完整的施工档案资料，并在工程合理使用年限30年内保存最终审查成果文件及相关资料。

4、乙方对项目工程质量负责，如乙方实施项目效果达不到作业设计要求的标准，甲方有权要求乙方重新施工，产生的所有费用由乙方自行承担。直到达到作业设计要求的标准。

5、乙方在项目实施过程中，优先使用当地劳动力积极参与项目建设，提高牧民群众的经济收入。不准以任何理由扣发劳务人员工资和拖欠工程材料，保证民工工资及其他人员工资的的及时发放。

6、在项目实施过程中甲方与县生态保护站协调每个标段需配备一名当地管护人员进行全程监管。

十二、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起

扫描全能王 创建

诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十三、本合同双方签订之日起生效。一式_陆_份，均具有同等法律效力，发包人执_肆_份，承包人执_贰_份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

地　址：　　地　址：青海省玉树藏族自治州曲麻莱县约改镇行政新区二楼　　西宁市城中区南川东路 85 号 40 号楼 2 单元 261 室

电　话：0976-8851800　　电　话：0971-6249989

开户银行：农行曲麻莱县支行　　开户银行：中国建设银行股份有限公司西宁上尕庄支行

账　号：28750001040003154　　账　号：63050137360700000179

扫描全能王 创建

（三）、近年完成的类似项目情况表 04

项目名称	2023 年天峻布哈河国家湿地公园湿地补助项目包一
买方名称	天峻县林业和草原局
买方联系人及电话	王成、0977-8267328
合同价格	608000.00 元
项目概况及投标人履约情况	湿地修复工程:湿地 1000 亩退化湿地的修复，底肥品种为颗粒有机肥，施肥量为 35kg/亩。颗粒有机肥质量标准执行(NY/T525-2021)。牧草专用肥 10kg/亩，已完成。保质保量，履约良好。
备注	已完工。后附中标通知书与合同

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标货物的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标货物的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

中标(成交)通知书

青海泽标建设工程有限公司:

经评定，编号为甘肃东方竞磋（服务）2024-001采购文件中的2023 年天峻布哈河国家湿地公园湿地补助项目-包1，确定你公司中标（成交），中标(成交)价格为608000元。

自此通知书发出之日起30天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报我机构项目联系人确认。

采购人联系人：刘老师

电话：0977-8267328

代理机构联系人：马老师

电话：0971-8162728

邮箱：gsdfgczxyxgs2022@163.com

甘肃东方工程咨询有限公司

2024年02月27日

制 0.5-1.5 cm 之间。

（4）施肥

底肥品种为颗粒有机肥，施肥量为 35kg/亩。颗粒有机肥质量标准执行（NY/T525-2021）。牧草专用肥 10kg/亩，有机肥料的技术指标要求：

项目	指标
有机质质量分数（以烘干基计）%	≥30
总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计）%	≥4.0
水分（鲜样）的质量分数%	≤30
酸碱度（pH）	5.5-8.5
种子发芽指数（GI）%	≥70
机械杂质的质量分数%	≤0.5

（5）无纺布覆盖

对湿地退化严重区域进行无纺布覆盖。覆盖无纺布保水保温防水土流失（采用宽为 2.7 米的无纺布，每平方米重 20 克），无纺布铺设应贴实，条与条之间重叠 5cm 左右，用土或石块间隔压紧压实，防止吹胀或雨水冲毁。每亩按照 670 平方米计。

二、水系连通疏浚

修建堤坝：长 44 米，宽 1.2 米，高 1.6 米，用 ϕ 6@200 双层双向混凝土结构，强度为 C35，使用寿命年限 30 年。

三、巡护栈道维修

在 2005 米巡护栈道中对破损部分进行更换及刷防腐油，根据现场情况维修部分不低于 100 处。

四、科研监测中心站（点）扩修

对原有 40 平米科研监测中心站（点）扩修至 100 平米。

1、地基回填硬化，达到现有标高；

2、站点四周采用铝合金双层钢化玻璃，玻璃厚度 3mm；

3、屋顶采用 12mm 钢化玻璃，并加做一层拉动遮阳网；

4、正前方南侧做推拉门一个，两侧各放一扇推拉窗户

青海省政府采购
项目合同书

采购项目编号：甘肃东方竞磋（服务）2024-001

采购项目名称：2023 年天峻布哈河国家湿地公园湿地补助项目

包一

采购合同编号：GSDF-2024-001

合同金额（人民币）：608000.00（陆拾万零捌仟元整）

采购人（甲方）：天峻县林业和草原局 （盖章）

中标人（乙方）：青海泽标建设工程有限公司 （盖章）

采购日期：2024年2月2日

采 购 人（以下简称甲方）：天峻县林业和草原局

供 应 商（以下简称乙方）：青海泽标建设工程有限公司

甲、乙双方根据2024年02月27日2023 年天峻布哈河国家湿地公园湿地补助项目包一 项目（甘肃东方竞磋（服务）2024-001号）的磋商文件要求和采购机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为的608000 .00（陆拾万零捌仟元整）的2023 年天峻布哈河国家湿地公园湿地补助项目包一 项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 磋商文件；

2. 磋商文件的澄清、变更公告；

3. 成交供应商提交的磋商响应文件；

4. 磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5. 成交通知书；

6. 履约保证金缴费证明；

二、合同标的及金额

1. 标的名称：2023 年天峻布哈河国家湿地公园湿地补助项目包二。

2. 服务内容：湿地修复工程：湿地 1000 亩退化湿地的修复，公园内水系连通疏浚 44 米，巡护栈道维修 2005 米，科研监测中心站（点）扩修 60 平米。

3. 服务期：90 天（2024 年 月 日至 2024 年 月 日）。

4. 合同总价：608000 .00（陆拾万零捌仟元整）。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：完成本服务内容可能发生的各项费用，如人员工资、交通、利润、税金、招标代理费以及所有有关的管理成本和其他不可预见费等全部费用，且均为包干价，不随工作量的调整而变化。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、交付时间、地点和要求

1. 服务、实施时间：_____

服务、实施地点：_____

2. 乙方提供不符合磋商文件、磋商响应文件和本合同规定的产品和服务，甲方有权拒绝接受。

4. 甲方应当在服务完成后_____个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商文件、磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7. 乙方向甲方提供相关完税销售发票。

四、付款方式

_____

_____

_____

_____

_____

五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1. 乙方所提供的质量不合格的，应及时更换和调整；更换或调整不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的服务如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 甲方无故延期接受货物、服务和乙方逾期提供服务的，每天应向对方偿付未交货物的货款 3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的 5%，超过_____ 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

4. 乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金。

5. 乙方提供的货物或服务在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

6. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，

合同终止。

2. 除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现　　情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：_____

九、其他约定：_____

十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量监测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：_____

1. 本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2. 本合同未尽事宜，按《合同法》有关规定处理。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：中国建设银行股份有限公司西宁上尕庄支行

账号：63050137360700000179

联系电话：

签约时间：2024 年 3 月 27 日

合同备案部门：甘肃东方工程咨询有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：2024 年 3 月 27 日

附件 16：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（玛沁县自然资源和林业草原局）的青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育）（采购项目编号为：青海鼎新公招（货物）2025-017；投标包号：（包六）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六（颗粒有机肥），属于农业（制造业）行业；制造商为青海泽标建设工程有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 6216.648562 万元，资产总额为 6336.013213 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六（牧草专用肥），属于农业（制造业）行业；制造商为青海泽标建设工程有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 6216.648562 万元，资产总额为 6336.013213 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：青海泽标建设工程有限公司（公章）

企业法定代表人：李积英（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

泽标建设 ZE BIAO JIAN SHE

供应商名称： 青海泽标建设工程有限公司
联系人： 李积英
联系电话：
经营范围： --
营业地址： 青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室
供应商官网

基本信息 企业信息 法人信息 特定资质 信用信息

供应商名称	青海泽标建设工程有限公司	成立时间	
英文名称		简称/字号	
营业地址	青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室	邮政编码	810000
网址		企业电子邮箱	
对外联系电话		传真电话	
经济性质	其他有限责任（公司）	供应商类型	工程施工
所属经济行业	其他土木工程建筑施工	企业规模	小型企业
开户银行		银行账号	
供应商注册登记联系(经办)人	李积英	联系电话	
		传真电话	
		电子邮箱	
供应商基本情况简介	我公司于2020年04月07日，注册资金为2000万元，公司现有职工[illegible]，公司以发展为主题，以市场为导向，以效益为中心，以科技创新为根本，不断进行企业管理理念、管理制度、科学技术的创新，努力把企业建设成为技术高新化、经营规模化、管理集约化、效益高效化的工程施工为主的企业。经营范围：建筑工程；地基与基础工程；公路工程；轨道交通工程；市政公用工程建设活动；公路管理与养护；机电工程；水利水电工程；电力工程；输变电工程；通信工程；道路照明工程；建筑智能化工程；钢结构工程专业承包；施工专业作业；建筑装饰装潢工程；建筑幕墙工程；防水防腐工程；消防设施工程施工；环保工程施工；；园林绿化工程施工；电子工程安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；生态环境治理；河湖整治工程；水污染治理；地质灾害治理服务；沙漠化治理；草原病虫鼠害防治；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑劳务分包；体育场馆及场地设施建设；电动汽车充电基础设施运营及技术服务咨询；光伏项目技术开发、技术转让及运营管理；特种设备安装改造修理；机械设备安装；采暖炉销售及安装；标识标牌制作及安装；电动汽车充电系统及设备、建筑材料、机电设备、五金产品、金属材料、农机具、肥料、饲料、日用百货、劳动保护用品，办公设备及耗材、办公用品、消防器材、电子产品、太阳能光电产品、照明器具、混凝土销售；LED显示屏、液晶、等离子显示屏的生产、销售、租赁、安装及维修；建筑用石加工；网围栏及配套产品加工、安装；畜牧基础设施建设；暖棚建设；牧草、绿化苗木种植销售。 我公司是一个新兴的企业，一个有梦想的企业，一个正在高速成长的企业。我公司以"诚信为本、质量第一"的经营宗旨，牢固树立"没有质量就没有信誉，失去信誉就会失去市场"的思想，恪守质量是企业第一生命的承诺，努力拼搏，团结奋战，立足青海，面向全国，以锐意进取勇往直前的精神，努力为我国工程建设事业的发展做出贡献，为社会创造一批优质精品工程。 我公司[illegible]质量求生存，质量求发展"的经营理念，以"团结、敬业、扎实、高效"为企业精神，始终坚持"安全第一、质量第一、信誉第一"的服务宗旨，以实力与[illegible]为[illegible]工程，用财富和感恩回报社会各界的大力支持。 公司核心价值观：诚信务实 追求卓越 战略定位：以打造工程品牌为基础，立足青海，面向全国，走[illegible]发展		

青海泽标建设工程有限公司 6301012258973

青海泽标建设工程有限公司

附件 17：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为 56 人，安置的残疾人人数 / 人。且本单位参加（玛沁县自然资源和林业草原局）的青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025)退化草原修复工程(围栏封育)(采购项目编号为:青海鼎新公招(货物)2025-017;投标包号：（包六）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：青海泽标建设工程有限公司（公章）

企业法定代表人：李积英（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

附件 18：监狱企业证明资料（不属于监狱企业的无需提供）

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

投标单位：青海泽标建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李积英（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

附件 19：项目管理实施方案

项目管理实施方案

（格式自定）

青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六

实施方案

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

目录

第一章实施方案

（1）进度计划；

（2）起运、装卸、防护安装；

（3）物流路线；

（4）运输方案；

（5）物流跟踪及监控；

（6）仓储；

（7）安装施工方案；

（8）环境保护管理体系及措施；

（9）质量保证措施；

（10）项目验收方案

第二章　应急预案

（1）预防预警制度；

（2）安全保障措施；

（3）突发事件处理措施；

（4）工伤处理方案；

（5）农民工工资发放保障措施。

第三章　售后服务方案及承诺

（1）服务响应时间；

（2）技术支持；

（3）定期跟踪；

（4）服务人员及服务机构；

（5）售后服务方案。

第一章实施方案

（1）进度计划；

工程进度计划与措施

施工总进度编制原则及依据

施工总进度及编制原则

根据本合同工程的施工特点，结合我单位在以往类似工程中的施工经验，初拟施工进度编制原则如下：

严格按照招标文件规定的合同控制工期，科学合理安排施工程序及施工进度，确保节点工期及合同总工期提前实现。

现场施工条件及合同文件界定的施工条件。

紧紧围绕施工关键线路组织施工，在确保重点项目进度的同时，统筹兼顾好一般工程，使本工程整体协调推进。

充分发挥我单位的技术及装备优势，组织好工程配套的机械化施工作业，采用先进的施工技术、投入高素质的施工队伍、按现代项目法高水平管理，提高施工生产效率、加快工程施工进度，缩短工期，确保工程顺利进行。

对不可预见因素留有充分的回旋余地，并在施工中力求实现均衡生产、文明施工。

我单位在同类工程施工过程中积累的丰富经验和施工技术，为快速、高效地修建本工程奠定了坚实的基础。

我单位在考察现场获得的现场施工条件、工程地质等相关的基础资料。

工期保证措施

施工进度计划的动态控制

施工进度计划的控制是一个循环渐进式的动态控制过程，施工现场的条件和情况千变万化，项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息，不断将实际进度与计划进度进行比较，一旦发现进度拖后，要分析原因，并系统分析队后续工作会产生的影响，在此基础上制定调整措施，以保证项目最终按预定目标实现。

保证工期的管理措施

建立强有力的项目经理部，配置高效项目管理层。本工程施工的项目经理、工程技术人员、质检员、安全员等均由有丰富工程施工管理经验的人员担任，并针对技术、质量、安全、文明施工、后勤保障工作配置项目副经理主抓分项工作。

实行经济承包责任制，多劳多得，优质优价，调动全体员工的工作积极性。

严格执行奖罚制度，对各个工种、工序制定严厉的奖罚制度，对工期有重大影响的工序实行重奖重罚。

在总进度计划控制下，坚持逐月、逐周编制出具体工程部位施工计划和工作安排。如发现未能按节点工期完成计划，要及时检查，分析原因，迅速采取补救措施和调整计划。

定期召开工程例会，由工程施工总负责人主持，各专业工程施工负责人参加，听取工程施工进度问题的汇报，协调工程施工内部矛盾，并提出明确的计划调整方案。

对于影响工期的关键工序，项目经理要亲自组织力量，加班加点进行突击，有关管理人员要跟班作业，确保关键工序按时完成。

保证工期的技术措施

在施工生产中影响进度的因素纷繁复杂，如设计变更、技术、资金、机械、材料、人力、水电供应、气候、组织协调等等，要保证目标总工期的实现，就必须采取各种预防措施和克服上述影响进度的诸多因素，其中从技术措施入手是最直接有效的途径之一。

设计变更因素：是进度执行中最大干扰因素，其中包括改变部分工程的功能引起大量变更施工工作量，以及因设计图纸本身欠缺而变更或补充造成增量、返工，打乱施工流水节奏，致使施工减速、延期甚至停顿。针对这些现象，项目经理部要通过理解与业主意图，进行自身、会审和与设计院交流，采取主动姿态，最大限度地实现事前预控，把影响降到最低。

保证资源配置

劳动力配置：在保证劳动力的条件下，优化工人的技术等级和思想、身体素质的配备与管理。以均衡流水为主，对关键工序、关键环节和必要工作面根据施工条件及时组织抢工期及实行双班作业。

材料配置：按照施工进度计划要求及时进货，做到既满足施工要求，又要使现场无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。公司建立有效的材料市场调查和采购、供应部门。

机械配置：为保证本工程的按期完成，我们将配备足够的中小型施工机械，不仅满足正常使用，还要保证有效备用。如在现场配备自动计量配料的应急混凝土搅拌站，以防止商品混凝土因特殊原因（如交通原因）供应不上导致混凝土施工中断的现象；为确保在市电网通电的情况下也能正常施工，我们计划在工地配备一台 160KVA 的柴油发电机备用。另外，要做好施工机械的定期检查和日常维修，保证施工机械处于良好的状态。

资金配备：根据施工实际情况编制月进度报表，根据合同条款申请工程款，并将预付款、工程款合理分配于人工费、材料费等各个方面，使施工能顺利进行。

后勤保障：后勤服务人员要做好生活服务供应工作，重点抓好吃、住两大难题，工地食堂的饭菜要保证品种多、味道好，同时开饭时间要随时根据施工进度进行调整。

技术因素

实行工种流水交叉，循序跟进的施工程序，抢工期间昼夜分两班作业。

发扬技术力量雄厚的优势，大力应用、推广“三新项目”（新材料、新技术、新工艺），运用 ISO9002 国际标准、TQC 、网络计划、计算机等现代化的管理手段或工具为本工程的施工服务。

雨季施工技术措施

由于该工程全为野外作业，应充分作好雨天的施工准备，根据工程实际情况，预制件均可雨天在室内作业，各预制构件的钢筋制作加工也可在雨天进行室内作业。

准备好必须的防雨材料，做到小雨不停工。

雨水期间沟槽容易坍方，在松软土质处做好撑挡板，同时注意夜间的保护，雨水较多时，派专人用潜水泵抽水，防止场地积水和地沟、槽、井等泡水，造成损失。

做好道路维护，保证道路畅通，雨期前检查道路边坡排水。

做好物资的储存，雨期到来前，材料、物资应多储存，减少雨期运输量，以节约费用。准备必要的防雨器材，库房四周做好排水沟，防止物品淋雨浸水

而变质。

做好机具设备等防护，雨期施工，对现场的各种设施、机具加强检查，各配电箱要有防雨棚。

加强施工管理，做好雨期施工的安全教育，认真组织贯彻实施，防止各种事故发生。

（2）起运、装卸、防护安装；

一、网围栏起运管理

（一）运输前准备

物资清点：对照采购清单，核对网围栏立柱、网片、螺丝、卡扣等配件数量，确保无缺漏，并检查表面是否存在变形、锈蚀等质量问题。

包装加固：

网片采用缠绕式捆扎，每 5-10 片为一组，用高强度尼龙带固定，并在外层包裹防潮、耐磨的帆布或塑料膜；

立柱按长度分类，两端套上橡胶保护套，用铁丝或尼龙带捆绑成捆，避免运输中碰撞变形；

小型配件（螺丝、卡扣）装入密封袋后集中装箱，并标注清单。

车辆选择：根据运输距离和物资总量，优先选用厢式货车或配备防雨篷布的高栏货车，确保运输途中物资不受雨雪、沙尘侵蚀。对于偏远地区，可采用小型货车或拖拉机分段转运。

（二）运输组织

路线规划：参考物流主路线，优先选择路况较好的公路运输。对于乡村土路或陡坡路段，提前勘察路线，确保车辆通行安全；必要时协调当地牧民使用

牦牛、马匹等畜力进行短距离运输。

装载规范：遵循“重不压轻、大不压小”原则，将立柱等重物置于车厢底部，网片等轻质物资叠放于上方，并使用绳索或固定器将货物与车厢绑牢，防止运输途中晃动、滑落。

实时监控：为运输车辆安装 GPS 定位系统，通过物流管理平台实时跟踪运输进度，及时处理突发状况（如道路塌方、车辆故障）。

二、装卸作业管理

（一）人员与设备配置

人员安排：每辆车配备 2-3 名装卸工人，要求熟悉网围栏结构，掌握安全装卸操作流程。

工具准备：配备叉车、手动液压搬运车、撬棍、手套等工具，避免徒手搬运造成人员伤害或物资损坏。

（二）操作规范

卸货要求：

网片采用叉车或多人协作方式轻抬轻放，禁止拖拽或抛掷，防止网丝断裂或变形；

立柱应逐根卸下，避免整捆倾倒砸伤人员或损坏物资；

小型配件需专人清点，防止遗漏丢失。

临时存放：卸货后将网围栏物资分类堆放在干燥、平坦的区域，底部垫高 20-30 厘米防潮，并覆盖篷布，避免长时间暴露在阳光下加速材料老化。

三、防护措施

防锈处理：对金属立柱、网片表面喷涂防腐漆或镀锌层，运输装卸过程中

若出现涂层破损，安装前需补刷防锈漆。

防老化措施：采用高强度 PE 材质网片，添加抗紫外线助剂，降低高原强紫外线对材料的老化影响；存放时避免与尖锐物体接触，防止刮伤。

环境适应性：针对高原低温环境，选用耐低温的塑料卡扣和连接件，避免因冻裂导致围栏松动。

四、安装流程

（一）施工准备

场地测量:根据设计图纸,使用 GPS 定位仪或皮尺确定围栏边界,每隔 50-100 米设置界桩标记。

材料运输：将网围栏物资转运至安装点附近，减少二次搬运距离。

（二）安装步骤

立柱埋设:

按照设计间距（一般 2.5-3 米）开挖立柱基坑，深度不小于 60 厘米，底部夯实；

将立柱垂直放入基坑，回填土壤并分层夯实，确保立柱稳固，地面以上高度保持一致。

网片安装:

从一端开始，将网片顶部挂钩挂在立柱顶端，使用专用卡扣将网片与立柱固定；

调整网片松紧度，确保平整无褶皱，底部距地面保持 5-10 厘米间隙，防止牲畜钻入。

门栏设置：在主要通行区域安装活动门栏，门框采用加厚钢材制作，配备

锁具或搭扣，便于人员、车辆和牲畜进出。

质量检查：安装完成后，检查立柱垂直度、网片牢固度及整体平整度，对松动或安装不到位处及时加固。

五、安全与环保要求

安全作业：装卸、安装过程中，操作人员需佩戴安全帽、手套等防护用具；使用机械设备时严格遵守操作规程，避免机械伤害。

环境保护：施工过程中产生的包装废弃物、废金属等统一回收处理，禁止随意丢弃；避免施工机械漏油污染草原土壤。

通过以上规范流程，确保网围栏运输、安装高效有序，提升草原生态修复工程的防护效果与耐久性。

（3）物流路线；

一、运输货物概述

退化草原修复工程所需物资主要包括网围栏 。这些物资具有体积大、重量重、部分易受潮等特点，对运输和储存条件有一定要求。

二、起点与终点

起点：肥料等物资采购自周边具有相关资质和良好信誉的供应商，供应商分布于西宁、兰州等地的农资市场或生产厂家仓库。围栏材料一般从专业的建材生产厂家采购，部分厂家位于宁夏等地。

终点：大武乡、大武镇、东倾沟、拉加镇。

三、物流路线方案

公路运输为主干线

从西宁至玛沁县：物资在西宁集结后，通过 G0615 德马高速运输至玛沁县。

全程约 400 公里，路况较好，但部分路段为高原山路，需注意行车安全。运输车辆选择大型载重货车，根据物资的不同特性进行合理装载，如草籽做好防潮措施，采用密封车厢或加盖篷布。

支线运输深入乡村

物资抵达玛沁县后，根据各村的具体位置，安排小型货车或农用车辆进行支线运输。支线道路多为乡村土路或简易公路，路况相对较差，在运输前需对道路进行勘察，确保车辆能够顺利通行。对于一些交通不便的偏远村落，可能需要采用人力或畜力运输的方式，将物资转运至项目地点。

四、运输时间安排

考虑到高原地区冬季气候恶劣，道路积雪结冰，不利于物资运输，因此尽量避开冬季运输。最佳运输时间为每年的 5 月 - 10 月。

从供应商发货到玛沁县的主运输路线，根据距离不同，预计运输时间为 2 - 5 天。从玛沁县到各村的支线运输，根据路况和距离，预计 1 - 3 天内完成。确保物资能够及时送达项目地点，不耽误工程进度 。

五、运输过程管理

货物跟踪：利用 GPS 定位系统和物流管理软件，对运输车辆进行实时跟踪，掌握货物运输位置和状态。一旦出现异常情况，如车辆故障、道路堵塞等，及时采取应对措施，调整运输计划。

货物防护：针对草籽易受潮、肥料易挥发等特性，在运输过程中加强防护措施。草籽采用密封包装，并在车厢内放置干燥剂；肥料包装要密封良好，避免与空气接触。对于围栏材料，要做好防锈、防腐蚀处理，确保货物质量不受影响。

运输人员培训：对参与运输的人员进行培训，使其了解货物的特性和运输要求，掌握高原地区驾驶技巧和应急处理方法。严格遵守交通规则，确保运输过程安全、顺利。

（4）运输方案；

运输方案设计原则

安全可靠性：

安全可靠是运输方案设计的首要原则，为此在配车装载、道路运输、捆绑加固、装卸实施等方案设计中，运用了科学分析和理论计算相结合的方法，确保方案设计科学，数据准确真实，操作实施万无一失； 经济适用性：

为了维护业主方的经济利益，在本运输方案的设计过程中，工程项目经理部对多套运输方案进行筛选优化，采取最优化的技术方案，采用最适合的车辆物资，降低运输费用，最大限度的减少运输成本，确保本方案的经济适用性；可操作性:在运输方案制作和审定过程中，认真细致地做好前期准备，对各种可能出 现的风险进行科学评估，确保物资装载、道路运输、卸车等作业能够顺利展开，以此建立本方案的可操作性；

高效迅速性：

由于这批物资的运输质量要求高、现场路况较为复杂等情况，因此调动最适用的物资、人员，结合我公司操作类似项目的成功经验，保证按照双方既定的施工方案及相关规定执行运输操作，高效完成运输任务。

2 运输方案设计依据

目前国内最先进的运输装备和技术手段；中华人民共和国颁发的现行有关行业标准及规范；类似项目的成功经验。

3 运输组织方案

3.1 运输组织设计为了安全、优质、按时完成物资运输，成立专门的运输部门，作为项目部的一个机构代表项目部行使权力，全面负责该机构的对外业务联系和内部协调组织管理，确保大件物资在运输作业过程中处于受控状态。

◆运输作业组织措施

为了安全、优质、按时完成物资运输任务，项目部在运输前成立运输部门，运输部作为项目部的一个机构代表项目部行使权利，全面负责该部门的对外业务联系和内部协调组织管理，确保物资在运输作业过程中处于受控状态。

项目部指定专人担任部门经理。

运输部由技术组、安全组、质量组、外勤组组成。具体分工负责运输项目的各项工作。运输作业过程中组织四个作业组，分别在卸车装车、公路运输作 业过程中相互配合，前后衔接。

◆ 部门职责

部门经理

负责审批技术方案及其它计划；

对施工人员、机械物资、原材料、工艺技术、作业环境、资金等实施全方位管理和控制，使工程质量达到国家验收规范和合同规定的要求；组织有关人员对运输实施中的质量活动进行监控，使工程质量始终处于受控状态；按合同要求或施工规范及时组织检验和质量评定，按时向项目部通报工程质量、进展状况；组织均衡施工、文明施工、保持各工作部、各环节协调一致，防止因衔接不好而造成质量问题发生；负责运输施工过程中的各项事宜的最终裁决；对项目施工中未认真贯彻执行各项质量标准、程序要求和记录规定的现象，负领

导不力责任。对工程中出现的质量事故或甲方投诉负直接质量责任。

部门副经理

协助部门经理做好上述工作，作为现场负责人可以代替部门经理行使各项职权。

部门工程师

协助部门经理工作，负责运输作业现场的组织、协调及指挥，负责作业工程中技术、安全、质量的检查、指导及审核等工作。负责作业计划及措施的实施，并解决作业过程中的重大技术问题。

技术组

在部门工程师的领导下，负责整个运输过程中各种技术方案的设计、制定，负责作业现场技术交底。作业指导及作业过程控制和监督，作业技术措施的编写。解决作业过程中具体技术问题，并就作业技术方面的问题组织、实施技术革新。严格执行项目规定使用的各项标准、程序，参加质量事故调查处理及质量分析活动。

安全组

负责本部门的安全管理工作，负责检查指导并监督执行安全作业规章制度。

作业过程中每天召开安全作业例会，负责对施工人员的安全生产教育，组织安全作业检查，及时掌握安全作业情况，采取相应措施，保证作业安全。参加作业项目安全技术措施的审核、交底，参加事故的调查、分析和处理，同时做好现场安全管理工作的台帐。

质量组

编制质量检查计划、安全生产计划；组织进行质量安全事故的调查和处理；

具体负责运输货物的验收；负责索赔证据、资料的收集管理；负责索赔报告的编制和索赔谈判；负责采购的备品备件的验收工作。负责监督和检查本部门的作业质量，以及质量责任制的落实情况，严格执行各项质量管理及质量保证措施，严把过程质量关。

外勤组负责整个部门对上对下联络，保障后勤生活服务工作，安排好施工人员的住宿，饮食、医疗卫生及生活必须品供应等，负责安全保卫和交通，为施工人员配备劳保用品。

公路运输作业组

负责物资公路运输，以及运输沿途车辆维修、调整等一切与公路运输车有关的事宜。

运输作业总体安排

总体指导思想

认真贯彻公司的质量方针，本着安全第一、用户至上的思想，合理组织科学安排，精心操作，确保将物资安全、优质、按时运输到工地现场。

运输作业安排

我公司在人员、技术、物资等方面给予保障，确保各项工作到位。组织有关技术人员，按照业主对大型物资运输要求编制具体的运输方案，并对技术方案进行论证，确保方案的可行性、科学性和可操作性。 对该项目拟投入的车辆机具进行严格的检查和保养，确保其完好的技术状况，以便随时调遣使用。对作业中的每一各过程都进行认真细致的检查、计划、安排，并做好记录。

运输前期准备

掌握运输时间，提前做好物资的运输前期准备。技术部门部将技术方案移

交施工部门，施工部门在技术方案的基础上继续细化，做更为详细的具体施工方案；根据物资起运时间，发运前一周组织人员对道路进行勘察，保证物资顺利实施公路运输；申请公路超限运输手续；对施工人员进行技术交底，和安全培训；按照具体施工方案准备车辆及各种机具，并严格检验，保证其技术状况良好；实施公路运输的车辆、机具及人员提前到位。。

（5）物流跟踪及监控；

一、物流跟踪体系搭建

负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装、运输和控制，使得按时 保质地完成货物到现场。

货物到达台方指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同 要求。

做好工程设备材料和辅材的储存和堆放管理。

负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任，确保产品和工程的质量。

供货质量保障措施： 为了完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目建设，特别对所有项目设备、材料、工器具，在运输、存放保管、施工过等过程中，采取必要的保护措施。我司负责所有的保障措施工作。

甲方配合，提供相关的协助工作。

质量监督管理措施

成立专门的质量管理监督部门，指定项目质量监督的负责人。确定质量方针、 质量目标和清晰的职责分工。

严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。

对产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。

监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。

监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。

监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量。

监督整个供货计划的执行，确保顺利完成施工。

定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量监督工作成果。

产品出厂生产的质量保障措施

把好原材料采购的质量关，必须符合国家质量标准和产品设计要求。

严格按照质量管理体系的要求进行生产质量的管理，组建质量管理体系领导 小组。明确各级人员的职责。

加强全体员工的生产质量意识。

对生产中的各个环节进行严格把关，定期或不定期地进行检查。如发现不合 格产品，必须重新生产，达到合格为止。

对产品的生产过程进行记录和统计，保证生产质量过程的可追溯性。

外购产品和材料的质量保障措施

成立专门的采购部门，对采购的整个计划负责。

制定项目采购计划，完善所有采购文件。包括：项目名称、工程使用部位、 规格、数量、时间及价格要求；合同规定的质量保证规范、标准；工程技术规范的要求；采购进度计划；运输和交货条件；质量鉴定和检查方法。

所有进场材料必须有出厂合格证和必要的检验单据以备审核。

选择优良的生产厂家和供货渠道，保障货物的质量。

现有主要设备和检测设施的保障措施

明确项目所需的主要设备和检测设施类型和数量清单。

指定专业的设备和检测设施管理人员，保障整个工程中的设备和检测设备的安全。

检查现有设备和检测设施的存货量及检测记录。确保有足够的数量和合格的质量。

对设备和检测设施进行定期的检测和保养维护。

明确设备和检测设施的运输要求、使用技术要求和仓储保管要求。

对技术较强的大型设施，派遣专业的技术人员进行现场安装、检查和维护。

包装、运送过程中的产品质量保障措施

在运送前，对成品进行必要的包装。原产品包装符合运送要求的，可以使用原包装；否则要更换或附加新的包装。包装上要标有适当的运输和搬运记号。

根据产品类型，选用适当的运输工具。如控制器类的电子装置可用小型 车辆；运送至外地的成品，必须用封闭型车辆运输。6. 到货验收时的质量保障措施。

货物按照计划运送到甲方指定地点之后，台方负责人和我司工程师共同接收 货物并验收。

按照供货清单，核对货物名称、规格、数量。

进行开箱验收。包括设备外观、配件、说明书、合格证等装箱内容。

如果货物不符合合同标准要求或者损坏缺少，不予签收。我司负责更换或者补货，保证不影响施工进度。。

（6）仓储；

（7）安装施工方案；

设计思路

围栏封育 385 万米，根据各项目户退化草地面积、草原生态补助奖励政策禁 牧区草畜平衡区的划定、地形状况、牧户草场分界情况，按照实际需求，在草畜 平衡区围建围栏封育。

在每个围建单元门上要标明项目名称、标段号、围栏长度、施工单位名称等； 每个围建单元通过四至界线拐点或轨迹定位，确定围栏长度。

2. 围栏建设标准

围栏材料、基本参数与施工安装均参照《编结网围栏》（JB/T 7138-2010）、《镀锌钢丝围栏网基本参数》（JB/T 7137-2007）、《编结网围栏架设规范》（JB/T 10129-2014）编结网围栏的规格（网片为缠绕式）、基本参数、 技术要求和检 验规则执行。

2.1 编结网

网围栏选用 91L8×110×50 型编结网网围栏，编结网的规格及参数应符合下 表规定。

表 5.2-1 编结网网围栏的规格及技术参数 单位：mm

规格	纬线根数	网宽公称尺寸	经线间距	钢丝公称直径			自上而下相邻两纬线间距
				边纬线	中纬线	经线	
91L8/110/50	8	1100	500	2.8	2.5	2.5	200 、180 、180、150 、130、130、130

自上而下第四根纬线为直径 2.8 毫米的钢丝。

编结网的具体技术要求须满足《编结网围栏》（JB/T 7138-2010）的相关

技术要求。

2.2 钢丝

考虑到网围栏刺丝对野生动物生存具有一定的威胁，将围栏顶部刺丝换成直 径为 2.8 毫米的镀锌钢丝。抗拉强度应达到 900~ 1500MPa，锌层重量（热镀锌不 小于 90g/m2 ，电镀锌不少于 45g/m2 ）。

2.3 支撑件

钢制支撑件的规格及参数应符合下表规定。

表 5.2-2 支撑件的规格及技术参数

名称	尺寸长度≥mm	材料规格 mm
大立柱、门柱、角柱	2000	热轧等边角钢 90×90×8
中间柱	2000	热轧等边角钢 70×70×7
小立柱	2000	热轧等边角钢 40×40×4
地锚、下立柱	600	热轧等边角钢 40×40×4
支撑杆	3000	电焊钢管 50
小立柱横梁	200	热轧等边角钢 40×40×4

支撑件的具体技术要求须满足《编结网围栏》（JB/T 7138-2010）的相关技 术要求。支撑件表面应统一涂绿色防锈漆，确保涂层均匀，无裸露和涂层堆积表 面。

2.4 连接件

（1）绑钩：绑钩的材料应为抗拉强度不低于 350MPa 。直径为 2.50 毫米的 镀锌钢丝，每根长度 200 毫米。

（2）挂钩：挂钩的材料应为抗拉强度不低于 350Mpa 。直径为 2.50 毫米的 镀锌钢丝，每根长度 200 毫米。每 10 米 2 个。

2.5 围栏门

围栏门的框架采用 GB/T 13793 中 φ25 的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构， 单扇高为 1300 毫米，宽为 1500 毫米；原材料采用 30×3 毫米扁铁，40×40×4 毫 米角钢，1.5 毫米钢板；围栏门的扁铁间距为 150 毫米；围栏门应焊接牢固，焊 缝平整，无烧伤和虚焊；围栏门应涂防锈漆和银粉，涂层均匀，无裸露和涂层堆积表面。

围栏门的具体技术要求须满足《编结网围栏》（JB/T 7138-2010）的相关技 术要求。

图 5.2-1 网围栏配套大门

3. 标志、包装、运输及贮存要求

（1）每卷编结网、钢丝应有标牌，标牌上应注明：

a. 制造厂名、厂址；

b. 产品名称；

c. 产品规格及标记；

d. 生产日期及出厂编号；

e. 执行标准。

（2）编结网卷外径不得大于 500mm ，用直径不小于 2.0mm 的钢丝捆绑牢固，钢丝头不得外翘。

（3）钢制小立柱每 5~10 根一捆，用直径不小于 2.0mm 的钢丝捆绑牢固。

（4）大立柱、门柱应喷写生产企业名称、生产日期、项目名称及标段号、

建设日期。

（5）围栏门的标志：左边为产品名称、生产单位、执行标准、生产日期，右边为项目名称及标段号、建设单位名称、施工单位名称、建设年月。

（6）挂钩、绑钩应入袋包装，袋口封闭良好。

（7）网围栏出厂时。应附下列文件：

a. 产品合格证书；

b. 安装说明书。

（8）运输及贮存时应避免与酸碱盐类物质接触。

（9）运输及贮存时应就地码放整齐。

4. 围栏施工安装

4.1 一般规定

（1）所有零部件必须检验合格，外购件必须有合格证明方可安装。

（2）网围栏的施工安装应参照《编结网围栏架设规范》（JB/T 10129-2014）以及本设计相关要求执行。

（3）施工人员应最受有关安全要求及劳动保护规定，工作时穿工作服并佩戴安全帽、防护手套、防护靴。

（4）不应使用拖拉机或其他机动车辆张紧编结网和镀锌钢丝。

4.2 围栏架设准备

（1）对围栏场地进行勘测，结合现场情况，按设计要求确定围栏线路及施工方案，围栏建设安装时必须留有野生动物迁徙通道或牧道。

（2）备好施工工具及安全保护用品，熟悉并掌握各类施工工具的结构特点及使用方法。

（3）清理围栏线路上的障碍物。

4.3 围栏定线

（1）平地定线

在围栏地块的线路两端各设一标桩，从起始点每隔 30m 各设一标桩，全线标桩完成后应连成直线。

（2）起伏地段定线

在围栏地块的线路两端各设一标桩，定准方位。中间遇小丘或凹地时，应按 地形的复杂程度增设标桩，要求能同时观察到三个标桩并使各标桩连成直线。

4.4 立柱设置与安装

（1）配套网围栏根据地形平均 10 米设 1 根小立柱，平均每 400 米应设 1 根中立柱，每个单元拐角处或直线平均每隔 1000m 设 1 根大立柱；

（2）在围栏线路的走向发生变化时，若围栏线路形成的最小夹角不大于 120 度时，应安装角柱，大于 120 度时应安装中间柱；

（3）各种立柱应埋设牢固，与地面垂直，埋入地下部分不得少于 0.6 米。

（4）每根大立柱或角柱至少安装 2 根支撑杆，每根中间柱至少安装 1 根支 撑杆，支撑杆的支撑方向应与围栏线路的方向一致。支撑杆的尾部翼板应完全埋 入地下，并复土夯实。拧紧支撑杆与中间柱或角柱的联接螺栓。

（5） 中间柱、小立柱安装后应与水平面垂直，在柱子高出地面部分的 1000mm 内，小立柱的倾斜应小于 50mm；中间柱倾斜应小于 10mm；角柱向外 倾斜应小于 50mm。

4.5 围栏架设

（1）施工程序：固定门柱、角柱和中立柱，展开网片一固定起始端一专用

张紧器固定一夹紧纬线一实施张紧一绑扎固定网片一移至下一个网片段施工。

（2）从中间柱的一端开始，沿围栏线路铺放编结网，将编结网铺在围栏路线的内侧。铺放时应使编结网的纬线间距小的一端靠向立柱，起始端留 50 mm~80 mm 编结网。

（3）编结网的一端剪去一根经线，将编结网竖起，把每一根纬线线端与起始中间柱绑扎牢固，并使下边纬线与地面之间的距离不大于 150mm。

（4）每铺放围栏网到下一个中间柱时，均将编结网竖起并初步固定。若将两部分编结网连接在一起须用围栏线绞结器接头。

（5）安装张紧器张紧围栏，各纬线张紧力为 700N~900N ，整片围栏受力应 均匀。

（6）将围栏另一端相对中间柱的位置除去一根经线， 自中纬线分别向上向 下将每根纬线分别绕中间柱绞紧。

（7）将编结网自边纬线向中间逐一绑扎在立柱上，编结网的每根纬线均应与立柱绑结牢固，所有的紧固件不得松动。

图 5.4-1 网围栏拉设安装示意图

4.6 围栏门安装

（1）围栏门位置可根据牧户要求设置，在地势平坦处安装围栏门；大门应安装牢固，转动灵活。

（2）门柱的安装方法与角柱相同。每个门柱至少安装 2 根支撑杆以及 2 套 拉线、地锚。

（3）在每个围建单元门上，左边为产品名称、生产单位、执行标准、生产日期，右边为项目名称及标段号、建设单位名称、施工单位名称、建设年月。

5. 后期管护

按照谁受益、谁管护的原则，对建设后的围栏进行移交，由受益牧户自行管 护，对损坏的围栏应及时修补。同时，结合草原生态管护员职责，强化围栏后期 管护。在每个围栏建设单元门上标明项目名称、围栏长度、建设单位名称、施工 单位名称等重要信息，每个围栏建设单元通过 GPS 航迹、航点定位。。

（8）环境保护管理体系及措施；

环境保护措施制定指导思想

在本工程的施工全过程中，我们将全面运行 IS014000 环境保护体系标准，系统的采用和实施一系列环境保护管理手段，以期得到最优化的结果。我们在建设施工的全过程中，根据客观存在的粉尘、污水、噪声和固体废物等环境因素，实施全过程污染预防控制，尽可能的减少或防止不利的环境影响。预防为主，加强宣传，全面规划，合理布局，改进工艺，节约资源，为企业争取最佳经济效益和环境效益。

环境保护措施

环保施工管理制度

（1）由项目副经理负责，对施工现场按照各劳务队伍、分包单位的作业范围划分环保责任区，并和各区域负责单位签订绿色施工包保责任书，明确职责和违约责任。

（2）按照责任书的范围，项目综合办公室负责对各施工区域进行定期（每周）的绿色施工检查，发现不符合的地方，提出整改意见，并填写“隐患通知单”下发；发现严重不符合的情况，立即汇报给项目经理部，会同技术人员提出整改方案下发。

（3）各劳务队伍抽调一定数量的专职绿色施工人员，组成工地的专职绿色施工队伍，负责对现场进行日常的清洁、整理，以及检查、纠正等。

（4）每周召开一次“施工现场安全文明施工和绿色施工工作例会”，项目各相关职能部门及各劳务队伍、分包单位负责人参加，总结环保管理情况，对于管理部门提出的“隐患通知单”、“整改方案”，定时、定人的落实完成，由项目进行监督。

环保施工措施

施工生产废水控制措施

（1）本工程用地周围无污水排放管线，因此在工地出入口处、场内固定厕所附近设立沉淀池，由专人负责联系环卫公司定期清掏淤积物、抽排污水。

（2）工地生产废水和雨水分开排放，单独设立场内管网；生产污水排入生产污水沉淀池；雨水排放沿着现场周圈围墙布置，可将收集的雨水用于场内绿化及洒水降尘。

（3）运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可由环保部门抽排到场外处理或回收用于洒水降尘。

（4）乙炔发生罐污水排放控制。施工现场由于气焊使用乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒，要求专用容器集中存放，倒入沉淀池处理，以免污染环境。

（5）油漆油料库的防漏控制。施工现场要设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其它物资，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理，储存、使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。

（6）禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

（7）安全环保部门组织专人定期检查场内排水管线、沟槽的畅通情况，每

半月定期清理淤积物，保证排放畅通。

环境保护的具体措施

实行环保目标责任制

把环保指标以责任书的形式层层分解到有关单位和个人，列入承包合同和岗位责任制，建立一支懂行善管的环保自我监控体系。

加强检查和监控工作

要加强检查，加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测和监控工作。要与文明施工现场管理一起检查、考核、奖罚。及时采取措施消除粉尘、废气和污水的污染。

保护和改善施工现场的环境，要进行综合治理

一方面施工单位要采取有效措施控制人为噪声、粉尘的污染和采取技术措施控制烟尘、污水、噪声污染。另一方面，建设单位应该负责协调外部关系，同当地居委会、村委会、办事处、派出所、居民、施工单位、环保部门加强联系。

要有技术措施，严格执行国家的法律、法规

在编制施工组织设计时，必须有环境保护的技术措施。在施工现场平面布置和组织过程中都要执行国家、地区、行业和企业有关防治空气污染、水源污染、噪声污染环境保护的法律、法规和规章制度。

维护自然生态环境的措施

施工便道、施工现场生产、生活房屋、石料堆放和材料加工场及取（弃）土场等一切临时生产、生活设施的布置在指定规划的区域内，尽量选择裸露的荒地修建生产、生活设施，满足有关要求，避免因临时工程修建的随意性而破

坏地表植被而人为恶化生态环境。机械、车辆横向走便道，纵向走路基，严禁超越规定线路乱行驶，压坏草地、植被。

为维护自然生态系统的平衡，对公路两侧的永久用地，按照环保及水土保持要求，根据实际情况，按照设计要求采用撒种草籽，营造防风固沙林，移植草皮，恢复植被等措施，维护和改善生态平衡系统。

营造良好的生活环境。在施工现场各生活区设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，同时生活区周围铺植草皮。

设置环境监测点

施工中，严格按招标文件和相关规定的方案，设置环境监测点，以监测施工对周边环境的影响，并采取相应的措施，以保证当地的环境。

生态环境保护

施工期间全体施工人员要遵守《野生动植物保护法》等法令，做好自然区内的动植物保护工作，特别是珍稀野生动植物的保护。

（1）保护野生植物的措施

自觉执行和接受国家、青海省及当地野生动植物保护部门的监督和检查，精心保护原有植被。对标段界内的有价值植物作到尽力维护，必要时采取迁移保护，工程完工后恢复。

请有关专家介绍被保护珍稀植物的种类，复制图片张贴在便道通过地段和临时场地，严禁施工人员随意采挖野生植物，如发现有珍稀植物时，立即进行移栽保护并上报有关部门。

制定严格的管理制度，限制施工人员和车辆的活动范围，施工机械、运输车辆等按规定线路行驶，在划定的范围内作业，严禁碾压破坏植被。

（2）保护野生动物的措施

不追赶或惊吓野生动物，充分关心野生动物的自然习性。

严格执行《野生动植物保护法》等相关法规，施工期间，严禁施工人员伤残、猎杀野生动物，对违章者追究法律责任；

施工期间为动物提供迁移或游串通道；如野生动物发生意外时，给予必要的救助并及时通知相关管理保护机构；污水及霉变食物施工废弃物、生活垃圾按防止污染及卫生要求进行处理，防止对动物造成伤害；

不在野生动物栖息地建造临时工程和设置取土场。

大气环境保护

施工现场临时道路必须硬化，临时路面采用泥结石路面，经常洒水润湿，减少道路扬尘。

清理垃圾时运输车辆必须加以覆盖，防止道路遗洒，弃土(垃圾)场通过当地环保部门的同意方可弃土。垃圾必须分拣分别处理，不得含有易挥发性物质。

水泥尽量采取罐装，石灰尽量袋装运输，做不到时要加棚布遮盖。隧道弃碴、工程用砂等在运输途中要采取措施防止沿途撒漏，并遮盖防止扬尘，确保运输车辆所经地区的大气不受污染。

路基填土时保证土质的含水量，运运土方的车辆加后挡板并覆盖，防止道路遗洒和扬尘。

严禁烧煤、木材等发烟物质。食堂使用煤气灶，燃料采用罐装液化气。

对旱季施工扬尘，采用洒水降尘，减少粉尘污染，特别是在居民区和水源地更加注意。

施工现场垃圾渣土要及时清理出现场。

车辆不带泥砂出现场措施。

水环境保护

施工及生活污水的排放遵循清污分流、雨污分流的原则，各种施工废油、废液集中储积，集中处理，严禁乱流乱淌，污染水源，破坏环境。

施工作业产生的污水经过沉淀池沉淀，并经过净化处理，符合要求后进行排放。

食堂废水按规定设置隔油池，定期处理油污，污水经过处理后排入污水管道。施工、生活产生的经过处理的废水严禁排入农田。

现场厕所采用封闭式，并经常冲洗。化粪池经常清理。

废弃垃圾中不得含有有毒有害物质，避免雨水冲洗后对地表、地下水造成污染。

禁止将有毒有害废弃物作土方回填。

施工现场 100 人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期掏油和杂物，防止污染。

工地临时厕所，化粪池应采取防渗措施。

化学药品，外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境。

施工噪声、振动和光的控制

为减少噪声等对周围居民的影响，施工中采取措施或改进施工方法，使施工噪音、振动达到施工场界环境标准，其措施和方法报监理工程师批准。

作业辐射噪音强的施工机械如搅拌机等在夜间停止施工作业，夜间施工时大型运输车辆尽量绕开村庄行驶。

合理安排工序，夜间施工要尽量降低噪音；搭设机械棚，将施工中声音较

大的机械放入室内。

严格控制人为噪声。

凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间。

从声源处降低噪音

尽量选用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺。

在声源处安装消声器消声。

在传播途径上控制噪声。

采取吸声、隔声、隔振和阻尼等声学处理的方法来降低噪声。

夜间施工机械车辆经过居民区附近时尽量不开大灯；场内照明灯的照射方向也要注意不要直射居民区。

有毒有害废弃物的管理措施

设专人对现场有毒有害废弃物负责鉴定、统计、收集、存放和外运销毁。

对有毒有害废弃物做到不漏项、收集及时、存放集中，存放处做到全封闭，并防止渗漏。

定期对现场有毒有害废弃物的管理情况进行检查，对有可能产生有毒有害废弃物的场所和施工部位跟踪监测，及时收集处理。

对有毒有害废弃物的处理，遵循有关部门的规定，运到指定的场所或单位进行销毁，并保证运输过程中不泄漏。

临时工程环境保护措施

生产、生活设施修建，要尽量避免对植被的破坏。施工、生活场地范围内要做好集水、排水工作，不阻塞地面径流自然通道，防止壅水和场地冲刷。

施工中修建的临时设施，工程交验后必须在规定的时间内予以拆除，并尽

可能恢复原有地形、地貌。

生活区环境保护措施

生活区临时工程的修建，本着方便生活、利于生产，少占农田及植被地的原则，统筹安排，合理选址，并上报当地土地、环保部门审批，主动接受监督检查。

生活区要相对集中，选择避风向阳，交通方便距水源近的地段修建，设公共卫生间。集中建垃圾站、废水净化池、化粪池，按环保部门的要求，定期清理，避免生活垃圾污染环境。

临时工程修建、拆除时，产生的废弃物，按当地环保部门的要求，弃于指定的地点处理。

生产生活垃圾处理

生产生活垃圾按照环保的要求，用密闭容器分类集中回收，定期采用垃圾清运车拉到就近的垃圾处理厂统一妥善处理，或按要求进行填埋处理。

机械设备出现一般故障在现场修理时，在地面铺旧报纸和棉纱接吸废漏油，防止废油污染环境。

完工清场的环境保护措施

完工清场工作依据完工一段、清理一段、防护一段的工作原则进行。每当一段工程完工之后，对现场施工临时工程进行拆除，拆除的废物运至弃土场。

清场工作加强对施工过程中遗留的污染源进行彻底调查，对固体污染物运至当地环保部门指定的垃圾场进行掩埋，不得就地处理。严禁现场焚烧固体污染物。

临时用地工程进行复耕还种处理，并对施工过程中破坏原有植被的区域进

行绿化。

5.8.4 施工现场卫生管理

施工现场必须建立健全卫生管理和长效保洁制度，负责落实各项卫生防病措施，开展爱国卫生运动，搞好建筑施工现场“除四害”及消杀工作，保持工地内部生活环境整洁。

施工现场职工食堂必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的规定，《卫生许可证》和饮事人员《健康证》齐全。

施工现场临时住宅按照干燥通风、采光良好和整洁卫生的原则搭设，现场临时住房要建立卫生责任制度，专人管理。

施工现场必须建有符合卫生标准的水冲式厕所和浴室；设专人管理，保持卫生清洁，并定期施放药物杀灭蛆、蝇，做到无蝇、蛆，基本无臭味。

环境保护措施

防止对大气污染

施工阶段，定时对道路进行淋水降尘，控制粉尘污染。

建筑结构内的施工垃圾清运，采用搭设封闭式临时专用垃圾运输或采用容器吊运或袋装，严禁随意凌空抛撒，施工垃圾应及时清运，并适量洒水，减少粉尘对空气的污染。

其他易飞扬、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取措施，减少污染。

现场内所有交通路面和物料堆放场地全部铺设混凝土硬化路面，做到黄土不上天。

在出场大门处设置车辆清洗冲刷台，车辆经清洗后出场，严防车辆携带泥

沙出场造成道路的污染，特别是泥浆清运车，必须封闭严实，轮胎清洗干净才出场。

防止对水污染

确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进雨水管网。

施工现场设沉淀池，将废水经过沉淀后排指定污水管线。尤其是泥浆用定点沉淀后，再用编织袋运出场外堆放。

现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，污水经沉淀后再排入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。

加强对现场存放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

节能措施

制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。

优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。

施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。

建立施工机械设备管理制度，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。

施工用电及照明。临时用电优先选用节能灯具，临时线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。

节地与施工用地保护

节地措施

应根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角。

临时用地保护

应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境；红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。

施工总平面布置

施工总平面布置应做到科学、合理，充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。

施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。

临时办公和生活用房应采用经济、美观、占地面积小、对周边环境影响较小，且适合于施工平面布置动态调整的轻钢活动板房等标准化装配式结构。生活区与生产区应分开布置，并设置分隔设施。

施工现场围墙宜采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地

（9）质量保证措施；

1. 质量保证体系与措施

1.1 工程质量承诺

1.1.1 工程质量：达到合格标准。若因我公司原因造成工程质量达不到验收合格标准，则业方可按照不合格项处理：我公司无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

1.1.2 保证按照设计图纸施工，充分表达设计意图，确保装饰效果要求。

1.1.3 保证执行国家《建筑安装工程质量检验评定统一标准》及《建筑装饰工程施工及验收规范》，严格操作规程，确保工程的使用功能。

3.1.4 保证不使用劣质及不合格材料，并确保所有使用材料均有出厂合格证或检验报告及出厂质量证明书。

1.2 质量保证体系及措施

1.2.1 质量保证体系

1.2.2 建立健全的质量保证组织体系：

根据项目管理的要求，我司将严格按 ISO9000 标准、我公司的《质量手册》、《程序文件》建立本项目质量管理体系，并制定项目质量计划，推行 ISO9000 国际质量管理和质量保证标准，以合同为制约，强化质量管理与质量控制。项

目经理部推行专业责任工程师负责制，施工全过程对工程质量进行全面的管理与控制；同时使质量保证体系延伸到各施工队组直至各主要管理岗位；对项目质量目标进行层层分解落实到各施工基层单位，通过严谨的管理确保总目标的实现；通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量始终处于有效的控制状态。

项目经理部岗位职责

（1）负责公司质量方针在本项目的贯彻实施，确保本项目质量目标的实现。

（2）确保本项目质量管理体系的正常运行。

（3）负责本项目质量职责的分配，确保项目岗位质量职责的落实。

（4）参与项目实施过程的策划，组织质量计划的编制。

（5）负责组织项目施工准备工作。

（6）负责签订分包工程合同。

（7）负责建立项目与顾客的沟通渠道，并实施有效沟通。

（8）组织工程交付和工程保修并参加工程回访。

（9）审批产品防护措施。

（10）参与顾客满意度测量。

（11）参与程序规定级别的不合品的评审。

（12）参与项目工作环境的管理。

（13）组织项目接受内审。

（14）参与数据分析过程、改进过程实施。

（15）每季度检查项目部各岗位职责落实情况和质量目标的实现情况并进行统计。

项目副经理：

（1）贯彻公司质量方针，实现项目质量目标。

（2）负责本项目的技术质量管理工作。组织编制技术文件。

（3）组织项目部参加项目实施过程的策划，组织质量计划的实施。

（4）组织参加图纸会审，负责落实图纸会审遗留问题的解决。

（5）组织对关键过程实施控制。

（6）负责本项目工艺样板的申报。

（7）负责产品标识和可追溯性过程、过程的监视和测量过程的实施的控制。

（8）负责向分包方进行质量计划交底。

（9）负责组织工程配套设备的验证。

（10）负责组织对顾客财产的验证并负责检查其贮存、维护情况。

（11）负责产品的监视和测量过程实施的控制

（12）负责组织编制防护措施，组织防护工作的检查。

（13）负责组织制订冬雨季施工措施及特殊气候对施工环境影响的相应措施。

（14）负责按规定组织施工过程中不合格品的评审及处置。

（15）负责组织分项、分部工程评定。

（16）负责组织工程竣工资料的收集、整理和报审

（17）负责工程预验收的申报并参加预验收。

（18）负责进入本项目的监视和测量装置的控制。

（19）组织编制工程使用说明书。

（20）实施内部沟通。

（21）参与施工过程中的顾客意见的收集、处理。

（22）参与数据分析、纠正措施的制定、实施。

（23）参加培训学习。

（24）接受内部审核。

（25）负责执行项目经理分配的其它职责。

项目总工程师：

（1）贯彻公司质量方针，实现项目质量目标。

（2）负责采购过程、基础设施过程实施的控制。

（3）负责与顾客有关的过程、顾客满意度的监视和测量过程实施的控制。

（4）组织对顾客财产的识别和管理。

（5）负责组织项目安全生产和文明施工规章制度的编制及实施。

（6）参与项目质量计划、施工组织设计的编制。

（7）组织项目施工计划的编制及实施。

（8）批准项目月度需用计划。

（9）参与过程的监视和测量。

（10）参加培训、学习。

（11）参与数据分析及纠正措施的制定、实施。

（12）负责执行项目经理分配的其它职责。

施工员：

（1）贯彻公司质量方针，实现项目质量目标。

（2）负责本专业施工生产、技术、质量和安全的控制。

（3）参与质量计划、施工组织设计、施工方案和专业作业指导书的编制。

（4）参加图纸会审。

（5）负责对作业人员进行技术交底并督促按交底实施。

（6）按需发放施工图纸、作业指导书、施工方案、专用作业指导书。

（7）编制月度施工计划及相关的需用计划。

（8）组织操作人员进行自检、互检并复核自检。

（9）对本专业的关键过程实施进行控制。

（10）负责设计修改的标识及交底。

（11）负责本专业产品的防护及控制。

（12）参加检验批、分项、分部工程的验收。

（13）负责按规定对施工过程中不合格品进行评审并组织处置。

（14）负责作业人员监视和测量装置的检查。

（15）参与顾客提供的物资、半成品的验证。

（16）负责施工过程中的半成品的产品标识及有追溯性要求的产品的标识。

（17）参与安全生产、文明施工的管理。

（18）参与过程的监视和测量。

（19）负责及时、真实、准确地形成本专业的工程资料。

（20）参与施工过程中的顾客意见的收集、处理。

（21）实施内部沟通。

（22）参与数据分析、纠正措施的制定、实施。

（23）参加培训学习。

（24）接受内部审核。

（25）负责执行项目经理分配的其它职责。

质检员：

（1）贯彻公司质量方针，实现项目质量目标。

（2）负责工程质量的监督检查工作。

（3）负责施工过程中各种检查和试验结果的核认。

（4）按程序规定对不合格品实施控制。

（5）负责项目工程质量控制资料、安全和功能检测资料的审核、收集、保管工作。

（6）负责对项目所使用的监视和测量装置进行检查。

（7）负责对施工过程中的检验试验状态进行标识。

（8）参与工程配套设备的验证。

（9）组织检验批质量的检查评定和报验。

（10）参与分项、分部工程质量的检查评定，参加监理组织的验收。

（11）参与工程竣工资料的收集、整理工作。

（12）参加单位工程的预验收及竣工验收。

（13）参与施工过程中的顾客意见的收集、处理。

（14）实施内部沟通。

（15）参与数据分析、纠正措施的制定实施。

（16）参加培训学习。

（17）接受内审。

（18）负责执行项目经理分配的其它职责。

安全员：

（1）贯彻公司质量方针，实现项目质量目标。

（2）负责项目安全生产实施的监督检查工作。

（3）协助项目经理对进入施工现场人员的安全教育。

（4）督促施工员对作业人员进行安全交底。

（5）作业前对施工工作环境进行安全检查，并督促安全措施的落实。

（6）负责过程中的安全巡检，督促项目部及时排除安全隐患。

（7）负责对违章人员进行教育或经济处罚，遇有险情，有权责令停止施工，并立即向项目经理报告。

（8）参加工伤事故的调查，并负责保护工伤事故现场。

（9）编制项目的文明施工规定及安全生产管理制度。

（10）参与施工过程中的顾客意见的收集、处理。

（11）实施内部沟通。

（12）参与数据分析、纠正措施的制定实施。

（13）参加培训学习。

（14）接受内审。

（15）负责执行项目经理分配的其它职责。

设备、材料员：

（1）贯彻公司质量方针，实现项目质量目标。

（2）负责项目物资需用计划的汇总和传递，编制项目的仓库保管规定。

（3）对进入项目的物资实施验证，负责物资的标识、储存、盘点、发放。

（4）负责本项目监视测量装置的领用、归还及保管。

（5）负责项目施工机械设备的供应和使用的管理。

（6）负责对经批准自行采购的物资实施采购。

（7）负责现场临时设施使用情况的检查。

（8）参与施工过程中的顾客意见的收集、处理。

（9）实施内部沟通。

（10）参与数据分析、纠正措施的制定实施。

（11）参加培训学习。

（12）接受内审。

（13）负责执行项目经理分配的其它职责。

1.2.3 工质量的全过程监督

针对施工中的全部工艺环节，对怎样保证工程质量和易发生的质量事故的预防建立事前、事中、事后的质量保证与监控系统。

1.2.4 工程材料质量控制流程

施工材料质量保证与否是产品质量保证的前提，在市场产品鱼龙混杂情况下，必须对材料质量采取完善控制措施。

1.2.5 分项工程及工序质量监控流程

（1）施工过程中各分项工程的质量保证措施

测量工作的质量保证措施

配置先进的测量仪器和具备资质条件的责任心强的专业测量工程师。对测量仪器定期到具备资质条件的单位进行校验，并取的校验合格证书。在使用中发现问题或仪器误差超过规范要求，立即找出原因后进行校验。

建立测量工程师对测量成果负责制和责任追究制。测量工程师只对自己的测量成果负责。

对设计单位提供的控制点进行重新测量，与设计单位的成果进行对照，发现问题再次复核后通知监理工程师或设计单位进行解决。

对工程控制点、水准点、施工基准线等制定定期复核计划，对结构物控制点、护桩等由测量人员每天检查，发现松动，及时复核。

（2）施工过程主要质量环节控制措施

施工准备

全面认真审核设计图纸，确定施工总体部署，制定施工方案、工艺规程及质量控制计划；选定机械设备，对现场进行复核与控制测量，组织和培训施工队伍。

材料设备准备

明确采购的材料、设备、器具的规格型号、检测试验的资料，严格按质量标准订货采购，对进场材料按照报验程序进行检验和控制，把好材料关，对工程上使用的所有材料进行质量检查，杜绝不合格材料和半成品进入工地。

（3）施工过程控制

施工过程的控制主要通过质量体系的正常运行，按照施工的工序过程及质量控制程序进行质量控制，根据设计及规范要求、工艺标准和验收标准，对各分项、分部工程进行延续性检验与评价。

施工中对隐蔽工程和每道工序严格执行施工质量“三检制”和“联检制”，坚持施工班组自检、作业队质检员复检、项目经理部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由项目经理部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

工地试验室将按照国家的有关规定和规范要求或设计文件要求对工程上使

用的砂石骨料、水泥、钢筋、瓦、水泥砂浆等进行现场取样和质量检测及分析，控制好拌和站拌和的砼质量。

为了达到过程的有效控制，必须做到质量、成本、工期三位一体，施工过程中，明确各职能部门的控制任务，进行密切合作，建立重点、难点工序的管理和控制，作好对设计变更、工艺更改和所有施工文件的控制和不合格的控制工作。

在施工质量验收中，严格按照规范要求，对各工序的单元工程进行验收评定，若施工图的标准高于上述评定标准时，将按施工图的要求进行评定，评定所用的表格将按指定要求进行设计填写。

1.2.6 总则

精选施工用材，拒绝使用不合格或性能不稳定的材料。

科学设计，规范施工工艺，严格遵守施工工艺进行施工。

建立严格的技术交底制度，项目部负责编制技术交底送交公司审核补充后进行实施。现场施工员负责向操作工人讲解，督促实施，对每一个分部分项工程或单一工程类别都必须具有详实、科学的技术交底。技术交底不能简单照搬国家施工规范，而应在满足国家规范要求的前提下，根据各分类项目的现场实际情况，制定出科学、易操作的施工方案。

建立严格的验收制度，对每一个单项的每一道工艺都必须经现场施工管理人员验收合格签字后方可进行下一道工序的施工，并对隐蔽部分做出详尽、客观的记录。

公司保证质量在内部实行“三检”制，即每道工序操作施工队、操作工人自检，然后由项目部施工管理人员复检，最后由公司质检部门进行抽检。

密切配合现场甲方代表和监理公司代表对质量进行严格的监督和控制，坚决执行甲方及监理公司等部门提出的合理技术指标，并配合对上述部门对各分项进行检查。

对一些图纸上要求高或者需处理的特殊部位，应做明确指示，遇到新工艺，应出具具体的技术规范资料，并共同研究确定施工方案。

注重施工人员技能和素质培训。上岗业务技能培训，从根本上提高质量管理水平和操作技能。

注重施工设备的维护、更新，先进、良好的机械设备性能是高质量的根本保证，而熟练掌握设备性能则是达到高质量的重要途径。

经常组织进行技术交流和学习，鼓励更新施工工艺、施工技术，提高成品精度和成品和谐，克服长期存在的质量通病，使工程质量不断提高。

树立全面质量管理意识，对施工全过程的每一个环节都应有足够的重视，树立“下一道工序就是用户”的观点，凡本工序的质量问题本工序解决，每一个工序对下一个工序都是一种“产品”。

全面质量管理还应注重好、快、省的结合，不仅重视工程质量本身，还要重视施工工期和成本，确保不造成浪费。

注重经济效果、生效效率、工作效率，加强经济管理、技术组织，全面提高工作质量。

1.2.7 质量方针和质量目标

严格按照公司 ISO9001 质量标准进行施工管理，确保“一次性验收合格”。

为了达到该质量总目标，在施工全过程中，以目标管理统揽全局，以经济承包为杠杆，以全面推广应用 ISO9001 国标质量标准为手段，开展质量管理工

作，将单位工程质量总目标分成各分部工程、分项工程的分目标，各质量分目标落实到具体人头上，并实行经济承包，实行关键工序、关键时候重奖重罚、使每个项目员工和目标直接相关，对目标负责，并给每个项目员工以压力、以动力、最大限度地调动和发挥每个员工的生产积极性和聪明才智，提高员工的质量意识。

为了确保该工程施工质量达到现行施工及验收规范的合格标准，并为争创市优工程打下良好基础，必须建立行之有效的质量保证体系，把质量保证活动系统化、标准化、制度化、使整个工程实现全面的质量和控制。按相关标准，根据公司质量保证体系的要求，结合本工程的实施情况，建立由公司总工程师领导、项目技术负责人负责的质量管理机构，使整个质量保证体系协调运作，工程的质量始终处于受控状态。

实行目标管理，进行目标分解，按单位工程及分部分项工程落实到责任部门和人员，除公司质量监督部门和项目技术负责人外，现场另安排专职质监员跟班作业，按照公司质量保证体系文件规定，使项目各部门到各施工班组，层层落实质量职责，明确质量责任。

积极开发质量管理小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量关键组织攻关，积极做好成果的推广应用工作，最后实现单位工程合格并争创优质样板工程的目标。

（10）项目验收方案

验收依据

国家及青海省相关法律法规：《草原法》《生态保护修复资金管理办法》等；

项目批复文件、可行性研究报告、设计图纸及施工合同；

行业技术标准：《退化草原修复技术规程》《草原生态监测技术规范》等；

地方生态保护政策及玛沁县草原修复规划。

验收组织与人员

验收领导小组：由果洛州生态环境局、玛沁县自然资源局、财政局等部门领导组成，负责统筹协调与重大问题决策。

专家验收组：邀请草原生态、土壤学、水利工程等领域 5-7 名专家，负责技术评估与质量鉴定。

实施单位代表：项目施工方、监理方、设计单位人员，配合提供资料与现场说明。

牧民监督组：选取当地 5-10 名牧民代表参与，从实际使用与生态改善角度提出意见。

四、验收内容

1. 工程建设内容验收

网围栏工程：检查围栏安装长度、稳固性、防腐处理情况，确保符合设计标准；

2. 工程质量验收

核查施工记录、材料质检报告、隐蔽工程验收单等资料；

现场抽检草种发芽率、围栏立柱埋深、土壤改良层厚度等关键指标。

对验收资料进行归档，作为后续项目申报与绩效考核依据。

通过科学规范的验收流程，确保退化草原修复工程长效发挥生态、经济与社会效益。

第二章　应急预案

（1）预防预警制度；

紧急情况的处理措施、预案

建立紧急情况预警机制

安全预警机制

本工程施工管理中本公司将首先建立现场施工安全重大危险源预警机制，强调“安全第一、预防为主”、“安全责任，重于泰山”的安全管理方针，开展本工程施工安全重大危险源辨识与防治管理。具体措施如下：

本项目设一名事故预防员，负责现场所有人员的人身和安全事故预防工作，其有权发布指示，及采取防止事故的保护措施。事故发生后，立即报告有关单位，并采取妥善的处理措施。

进场之初事故预防员对本工程现场的危险源进行识别，并列出详细清单，制作重大危险源识别检查表，施工中依据该检查表进行经常性检查。

现场事故预防员每半个月对各专职安全员施工中的安全检查记录进行汇总分析，识别本阶段安全危险情况的发展趋势，及时在安全会议上公布，发布预警信息，及时提出警示，并将有关情况再现场工人生活区张贴公示。

其他情况预警机制

考虑本工程特点，对可能影响正常生产的用电及材料供应等环节编制紧急情况预案，确保在各种不利条件下依然能够满足现场的正常施工。

建立紧急情况处置组织体系

项目建立以项目经理为组长的紧急情况处置领导小组，项目副经理、安全总监和事故预防员为副组长，并形成由公司总部、社会机构、项目相关职能部门等共同参加的紧急情况处置组织体系。

领导小组负责统一指挥、调动，并根据发生情况的危害程度，采取对应措施并组织实施。同时向上级和社会有关援助部门（机关）报告请求援助，事后对发生事故的原因组织人员调查，对造成重大损失的相关责任人做出相应处理。

紧急情况的处理措施、预案

材料供应的处理措施、预案

本公司有完善的材料、设备供应商服务网络，拥有大批重合同、守信用、有实力的供应商，能保证工程所需材料、设备随时进入现场。

根据工程进展，各专业工程师提前做好材料需求计划，项目材料部门及时采购。

项目试验员对进场材料及时取样（见证取样）送检，并将检测结果及时呈报监理工程师。及时向监理工程师呈报进场材料合格证，材料供应商资质证明等。

配置高效、环保性能好的机械设备，保证工程所需材料能及时加工并运输至施工层，同时减少对周边环境的影，进行施工用电线路的维护，同时配备 30 部手提应急灯及 30 部手电筒。为保证施工机械在施工过程中运行的可靠性，项目加强对设备的维修保养，对机械易损件的采购储存，落实定期检查制度，保证设备运行状态良好。

突然停电及机械故障的处理措施、预案

现场除利用业主提供的电源作为正常状态下的施工用电，同时现场配备柴油发电机组，作为备用电源，给重要机械及重要部位的照明供电。

现场配电室设置联络柜，柴油发电机组通过联络柜与市政供电线路相互切换，并形成连锁，设置手/自动转换开关，当市电断电后，可通过自动或手动方式启动柴油发电机组,并保证正常照明及 30 分钟的应急照明时间。

项目配备 2 名维修电工。

项目部每月由专人组织维修电工对现场电气线路、灯具、配电箱进行检查，每月启动柴油发电机组一次，保证柴油发电机组能随时正常使用。检查结果形成文字记录，并由检测人员签字认可，制定相关责任制。

3 卫生防疫的处理措施、预案

成立疫情管理机构

成立疫情隔离控制指挥部、负责隔离控制协调指挥工作，指挥部由业主、总包单位、监理单位、分包单位的主要负责人和政府、卫生防疫部门、公安机关负责人共同组成，总承包单位负责人负总责。

成立现场应急管理机构，对工地疫情防治、隔离控制、生活保障、治安保卫及对外联系实施具体管理。现场应急管理机构由业主、总承包单位、监理单位和分包单位项目负责人组成，总承包单位项目负责人负总责。

对疫情工地实行严格封闭管理

现场设立隔离区，切断工地与外界的直接接触，隔离区设立醒目标识，禁止无关人员入内，防止疫情扩大。

加强现场保卫，每日 24 小时巡逻检查和门卫 24 小时值班，配备足够的保安人员，保证发生疫情后，工地人员不外出。

工地内采取严密的隔离措施

对于与疫情密切接触者，进行重点隔离，密切接触者严格按防疫部门要求采取严密的隔离措施。

加强对疫情密切接触者隔离区的管理，不得与隔离人员接触，隔离人员不得到隔离区外活动。

做好隔离区内疫情防治工作。

配合卫生防疫部门，做好对隔离区的消毒工作。 对隔离区人员每天进行体检，并认真做好记录。

做好对隔离人员的宣传教育工作。普及预防知识，做好隔离区人员思想工作，排除恐慌心理，积极服从和配合卫生防疫部门做好防治工作。

杜绝私自出走或不服从管理的事件发生。

抵抗风险措施

风险因素识别

依据项目承包内容、分包管理、项目管理人付款、市场变化、气候条件等背景资料，本公司施工同类工程的经验及潜在的因素，本项目的风险主要存在于以下几个方面：技术风险，管理风险，过程控制风险，质量风险，市场风险，法律法规，职业安全风险，环境风险，项目管理人及利益相关者等方面。

潜在风险的分类及应对措施

技术风险

风险内容：施工方法选择不当，试验不合格；事前应对措施：优化技术方案；事中应对措施：制定补救措施；事后应对措施：评估事件技术改进；

管理风险

风险内容：管理不到位个人能力差，施工队素质低；事前应对措施：明确管理机制劳务队预审；事中应对措施：调整组织结构启动备选合格劳务队；事后应对措施：评估事件原因将施工队从合格劳务队中删除；

过程控制风险 风险内容：协调不到位；事前应对措施：工程例会协调；事中应对措施：强化施工过程管理；事后应对措施：进行总结，改进管理；

质量风险风险内容：质量缺陷；事前应对措施：制定创优计划；

事中应对措施：分析质量原因，调整管理方案；事后应对措施：质量总结，开质量分析会；

职业安全风险

风险内容：安全事故传染病；事前应对措施：制定应急预案；

事中应对措施：启用应急预案；

事后应对措施：进行总结，调整应急预案；

环境风险

风险内容：环保不达标；

事前应对措施：制定环境管理计划，制定预案并检查；事中应对措施：及时整改；事后应对措施：对责任人处理；

（2）安全保障措施；

1. 安全管理措施

1.1 安全生产管理体系

安全生产是项目施工中的一项重要工作，也是一项群众性工作，必须从技术上、组织上采取一系列必要的措施。创造良好的文明施工环境和施工秩序，能促进安全生产、加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本、提高企业经济和社会效益。

根据项目部安全生产责任制的规定，成立以项目经理为第一责任人、项目副经理为分项安全责任人的安全保证体系，监督和指导各职能部室的安全生产行为。安全生产管理体系实行项目经理负责制，设置专管安全的项目副经理，领导各级生产指挥人员贯彻、落实安全生产方面的各项规章制度和保证措施，确保安全生产。安全生产的日常工作由安全副经理、安全员负责。在安全副经理、安全员的指导下，组织全体上岗人员进行岗前安全教育，特种作业人员必须经过培训合格后，持有效证件上岗，杜绝盲目指挥冒险作业。

安全生产管理体系人员和各部门职责：

项目经理：

（1）认真贯彻执行国家有关法律、法规和规，对本工程安全生产工作负全面责任。

（2）定期主持召开安全生产会议，研究解决安全生产中的重大问题，注意改善劳动条件，关心职工的安全和健康，保证安全生产管理体系正常运行。

（3）检查并考核项目部各部门安全生产责任制落实情况。

项目副经理（安全副经理）：

（1）在项目经理领导下，负责本工程的安全生产工作，确保安全生产管理体系正常运行。

（2）协助项目经理组织贯彻国家劳动保护方针、政策、法令和上级有关安全生产方面的指示。

（3）贯彻安全生产“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，同样要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

（4）领导编制和组织实现安技措施计划，监督劳动保护费用的使用，不断改善职工的劳动条件。

（5）.对各级干部、工程技术人员、工人经常进行安全生产教育。

（6）组织安全大检查，定期召开安全专会。

（7）组织均衡生产，注意工人的劳逸结合，对因加班加点致使工人过度疲劳造成事故负领导责任；对经理负责解决的安全工作或已决定急需解决的安全隐患，未及时采取措施解决而酿成的事故负直接责任；对虽采取措施，但由于下属人员执行不力造成的事故负领导责任。

项目总工程师：

（1）在项目经理领导下，对本工程安全技术工作负责。

（2）审批各工种安全技术操作规程，主管安全技术教育工作。

（3）在审批技术文件和处理技术问题时，认真贯彻落实国家的安全标准。

（4）在审批采用新技术、新工艺、新材料、新设备和革新项目时，符合安全技术规定。

（5）对已提出的技术方面的安全隐患，未能及时采取措施解决而酿成的事故负直接责任，对虽采取措施，但由于下属人员执行不力造成的事故负领导责

任。

技术质量部：

（1）在项目经理的领导下，协助主管领导贯彻落实安全技术工作。

（2）在进行技术方案设计及工艺方案选择时，优先考虑安全设施的设计（如：脚手架、护栏、支撑、模板等），减少对施工人员的危害，以保证施工人员的安全和防止职业病的发生。

（3）在使用新工艺、新材料时，必须组织施工人员进行作业前的交底和技术指导，以保证作业人员在施工中的人身安全和产品质量。

（4）在项目经理的领导下，协助主管领导检查产品安全工作。

（5）严格检验产品质量，保证产品安全。

（6）发现安全隐患及时报告。

工程物资部：

（1）在项目经理的领导下，协助主管领导贯彻落实安全生产工作。

（2）按照“五同时”的要求，在组织安排生产计划时，必须同时对安全工作进行计划、布置、检查、总结、评比工作。

（3）根据管生产必须管安全的原则，结合设备、场地、人员、负荷等因素在安排组织生产时，合理调配劳动力，尽量避免施工人员因疲劳作业而发生事故。

（4）在在项目经理的领导下，协助主管领导贯彻落实安全、消防管理工作。

（5）按现场施工人员的 1%—2%配备专职安全员，在现场设置醒目的安全警示牌。经常性深入现场检查，及时发现各种事故苗头，并及时组织消除各种事故隐患，监督施工人员正确穿戴防护用品，制止各种违章操作行为，并按公司

有关定置管理规定指导施工人员搞好现场定置管理，切实做到文明施工、清洁作业，达到工完料清场地净。

（6）定期组织特种作业人员的学习，培训和考核，做到持证上岗。

（7）保卫消防人员对各施工现场进行经常性的检查，根据各场地施工环境，合理布置防火器材，严格执行公司有关“危险作业场所的动火申报审批制度”的规定，做到“预防为主，防消结合”，以保障生产的顺利进行。

综合办公室：

（1）在项目经理的领导下，协助主管领导做好本项目的环境保护和职工生活工作。

（2）依据国家卫生和劳动条件分组管理标准 GB5817-85 的要求，加强现场作业、劳动过程和作业环境职业危害监测分析工作。确保人员身体健康，并做好防护用品穿戴和职业安全卫生的各项规定要求。

（3）根据季节性劳动保护工作管理程序，做好防署降温、防寒保暖工作，防止意外事故发生，确保施工人员有健康的体魄，满足工程建设高节奏、高效率的需要。

（4）从事高空作业人员，按高空作业管理程序要求，上岗前必须体格检查，凡患有禁忌症者（高血压、心脏病、贫血等）不安排从事该作业，以确保施工的人员安全。

（5）在工地和现场施工时，遵守国家和施工现场所在地方政府有关环境保护的规定。施工废水、生活污水不得污染水源、道路等，工程垃圾固体废物及时运至指定地方，采取妥善的处置方式处理，环缝热熔时，采用防护网、档板等防止装焊作业的火花伤人，热熔作业的设备、设施按定置管理要求摆放整齐，

固定合理，防止坠落。

为了确保施工期间符合国家对安全生产及职业健康的有关要求，符合我公司的《职业健康安全和环境管理手册》和《职业健康安全和环境作业文件》，我方从公司领导到项目班子人员极为重视，由公司危险源辨识与风险评价小组采用“作业条件危险评价法（LEC）”，结合该工程实际情况对施工（生产、运输）过程和施工作业场所存在的危险源进行辨识与评价。考虑的围包括：正常的作业活动和非正常的作业活动；所有进入作业现场人员的活动；作业场所的设施、设备。从危险的根源和状态归结为：坠落；物体打击、起重伤害；坍塌；触电；火灾；车辆伤害；灼伤；机械伤害及其它等 20 种事故类别，最终评价为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级危险等级，从而对其采取相应的职业健康安全措施。

项目经理部所有员工严格遵守总经理的职业健康安全承诺，严格遵守执行有关法律、法规、条例、标准及本岗位的岗位职责和操作规程，不违章作业，对本岗位的职业健康安全工作负直接责任。自觉接受职业健康安全培训，增强自身职业健康安全意识及防护能力。

如我公司中标，严格遵守施工现场管理，保证达到当地安全文明工地，如因我公司原因在施工过程中发生安全事故，承诺承担一切责任和损失。

在合同履行中，接受发包人及监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工、协调配合等方面的监督检查，并服从管理。对提出的问题及时进行整改，严格履行施工合同的各项条款。在合同履行中，承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任和费用，并按通用条款执行，且按发包人要求现场管理规定文件执行。

1.2 安全生产组织机构

1.2.1 安全管理体系的建立

为了适应现代职业健康安全的需要，按照《质量管理体系》《职业健康安全管理体系》一体化管理体系系统理论管理与安全有关的相关事务，以达到预防和减少生产事故和劳动疾病的目的。

建立安全生产组织机构

施工现场成立以项目经理领导下的，由安全副经理、技术负责人、安全科、技术部、质检部、财务部、办公室负责人组成的施工安全管理领导小组。各施工作业队负责人是本单位的安全第一责任人，保证全面执行各项安全管理制度，对本单位的安全施工负直接领导责任。在项目形成纵横图网络管理体制。

健全安全管理制度

安全生产责任制。建立健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人，各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。

新进工人须进行岗前培训。工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育。工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。

分部单元工程安全技术交底。

特种作业持证上岗。

安全检查。必须建立定期安全检查制度。

班组“三上岗、一讲评”活动。

遵章守纪、佩戴标记。

工伤事故处理。建立事故档案，按调查分析规则、规定进行处理报告，认真做好“三不放过”工作。

“五牌一图”与安全标牌

落实安全生产责任制

项目经理负责贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、批示和决定。项目副经理协助项目经理对所管工程项目生产经营过程中的安全生产负间接领导责任。项目技术负责人对项目工程生产中的安全生产负责任。专职安全员认真执行国家有关安全生产方针、政策和企业各项规章制度。施工员认真执行上级有关安全生产规定，对所管范围内的安全生产负直接领导责任。各班组长认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本班组人员在生产中的安全和健康负责。施工工人认真学习各项安全生产规章制度，努力提高安全生产知识和技术水平，自觉遵守安全操作规程及施工措施，不违章作业。

1.3 安全目标及保证体系

1.3.1 安全目标：整个施工过程中，必须把安全作为永恒的主题，坚决执行“安全第一，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则。

安全管理目标是全施工期实现“五无”，即无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌；控制工伤事故发生，实现重大伤亡事故为零的目标。主要从下述几方面进行管理：

强制执行建设部《建筑施工安全检查标准》，项目工程部建立以项目经理为组长的生产安全领导小组，层层落实安全生产责任制，并落实到每个人头。

重点抓好“四口、五临边”防护工作。

执行三相五线制、三级配电两级保护，实行一箱、一闸、一漏电保护器的

要求。

机械设备的维护、养护管理。

脚手架、安全防护验收及维护。

制止违章行为，严肃事故处理。

1.3.2 安全、文明生产保证体系

建立以项目经理为首的安全、文明生产保证体系。

项目经理是工程项目施工现场安全生产第一责任人。其主要职责是：

（1）严格执行国家、地方政府和上级部门有关安全生产的法律、法规、制度、标准，对本单位职工在生产经营活动中的健康安全全面负责。

（2）领导组织实施本单位中长期、年度、特殊时期安全生产工作目标、规划及实施计划。

（3）定期组织召开安全专题会议，听取安全生产汇报，分析、预测本单位安全生产形式，及时落实解决生产中的安全问题。

（4）健全本单位安全生产管理机构，健全本单位安全生产保证体系，并保证其正常运转。

（5）定期和不定期地组织安全生产检查，监督落实对重大事故隐患的整改。

（6）严格遵守有关用工管理规定，对本项目职工的安全教育工作实施组织领导。

（7）对本项目安全生产投入进行监督和落实，对由于安全生产所必须的资金投入不足造成的后果承担责任。

（8）组织制定并实施本单位事故应急救援预案，建立、健全本单位事故应急救援体系。

（9）及时、如实报告安全事故，协助事故调查，制定并落实各项防范措施。

项目部主管安全生产的副经理，要做到以下几点：

（1）协助项目经理组织对本项目的安全生产管理，对本项目的安全生产工作负直接领导责任。

（2）认真贯彻落实有关安全生产的法律、法规、标准、规范及安全生产规章制度，及时纠正安全生产中的违章行为。

（3）组织实施各项安全技术措施，检查指导安全技术交底与安全设施验收工作。

（4）组织参与每天的现场安全巡视，组织有关人员定期进行安全生产和文明施工检查，并对发现的问题及时组织整改。

（5）认真做好对职工的安全教育、培训和考核工作，督促有关人员做好对本项目特种作业人员的管理。

（6）发现伤亡事故时及时组织抢救、保护现场，并及时上报。

项目总工程师，要做到以下几点：

（1）对本项目的安全技术工作负全面责任。

（2）认真贯彻执行有关安全生产的法律、法规及规章制度，严格落实有关安全技术标准、规范、规程。

（3）组织编制施工组织设计（施工方案）、专业工程项目施工方案及大型临时设施、特殊施工设施的施工方案，组织安全技术交底工作，检查施工组织设计或施工方案中安全技术措施的落实情况，对安全技术措施的编制与设计负责。

（4）组织并参与对安全防护设施的交底与验收，履行验收手续。

（5）对施工方案中安全技术措施的变更或采用新材料、新技术、新设备、新工艺等要及时上报，审批后方可组织实施，并做好培训和交底。

（6）参与项目安全生产检查，落实事故隐患整改方案，并对隐患整改方案的落实情况进行跟踪检查。

（7）参与因工伤亡事故的调查，制定防范措施。

项目安全生产管理人员的安全生产职责：

（1）对本项目的安全生产管理工作负责，协助项目经理做好对有关安全生产法律、法规及规章制度的贯彻与落实，并检查监督执行。

（2）负责并参与本项目安全生产管理制度、安全技术措施计划和安全技术操作规程的制定工作，督促落实，并对其执行情况进行检查。

（3）负责对现场违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的人员和行为进行查处；正确分析、判断和处理各种事故隐患，参与隐患整改方案的编制，及时对隐患整改方案的落实情况进行检查；对现场存在重大隐患的专业性较强的项目，有权下达停工整改决定。

（4）组织做好对现场人员的安全教育、培训与考核工作。

（5）负责在有较大危险因素的工作及活动场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。

（6）依据有关法律、法规和标准，做好对现场易燃易爆和有毒有害危险品、危险废弃物的管理；做好对现场安全设备、防护器材、急救器具和劳动防护用品的管理。

（7）及时、如实地进行事故报告，做好事故现场保护工作，参与对事故的调查和处理。

项目部应遵守有关安全、健康与环境方面的法规和规范，采取切实有效的安全技术措施，防止伤亡及各类事故发生，达到预定的安全合格生产目标。

专职安全员对本单位的安全生产工作负直接领导责任，主要职责是：

（1）监督检查本单位各职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正安全生产中的失职和违章行为。

（2）组织本单位安全生产检查，落实对重大事故隐患的整改。

（3）对本单位安全教育、培训和考核工作的实施情况进行监督，督促有关部门做好对本单位特种作业人员的管理。

（4）对施工组织设计、施工方案中各项安全技术措施的实施落实情况进行监督检查。

（5）对本单位安全生产投入情况进行监督检查，并落实实施。

（6）组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验。

（7）做好因工伤亡及重大未遂事故发生时现场保护工作，并协助事故调查落实各项防范措施。

项目质检员的安全生产职责：

（1）执行上级有关安全生产的各项规定，对所辖班组的安全生产负直接管理责任。

（2）认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组进行书面安全技术交底，如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，对规程、措施、交底的执行情况经常检查落实，随时纠正作业违章，对安全技术措施和安全技术交底的落实效果负责。

（3）对所辖施工队的作业环境及各种设施、设备的安全状况进行巡查，发

现问题及时纠正解决。强化对重点、特殊部位施工的安全状况检查，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，做到不违章指挥。

（4）负责对所辖班组的安全活动情况进行监督、管理，定期和不定期地组织其学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全管理部门或其他有关人员的安全监督检查，及时解决检查中提出的不安全问题。

（5）对分管工程项目应用的新材料、新设备、新技术、新工艺严格执行申报审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导。

（5）做好因工伤亡及重大未遂事件的现场保护及上报工作。

项目机械管理人员的安全生产职责：

（1）对本单位的中、小型机械设备的安全运行负责，做好现场中、小型机械设备的安全检查及维修、保养工作。

（2）建立健全现场租赁机械设备安全管理制度，督促设备租赁单位及时做好对设备运行过程中隐患的整改，严谨设备带“病”运行。

（3）认真做好对新购及大修、维修回场后中、小型机械设备的检查与把关，做好对中、小型机械设备出厂合格证及完整技术资料的收集、整理工作。

（4）负责按照国家或地方政府的有关规定，督促有关部门做好对现场危险性较大的特种设备的专业检测和检验。

（5）制止并杜绝国家明令淘汰、禁止使用的危机生产安全的工艺、设备、设施的使用。

（6）组织制定现场中、小型机械设备的安全技术操作规程，做好对中、小型机械设备操作人员的安全技术交底。

（7）参加施工组织设计或施工方案中设计中、小型机械设备运行及施工内

容的会审，提出有关安全的具体建议，并负责督促落实，确保实施。

（8）参与因工伤及重大未遂事故的调查，从事故设备的性能等方面，认真分析事故原因，提出处理意见，制定防范措施。

劳务队负责人的安全生产职责：

（1）认真执行安全生产的各项法律、法规、标准、规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本队人员在生产中的安全和健康负责。

（2）按规定及项目部的要求配备足够的安全专职管理人员。

（3）严格履行劳务用工手续，做好本队人员的岗位安全培训，经常组织人员学习安全操作规程，监督本队人员遵守劳动、安全纪律，制止违章作业，不违章指挥。

（4）保持本队人员的相对稳定，及时向有关部门申报现场人员的变动情况，监督并确保使新进场人员都能按规定办理各种手续，做好新进场工人的岗前安全教育。

（5）做好对本队各工种人员的书面安全技术交底，并针对当天任务、作业环境等情况，做好班前安全讲话，监督落实其执行情况。

（6）定期和不定期地组织对本队人员作业现场的安全生产状况进行检查，发现问题，及时纠正解决。

（7）做好对因工伤亡及重大未遂事故的现场保护，做好对现场受伤人员的抢救工作，并立即上报有关部门或领导。

1.3.3 安全生产内容和原则

安全控制的内容

施工项目安全控制主要是以施工活动中，人、物、环境构成的施工生产体

系为对象，目的是要建立一个安全的生产体系，确保施工活动的顺利进行。

1.3.4 安全控制的原则：

管生产必须管安全的原则。

安全第一的原则。

预防为主的原则。

动态控制的原则。

全面控制的原则。

现场安全为重点的原则。

1.3.5 安全保证体系

安全保证的责任体系

建立项目经理、管理人员、岗位操作人员在施工生产过程中层层负责的安全生产责任体系，明确各自安全生产岗位职责。

工程部经理负责工地开工前与项目经理签订安全责任书，工程部负责各项目的安全管理协调工作，负责向总公司安全主任报告公司安全工作情况。

项目经理是项目安全施工第一负责人，负责全面领导责任，负责与项目部安全员签订安全责任书，负责主持安全会议，负责成立并领导安全施工领导小组开展安全管理工作。

项目部安全员对项目安全施工负直接责任，负责和施工人员签订安全责任书，负责对施工人员进行安全知识、劳动纪律教育，向施工人员进行安全技术交底，每天对施工现场进行现场巡查监督，对违章操作即时制止，记录《安全日记》，每月对施工现场进行安全检查评定。将检查结果报综合管理部，同时抄报工程部，对发现的安全隐患签发《安全整改通知书》，并跟踪整改结果，

对发生的安全事故，及时上报和组织处理。

施工人员应树立牢固的“安全第一”意识，时时处处注意安全，进行文明施工。

安全保证的教育体系

施工队伍进场前必须对全体人员进行生产安全，规章制度教育，安全思想、知识、技术、法制、纪律的教育，签订安全协议，对工人进行安全技术交底。特殊工种必须经过培训，持证上岗。每月召开一次全体员工会议，建立安全生产检查制度，贯彻公司安全规章制度，实行明确的奖罚制度。

专职安全员工作体系

安全员应每天深入现场进行巡视，并记录安全日记，对安全设施（脚手架、防护网等），安全防护措施，安全保护用品（安全帽、安全带），设备安全运行情况，现场文明卫生，对现场人员遵守安全规范的情况进行检查和实施有效的监督，发现不合格状态，应发出整改通知书，责令限期整改，对不听劝阻者，经项目经理批准采取停工整改、罚款教育等手段进行纠正。

1.4 安全生产施工措施

事故预防

应该实施所有必要的安全施工的规则和规定以防止事故的发生，将雇员和其他人员的伤亡降到最低限度。

应提供足够的急救医疗设备及合格医务人员，对受伤人员（包括业主的人员和监理人人员）进行紧急处理。

劳动保护

按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动

保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。正确使用劳动保护用品，进入施工现场一律戴安全帽，禁止穿拖鞋或赤脚。

施工现场安全技术措施

施工现场的布置符合防火、防爆、防雷电等规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活、办公用房、仓库、材料堆放、停车场、修理场等严格按批准的总平面布置图进行布置。

施工现场做到布局合理，防范严密，工地做到管线齐全，灯明路平，标志醒目，安全防护设施齐全，在施工现场悬挂有关施工安全标语，设立醒目警示牌。

作业区应有足够的设备运行场地和施工人员通道。

施工运输及机械安全措施

运输线路

道路纵坡度不宜大于 8%，个别短距离地段最大不得超过 12%；道路回头曲线最小半径不得小于 15m；路宽不得小于施工车辆宽度的 1.5 倍，单车道设有会车位置。

在急弯、陡坡等危险路段右侧应设有相应警告标志，叉路、施工生产所场设有指示标志。

高边坡路临空边缘应设有安全墩挡墙及反光警告标志。

各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与操作证不相符的机械设备，不准将机械设备交给无本机械操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。

运输车辆服从指挥，信号齐全、不超速，过岔口、遇障碍物时减速行驶，

制动器齐全，功能良好。

供电与电气设备安全措施

施工现场用电设备定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器等每季度测定一次绝缘强度，移动式电动机，潮湿环境下电气设备使用前检查绝缘电阻，对不合格的线路设备及时维修或更换，严禁带故障运行。

线路检修、搬迁电气设备（包括电缆和设备）时，应切断电源，并悬挂“有人工作，不准送电”的警告牌。

1.4.1 建立安全生产责任制

建立项目经理、管理人员、岗位操作人员在施工生产过程中层层负责的安全生产责任制度，明确各自安全生产岗位职责。

1.4.2 严格遵守国家法律、法规各项规章制度，遵守工地建设的有关规定：

临时施工人员在工作区施工，必须佩戴临时出入证；

在工作区内禁止吸烟，吸烟必须在吸烟点处，不许乱扔烟头，如在非吸烟点发现烟头，除依照相关规章处理外，还给予违规人警告处分，若有再犯，立即在一定范围内停工整顿，对直接责任人开除，对付有直接领导责任的有关人员进行警告处分；

在工作区施工动用明火时，严格按规章办理有关手续，经消防对勘探后方可动火，严禁使用电炉取暖或施工，违者除按有关制度进行处罚外，公司将对直接领导进行罚款。

临时施工人员只能在施工区域内活动，违者除按有关制度进行处罚外，公司将对当事人追加处分。

严禁转借、伪造临时证件，违者除按有关制度进行处罚外，公司将对当事

人追加处分。

严格遵守上下班时间，如属确有必要，须提前办好夜间施工许可证等相关手续，加强防范工作，才能延长施工时间，违者将追究有关领导的责任；

1.4.3 设立专职安全员，负责施工现场安全检查，具体措施如下：

安装过程中使用的施工机具在使用前进行严格检验，包括各种安全保护装置的运转试验；手电钻、电动改锥、焊钉枪等电动工具的绝缘电压试验；

为了防止密封材料在施工中的溶剂中毒，对溶剂进行严格的保管制度。

遇雷雨、大雾、六级以上大风及晚上照明不足时应停止安装。

施工人员进入现场后，应执行地盘的规章制度，执行国家及地方的有关建安条例。

施工人员进场施工必须服装整齐统一，安全帽、安全带、工具袋等劳保用品齐全，持证上岗。

施工工地材料必须分类堆放整齐，并有相应的标识，产品不允许直接接触地面，底部应垫高 100mm，施工人员施工完后必须清理施工现场，避免材料的损坏丢失。

为减低施工对周围环境的影响，物料在夜间进场，进场施工尽量安排在白天进行。

施工安装人员在进入施工现场必须带安全帽。要选择合格产品，有检验部门验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须检查安全帽是否损坏，是否符合安全要求。施工人员带安全帽时必须系好下颚带，以防发生高处坠落的现象。

施工过程中应特别注意人身安全防护措施，施工操作时必须系好安全带。

安全带要选用合格产品，有厂家永久字样的商标及合格证。进入现场必须检查安全带是否完好，安全带必须挂在牢固结实的地方。

人员应配置工具袋、工具箱，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋、工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离 1 米以上。收工后，做到工完场清。

1.4.4 施工现场安全纪律措施

安全文明施工条例

各项设施布置要按照施工总平面图进行规划，并由总包统一安排。

各种材料要分区堆码整齐，并挂上醒目的标志牌。

作业层要做到工完料清，未使用完的材料必须堆码整齐，保持施工现场的整洁。

垃圾要集中堆放及集中处理，排水沟要保持畅通。

施工现场的各种消防设施要按要求进行设置，并有专人管理。

进出工地的施工人员均佩戴施工现场出入证，穿工作服，绝不带外来人员进入施工现场。

施工人员要文明待人，严禁打架斗殴及恶习语伤人。

宿舍内要统一安装照明设计，严禁乱拉乱接用电设备。

积极配合总包方安排的定期文明施工的检查和评比，虚心接受批评并积极改正。

安全纪律

戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动用品。

凡 2 米以上的悬空、高处作业无安全设施的必须系好安全带，扣好保险金

钩。

高处作业不得往上或往下乱抛材料和工具等物件。

各种电动机械设备，必须有漏电保护装置和可靠安全装置和可靠安全接地方可使用。

未经有关人员批准，不准随意拆除安全设施和安全装置。

未经教育不得上岗，无证不得操作，非操作人员严禁进入危险区域。

酒后不准上班操作。

拖鞋或赤膊不准进入施工现场。

穿硬底鞋不准进行登高作业。

安全防火纪律

电焊、气焊人员应严格执行操作规程，执行动火证制度，必须把周围用水泼湿，要用看火员看火，并准备好接火斗和灭火器，不准在易燃易爆物附近电焊。

不准在宿舍内和施工现场明火燃烧杂物和废纸。

宿舍内照明不准使用 60W 以上灯泡，灯泡离地高度不得低于 2.5 米，离蚊帐等物品不少于 500 毫米。

不准将易燃易爆品带进宿舍。

食堂、浴室、炉灶的烧火人员不得擅自离开岗位。

不准将火种带进仓库和施工危险区域，木工间及木制品推放场地。

不准在宿舍区、施工现场燃放烟花和炮竹。

宿舍区、施工现场严禁引火打闹。

严禁损坏、盗窃灭火设备。

安全技术管理控制流程

进入现场的人员控制

施工人员必须持有五证（身份证、暂住证、劳务证、健康证、上岗证）齐全，由项目专职安全员检查落实，无证不准上岗。

特殊工种必须持有特殊工种操作证（如：电工、起重工、电焊工等），由项目专职安全员检查落实。

进场前必须对施工人员进行安全技术生产三级教育卡（公司、现场项目部、施工队三级），并对施工人员进行考试考核，并填写三级教育安全卡。

健全安全管理制度

（1）项目经理是项目工程施工现场安全生产的第一责任人，要制定改善职工劳动条件、预防伤亡及各类事故发生的安全生产目标及实施计划和步骤，充分发挥管理人员的组织职能作用。从人力、物力、财力等方面保证安全生产规章制度的贯彻落实，并使其成为施工现场全体职工的自觉行动。各种安全规章制度由项目工程部发布。建立以项目经理为首的安全生产决策、安全生产管理保证体系；建立以分管领导为首的各级安全技术、安全技术措施计划、安全技术经费保证体系；建立以安全管理部门为主的专业安全生产管理、安全生产检查保证体系；建立以党、工、团贯穿与施工全过程的政治思想、群众监督检查保证体系，形成层层负责、专群结合的安全生产监督管理网络。

项目部成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，对本单位的安全生产工作实施监督，组织安全生产检查，协调相关事故处理，负责劳动防护用品管理，研究、统筹、协调、指导项目部重大的安全施工问题，组织重要安全施工活动。

（2）安全技术措施制度

项目部应设专职安全管理人员，对本单位的安全生产管理工作实施监督检查。

施工队应设专（兼）职安全员，对本单位的安全生产管理工作实施监督、检查。

施工队应设专（兼）职安全员，负责对施工违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为进行查处和纠正，负责施工队安全实施和劳动防护用品的落实与检查。在施工操作的各类活动中，必须首先规范其行为，采取相应的技术措施，制定安全施工组织设计，制约可能出现的不安全因素。安全技术措施按行业要求结合现场特点，满足现场实际要求。正式开工前进行安全报监，接受安监站的监督。

（3）安全检查制度

工程施工前，首先确定安全检查的频率和定期检查的时间。工程开工后由项目经理组织，各职能部门、各施工区域有关管理人员参加，对施工现场每月进行一次联合安全大检查。各施工区域每周进行一次检查，安全及作业班组管理人员现场每日进行一次巡检查，并填写《安全巡视纪律》。如发现问题，下达《安全检查通知单》，整改措施要定人、定时，限期整改。检查整改应执行《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59-99）。根据评分标准，确定安全生产的达标等级。

项目部必须按照“只能加强，不能削弱”的原则，健全和充实安全生产管理检查机构，足额配置专职安全管理人员。

为增强职工的安全意识，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象的

发生，及时消除事故隐患，确保安全生产，必须加强各级安全生产检查。

安全生产检查的依据：国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范、规程及政府、上级部门和公司有关安全生产的各项规定、制度等。

安全生产检查应以查思想、查制度、查措施、查隐患、查教育培训、查安全防护、查机械设备、查操作行为、查劳保用品使用、查伤亡事故处理等为主要内容。

项目部安全检查应以经常性安全检查和自查、互查、交接查为主，以查处“操作性违章”为主要内容，每周组织进行一次。

安全教育制度

教育的内容主要有：安全管理制度、安全操作规程、安全技术措施和安全防护措施。在定期进行教育的同时，并注意结合情况的变化实行应试教育。特别要抓好对民工的培训教育，使安全操作防护技能成为职工素质教育的重要内容。教育施工人员，必须坚持生产，必须安全的原则，把安全纳入施工全过程中。对安全教育做出记录。对各个岗位的人员要进行安全教育。现场常设一名具有资质的专职安全员，建立安全体系、实行安全签字制、安全生产责任制。

特种作业持证上岗制度

专职安全管理人员要懂得工程施工的基本理论和知识，要熟知党和政府有关安全生产工作的方针、政策，熟知国家有关安全生产的法律、法规，要能够熟练应用现行建筑施工安全技术规范、规程、标准，应经培训合格后持证上岗。易危害自己和他人的作业，必须具有相应的技能和防护措施。施工现场凡涉及以上或类似的作业，作业者必须经进修相关专业培训，并取得有效的资质证件，方能上岗。

施工安全保证措施

树立“安全第一”的思想，组织均衡生产，保障安全工作与生产任务协调一致，对改善劳动条件、预防伤亡事故的项目必须视同生产计划优先安排。对施工中重要安全防护设施、设备的实施工作要纳入计划，列为正式工序，给予时间保证。

（1）施工期间，所有工作人员穿戴醒目易于辨认的工作服。

（2）进入护栏安装作业现场必须戴安全帽。

（3）打桩机、运输车由专人操作。

（4）护栏安装、拆除必须按规范要求设置施工标志，所有施工作业人员在设置的施工作业区域内作业，在通车路段禁止随意穿越。

（5）施工现场所有用电设备必须安排持证电工值班，小型电气设备应在当日值班电工的指导下操作。

（6）组织本单位安全生产方面的宣传教育和安全生产管理人员的教育、培训工作。

（7）监督检查所属各单位对安全生产法律、法规及规章制度的贯彻落实情况及有关设备、材料和劳动防护用品的安全管理情况。

安全防护措施

安全警示标志按现场需要制作和设置，以警示作业和其他人员，采取相应的操作程序作业或避让措施，防止不安全因素的发生，标志牌设置充足、牢固，确实发挥警示在前的作用。

机械设备的遮盖等施工作业的安全防护设施与作业危害预防防护设施安全、稳定、有效。定期检查，严防疏漏。

项目经理在编制、检查和评价生产计划的同时，认真编制、检查和评价安全技术措施计划，做好施工生产计划与安全技术措施计划的衔接、配合，防止事故发生。

在生产任务与安全保障发生矛盾时，必须优先安排解决安全工作的实施，对违反安全生产制度和安全技术规程的施工生产活动，应及时予以制止。

制止违章指挥和违章作业，在生产中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关部门共同处理。

定期和不定期地组织安全活动和安全生产检查，掌握安全生产情况，检查生产中的不安全问题和事故隐患，提出改进意见，并监督落实整改。

做好本施工路段重大危险源和重要环境因素的等级建档工作，定期对本施工现场重大危险源和重要环境因素进行检测、评估、监控，制定本施工项目安全事故应急预案。

项目经理应该经常参加安全生产大检查和安全事故的调查、处理工作。

正确处理安全事故，严格实行奖惩兑现

贯彻“五同时”和“三不放过”的原则，对发生的安全生产事故要认真分析事故发生的过程和原因，采取预防类似事故重复发生的措施，并检查安全生产的薄弱环节，加以整改。

严格执行监理有关安全管理工作的指示

施工现场严禁乱拉、乱接、乱搭、乱建行为，接受监理人的检查、监督，做好有关施工人员的安全与健康记录。

建立健全施工应急救险机制，应对突发事件的发生。建立起对不可预见事件处理的组织和预防措施，并在工地成立应急救项目部成立以项目经理为核心

的安全生产组织体系。安全生产组织体系框图如后图所示。

安全生产责任制

为认真贯彻《劳动法》和青海省的劳动安全生产管理法规，落实“企业负责，行业管理，国家监察，群众监督”的安全生产管理体制，在成立安全生产组织体系后明确项目经理在生产中对所管的工程项目的安全生产负直接领导责任，必须组织落实安全技术管理的各项措施，规章制度，严格执行安全技术交底和重要设施设备交接验收使用制度；组织员工学习安全技术规范操作规程，定期组织安全检查。分管副经理协助经理做好安全工作。项目总工对本项目劳保和安全技术工作负总责，结合本项目制定和贯彻实施具体安全技术措施。施工员、队长（工段长）对所管辖的分部分项工程安全生产负直接责任，应认真落实施工方案中安全技术措施，针对施工生产任务特点向作业班组进行详细安全技术交底，并随时检查实施情况，安全员应执行有关方针、政策、法令、法规、规范、标准，做好宣传教育和管理工作，经常深入现场指导、监督和检查，掌握安全生产情况。

1.5 现场消防、保卫工作的管理措施

1.5.1 看火（监护）人员职责

清理热熔部位附近的易燃、可燃物品。对不能清除的易燃、可燃物品要用水浇湿或盖上石棉布等非燃材料，以隔绝火星。

要坚守岗位，不能兼顾其它工作，要与电焊工密切配合，随时注视热熔周围的情况，一旦起火及时扑救。

在热熔过程中，要随时进行检查，操作结束后，要对热熔地点进行仔细检查确认无危险后方可离开。在隐蔽场所或部位热熔操作完毕后，0.5 至 4 小时内

要反复检查，以防阴燃起火。

要根据情况，备好适用的灭火器材和防火设备（石棉布、接火盘、风档等）、做好灭火准备。

发现电焊操作人员违反电焊防火管理规定、操作规程或动火部位有火灾、爆炸危险时，有权责令停止操作，收回动火许可证及操作证，并及时向领导或保卫部门汇报。

无名无牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备的出厂证、合格证应齐全。

手电钻、冲击钻、电动改锥等电动工具须作绝缘电压检验，检验合格后方可使用。

施工现场严禁吸烟。

1.5.2 项目各职能部门主要职责

在建立组织体系的同时明确生产经营部门要合理组织生产，加强现场平面管理，贯彻生产安全规章制度和施工组织设计，建立安全生产，文明生产秩序，技术部门要按照国家有关安全技术规范标准、规程，提出相应的安全技术措施，对不安全因素提出安全技术改进措施。机管部门对一切机电设备、运输和施工机械安全工作负责，经常检查、维修、保养，确保运行。财务应按规定将安全措施费用计划列入生产财务计划，专款专用，确保安全措施和安全活动经费的落实。劳资教育部门将员工培训纳入计划做好新工人（包括民工），特殊工种工人的安全技术培训、考核、发证工作。保卫部门负责本项目安全保卫、消防工作。形成全面安全生产组织体系，确保安全生产。

安全生产思想保证

坚持“安全第一”的思想，认真贯彻党和国家的安全生产的方针、政策，克服生产和安全“两张皮”现象，把安全与生产统一起来，建立“生产必须安全，安全促生产”的辨证关系，严格贯彻“管生产必须管安全”的原则。

安全生产的思想教育

进行思想教育，目的是为安全生产奠定思想基础，一是加强思想路线方针政策的教育，提高全体职工对安全生产重要意义的认识，不断提高管理人员和职工的政策水平和自觉执行安全生产方针政策和法规。二是加强劳动纪律的教育，使广大职工懂得严格执行劳动纪律对实现安全生产的重要性。

安全技能和法制教育

项目部所有职工必须具备安全基本知识，接受安全知识和法制教育，每年按规定学时进行安全培训。

安全技能教育

项目部应根据工种专业特点，实现安全操作，安全防护必须具备的基本技术知识要求，每个职工应熟悉本工种、本岗位专业安全技术知识。必须进行专门的安全技术培训，并经考试合格持证上岗。

安全管理技术措施

实行逐级安全技术交底，开工前，项目总工将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体职工进行详细交底，施工负责人（项目经理）、施工员要按工程进度定期或不定期向参加施工人员进行安全技术交底，班组每天要对工人提出施工要求，作业环境的安全交底。安全技术交底必须按分部、分项工序进行，做到有针对性。

精心做好各分部的施工方案，不断优化环境。根据工程项目分部工程所处

位置及地质、水文条件、气候、工程结构的要求，结合施工力量配置情况合理制定安全技术措施，安排工程施工，控制疲劳作业，保持操作工心情舒畅，特别对施工中噪音、粉尘必须严格控制，减少影响，保证生产人员处于最佳状态，达到人、机、环境的统一。

严格执行安全生产规范标准

根据项目工程任务列出以下主要规范、标准：《工程建设强制性条文》；《建筑安装工程安全技术规程》；《市政建筑安装安全技术工作规程》；《建筑施工安全检查评分标准》；《高处作业安全技术规范》；《施工现场临时用电安全技术规范》；《建筑安全工人安全技术操作规程》等。

加强施工现场的安全管理、检查落实工作

施工前安全措施的落实检查，主要是根据施工方案提出的安全措施，贯彻落实情况进行检查，使安全措施落实到实处。

施工过程中的安全检查在施工过程中的安全检查分为定期检查各专业性、季度性等检查，定期检查主要是了解掌握整个施工安全管理情况，安全技术状况，为完善安全生产控制坟墓，搞好安全生产提供依据，对隐患提出整改和预防措施，确保安全生产。专业性检查主要是对专业性较强的安全技术状况进行检查。季节性检查主要是针对自然环境的变化特点所进行检查，提出整改措施。检查主要内容：一查思想：即检查施工各级管理人员、技术干部和工人是否树立“安全第一，预防为主”的思想；二查制度：即查安全生产制度及规范、标准、规章的落实情况；三是措施：即查是否按安全技术措施交底执行和安全设施落实情况；四查隐患；查隐患是减少事故发生有效方法在施工过程中，对查出的事故隐患难与提出整改措施，整改责任人，限时整改。从而不折不扣地执

行规范和操作规程，始终抓预防落实工作，保证达安全生产的目的。

在施工中坚持全员、全过程、全方位、全天候的“四全”动态安全管理，不断提高安全生产水平。

安全生产的经济保证

安全生产经济保证是应按有关规定和本项目所列措施费等提取费用，保证安全防范设施配齐、到位，职工劳保用品及时发放，同时对安全生产实行奖罚制度。

安全生产防范措施的执行

经过批准的安全生产防范具有技术法规的作用：必须认真执行遇到因条件变化或考虑不同尺寸应按规定及时修正、变更。施工中各种安全设施，防护设置应列入任务点，落实责任到班组或个人并实行验收制度。项目总工、安全技术人员要经常深入工地检查安全生产防范措施的实施情况，及时纠正违反规定的行为。

加强劳保保护工作

根据不同工种的配备相应的安全防护用品，向参加本项目建设的所有人员发放安全帽和相应的安全用具，作业过程应注意的问题如下：

进入施工现场人员必须强制带安全帽。

对坑井口、预留洞口必须设置围栏、盖板或架网。

在交叉处要设置安全行车标志，夜间作业灯光要足，目标清楚，避免施工人员受外来车辆意外受伤。

注意工地机械设备的机械技术状态，常维护保养，完好率达95%以上。

注意工地用电管理：线路架设要规范，派专人电工负责管理，并应注意安

装漏电保护器。

实行安全生产奖罚制度。

（3）突发事件处理措施；

安全预警机制

本工程施工管理中本公司将首先建立现场施工安全重大危险源预警机制，强调“安全第一、预防为主”、“安全责任、重于泰山”的安全管理方针，开展本工程施工安全重大危险源辨识与防治管理。具体措施如下：

本项目设一名事故预防员，负责现场所有人员的人身和安全事故预防工作，其有权发布指示，及采取防止事故的保护措施。事故发生后，立即报告有关单位，并采取妥善的处理措施。

进场之初事故预防员对本工程现场的危险源进行识别，并列出详细清单，制作重大危险源识别检查表，施工中依据该检查表进行经常性检查。

现场事故预防员每半个月对各专职安全员施工中的安全检查记录进行汇总分析，识别本阶段安全危险情况的发展趋势，及时在安全会议上公布，发布预警信息，及时提出警示，并将有关情况再现场工人生活区张贴公示。

其他情况预警机制

考虑本工程特点，对可能影响正常生产的用电及材料供应等环节编制紧急情况预案，确保在各种不利条件下依然能够满足现场的正常施工。

建立紧急情况处置组织体系

项目建立以项目经理为组长的紧急情况处置领导小组，项目副经理、安全总监和事故预防员为副组长，并形成由公司总部、社会机构、项目相关职能部门等共同参加的紧急情况处置组织体系。

领导小组负责统一指挥、调动，并根据发生情况的危害程度，采取对应措施并组织实施。同时向上级和社会有关援助部门（机关）报告请求援助，事后对发生事故的原因组织人员调查，对造成重大损失的相关责任人做出相应处理。

紧急情况的处理措施、预案

材料供应的处理措施、预案

本公司有完善的材料、设备供应商服务网络，拥有大批重合同、守信用、有实力的供应商，能保证工程所需材料、设备随时进入现场。

根据工程进展，各专业工程师提前做好材料需求计划，项目材料部门及时采购。

项目试验员对进场材料及时取样（见证取样）送检，并将检测结果及时呈报监理工程师。及时向监理工程师呈报进场材料合格证，材料供应商资质证明等。

配置高效、环保性能好的机械设备，保证工程所需材料能及时加工并运输至施工层，同时减少对周边环境的影，进行施工用电线路的维护，同时配备 30 部手提应急灯及 30 部手电筒。为保证施工机械在施工过程中运行的可靠性，项目加强对设备的维修保养，对机械易损件的采购储存，落实定期检查制度，保证设备运行状态良好。

突然停电及机械故障的处理措施、预案

现场除利用业主提供的电源作为正常状态下的施工用电，同时现场配备柴油发电机组，作为备用电源，给重要机械及重要部位的照明供电。

现场配电室设置联络柜，柴油发电机组通过联络柜与市政供电线路相互切换，并形成连锁，设置手/自动转换开关，当市电断电后，可通过自动或手动方式启动柴油发电机组,并保证正常照明及 30 分钟的应急照明时间。

在楼梯间、疏散通道、场区消防通道设置疏散指示标志。建筑物的出入口、楼梯间、疏散通道、施工场区的消防通道以及办公区的照明纳入应急供电。停电后，立即启动柴油发电机，由维修电工携带手提应急灯进入施工楼层，检查楼内的照明恢复情况，同时引导工人有秩序撤出。

项目配备 2 名维修电工。

项目部每月由专人组织维修电工对现场电气线路、灯具、配电箱进行检查，每月启动柴油发电机组一次，保证柴油发电机组能随时正常使用。检查结果形成文字记录，并由检测人员签字认可，制定相关责任制。

消防的处理措施、预案

成立义务消防队，并严格按国家文件规定建立相应的消防防范设备。沿建筑物（基坑）周边敷设直径 DN100 钢管作为临时给水源，水管埋深 800mm。现场周边地下式消防栓（设消防栓井），并且每个消防箱配备（内设消防水带 50m、消防枪一个），设明显标志牌，以满足现场周边消防要求。建筑物消防用水由环线水管引到楼层内，并配备成套消防箱，设明显标志牌，以满足楼层现场的消防要求。

采取黑板报、观看 VCD 等形式普及消防知识，提高全体职工的消防意识。

每季举行一次消防演习活动，增强员工的应急应变能力。（4）发现火情者要大声呼喊，并及时向项目部领导汇报。（5）消防队长负责现场总指挥，同时

向上级领导报告。

义务消防队员用灭火器、消防桶提水、用铁锹铲土灭火,并负责打开消防栓接上水龙带灭火。

由安全员对火情发展态势进行判断，必要时，打 119 电话报警，并安排人员接车。

3 卫生防疫的处理措施、预案

成立疫情管理机构

成立疫情隔离控制指挥部、负责隔离控制协调指挥工作，指挥部由业主、总包单位、监理单位、分包单位的主要负责人和政府、卫生防疫部门、公安机关负责人共同组成，总承包单位负责人负总责。

成立现场应急管理机构，对工地疫情防治、隔离控制、生活保障、治安保卫及对外联系实施具体管理，现场应急管理机构由业主、总承包单位、监理单位和分包单位项目负责人组成，总承包单位项目负责人负总责。

对疫情工地实行严格封闭管理

现场设立隔离区，切断工地与外界的直接接触，隔离区设立醒目标识，禁止无关人员入内，防止疫情扩大。

加强现场保卫，每日 24 小时巡逻检查和门卫 24 小时值班，配备足够的保安人员，保证发生疫情后，工地人员不外出。

工地内采取严密的隔离措施

对于与疫情密切接触者，进行重点隔离，密切接触者严格按防疫部门要求

采取严密的隔离措施。

加强对疫情密切接触者隔离区的管理，不得与隔离人员接触，隔离人员不得到隔离区外活动。

做好隔离区内疫情防治工作。

配合卫生防疫部门，做好对隔离区的消毒工作。 对隔离区人员每天进行体检，并认真做好记录。

做好对隔离人员的宣传教育工作。普及预防知识，做好隔离区人员思想工作，排除恐慌心理，积极服从和配合卫生防疫部门做好防治工作。

杜绝私自出走或不服从管理的事件发生。

抵抗风险措施

风险因素识别

依据项目承包内容、分包管理、项目管理人付款、市场变化、气候条件等背景资料，本公司施工同类工程的经验及潜在的因素，本项目的风险主要存在于以下几个方面：技术风险，管理风险，过程控制风险，质量风险，市场风险，法律法规，职业安全风险，环境风险，项目管理人及利益相关者等方面。

潜在风险的分类及应对措施

技术风险

风险内容：施工方法选择不当，试验不合格；事前应对措施：优化技术方案；事中应对措施：制定补救措施；事后应对措施：评估事件技术改进；

管理风险

风险内容：管理不到位个人能力差，施工队素质低；事前应对措施：明确管理机制劳务队预审；事中应对措施：调整组织结构启动备选合格劳务队；事后应对措施：评估事件原因将施工队从合格劳务队中删除；

过程控制风险 风险内容：协调不到位；事前应对措施：工程例会协调；事中应对措施：强化施工过程管理；事后应对措施：进行总结，改进管理；

质量风险风险内容：质量缺陷；事前应对措施：制定创优计划；

事中应对措施：分析质量原因，调整管理方案；事后应对措施：质量总结，开质量分析会；

职业安全风险

风险内容：安全事故传染病；事前应对措施：制定应急预案；

事中应对措施：启用应急预案；

事后应对措施：进行总结，调整应急预案；

环境风险

风险内容：环保不达标；

事前应对措施：制定环境管理计划，制定预案并检查；事中应对措施：及时整改；事后应对措施：对责任人处理；

（4）工伤处理方案；

参加工伤事故的调查、分析，提出技术鉴定意见和整改措施。

（3）项目工长安全生产责任制

在项目经理领导下，对所分管的单位工程或分部工程的安全生产负直接责

任。

认真执行安全生产的各项规章制度，组织实施各项安技措施并带头遵章守纪，不违章指挥。

认真对新进场工人及变换工种工人的入场教育和经常的安全喊话；组织班组学习安全操作规程，检查和指导班组开展安全活动及施工操作“落手清”活动。

经常检查安全生产情况和安全设施状况及时违及止违章违纪行为和消除事故隐患。

按要求进行书面的安全技术交底并检查落实情况。

参加对架设工程临边洞口安全防护、各类起重设备、临时用电线路的检查验收，坚持验收合格后方能使用。

参加项目每周或半月一次的安全检查及上级部门的安全检查，认真组织和落实。

发生工伤事故立即向项目经理报告并组织抢救伤员和保护好现场。

（4）项目安全员安全生产责任制

负责本项目安全管理的具体工作。

经常学习和宣传各种安全标准、法规和制度，协助项目经理健全各项安全管理制度和各种标牌。

协助进行各种安全教育和安全技术交底，认真检查班组落实情况。

参与拟定并熟悉施工组织设计中的安全技术措施，协助项目经理逐项落实。

协助、组织对架设工程等的内部检查、验收和参加上级部门的检查、验收，认真作好记录。

经常检查工人遵章守纪情况和安全防护设施完善情况，及时纠正违章违纪行为和协助项目经理完善防护设施，消除安全隐患。

协助项目经理组织每周或半月一次的安全检查，认真记录并督促检查整改措施的落实。

参加工伤事故的调查、分析，进行事故统计上报，

检查整改措施的落实。

（5）项目机械员安全生产责任制

负责项目机械设备的安全管理工作。

掌握机械人员情况，并登记造册连同操作证复印件一同存入资料袋。

按要求设置好机械二牌(操作规程牌、岗位责任制牌及操作人员牌)，经常教育机械人员遵章守纪，安全作业。

参与机械设备的安装、调试及检查验收工作并收集、整理调试及验收资料入档。

经常检查机械安全使用状况及人员遵章守纪情况，发现隐患及时协助解决，发现违章及时纠止。

负责安排机械设备的维修保养工作，督促机操人员作好“十字”

参加上级部门组织的机械检查及安全检查，作好记录并督促、检查存在问题的整改。

参与机械事故的调查、分析工作，吸取事故教育，防范措施。

（6）项目内业人员安全生产责任制拟定并实施

在项目经理指导下拟定或协助拟定施工组织设计(或方案)中的安全技术措施和施工临时用电方案。

协助项目经理检查和指导安技措施及施工临时用电方案的实施情况。

协助项目经理或工长作好安全技术交底工作。

作好各种安全内业资料的收集和整理工作，并分类成册，写出目录，作到规范化、标准化。

认真进行各种安全会议和安全检查记录并整理入册。

协助项目经理和工长作好安全教育并认真填写安全教育卡。

建立现场事故档案和违章违纪及处罚的记录。

协助项目经理完善现场各项规章制度和各处标牌。

1.5 应急工作原则

1.5.1 预案是发生紧急情况时的处理程序和措施。

1.5.2 预案是针对可能造成人员伤亡、财产损失和环境受到严重破坏而又具有突发性的事故、灾害。

1.5.3 预案是以努力保护人身安全为第一目的，同时兼顾财产安全和环境防护。

1.2.4 预案应本着“预防为主、分工负责、统一指挥、分级响应”的基本原

则，贯彻“单位自救和社会救援相结合”的总体思路，充分发挥企业在事故应急处理中的重要作用，尽量减少事故、灾害造成的损失。

1.5.5 预案要结合实际，措施明确、具体、具有很强的可操作性。

1.5.6 预案应符合国家法律法规的规定。

1.6 危险源与风险分析

从可能危害社区的重要角度来看，一个施工项目应当确定为一个危险源，进行风险分析；对企业项目安全管理来看，一个施工项目过程可能包含若干个危险源，进行风险分析。

1.6.1 焊接、金属切割、冲击钻孔（凿岩）等施工及各种施工电器设备的安全保护（如：漏电、绝缘、接地保护、一机一闸）不符合，造成人员触电、局部火灾等意外；

1.6.2 工程材料、构件及设备的堆放与搬（吊）运等发生高空坠落、堆放散落、撞击人员等意外；

1.6.3 施工用易燃易爆化学物品临时存放或使用不符合、防护不到位，造成火灾或人员中毒意外；工地饮食因卫生不符合，造成集体中毒或疾病。

1.7 组织机构及职责

1.7.1 应急组织体系

1.7.2 应急组织职责

（1）应急指挥部职责

研究制定、修订本公司应对建设工程事故的政策措施和指导意见。

负责指挥特别建设工程施工事故的具体应对工作。

分析总结本公司建设工程施工突发事故应对工作，制定工作规划和年度工作计划。

负责本指挥部所属应急抢险救援队伍的建设和管理。

承办上级应急委员会交办的其他事项。

（2）应急救援总指挥

分析紧急状态确定相应报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型；

指挥、协调应急反应行动；

与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络；

直接监察应急操作人员行动；

最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全；

协调后勤方面以支援应急反应组织；

应急反应组织的启动；

应急评估、确定升高或降低应急警报级别；

通报外部机构，决定请求外部援助；

决定应急撤离，决定事故现场外影响区域的安全性。

（3）应急救援副总指挥

协助应急总指挥组织和指挥应急操作任务；

向应急总指挥提出采取的减缓事故后果行动的应急反应对策和建议；

保持与事故现场副总指挥的直接联络；

协调、组织和获取应急所需的其它资源，设备以支援现场的应急操作；

组织公司总部的相关技术和管理人员对施工场区生产过程各危险源进行风险评估；

定期检查各常设应急反应组织和部门的日常工作和应急反应准备状态；

根据各施工场区、加工厂的实际条件，努力与周边有条件的企业为在事故应急处理中共享资源、相互帮助、建立共同应急救援网络和制定应急救援协议。

（4）现场抢救组

抢救现场伤员；

抢救现场物资；

组建现场消防队；

保证现场救援通道的畅通。

（5）安全疏散组

负责事故现场的警戒；

阻止非抢险救援人员进入现场；

负责现场车辆疏通；

维持治安秩序；

负责保护抢险人员的人身安全。

（6）医疗救护组

负责现场伤员救护；

记录伤员伤情；

协助 120 和上级部门对伤员的抢救。

（7）善后处理组

做好伤亡人员及家属的稳定工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定，大灾之后不发生大乱；

做好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾；

与保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作；

慰问有关伤员及家属。

（8）后勤保障组

协助制订施工项目或加工厂应急反应物资资源的储备计划，按已制订的项目施工生产厂场的应急反应物资储备计划，检查、监督、落实应急反应物资的储备数量，收集和建立并归档；

定期检查、监督、落实应急反应物资资源管理人员的到位和变更情况及时调整应急反应物资资源的更新和达标；

定期收集和整理各项目经理部施工场区的应急反应物资资源信息、建立档案并归档，为应急反应行动的启动，做好物资源数据储备；

应急预案启动后，按应急总指挥的部署，有效地组织应急反应物资资源到施工现场，并及时对事故现场进行增援，同时提供后勤服务。

（9）事故调查组

保护事故现场；

对现场的有关实物资料进行取样封存；

调查了解事故发生的主要原因及相关人员的责任；

按“三不放过”的原则对相关人员进行处罚、教育、总结。

应急预案启动后，根据事故现场的特点，及时向应急总指挥提供科学的工程技术方案和技术支持，有效地指导应急反应行动中的工程技术工作。

1.8 危险源监控

1.8.1 工程开工前认真编制施工组织设计或专项施工方案，制定出防控措施，并严格执行审批程序。

1.8.2 在工程施工过程中，严格按照方案实施，严格执行现场危险性较大分部分项工程验收程序，落实防控措施。

1.8.3 加强现场巡视，对危险源进行辨识登记，掌握危险源的数量和分布状况，实施相应的预防控制措施。

1.8.4 加强监督检查和日常巡查，对危险源防控措施进行动态监控，认真整改存在隐患和问题。

1.8.5 认真落实各项安全生产责任制、管理制度和操作规程，加强安全教育，严格检查处罚，切实增强全员安全责任意识。

1.8.6 淘汰落后的技术、工艺，适度提高工程施工安全设防标准，从而提升施工安全技术与管理水平，降低施工安全风险。

1.8.7 制订和实行施工现场大型施工机械安装、运行、拆卸和外架工程安装的检验检测、维护保养、验收制度。

1.8.8 制订和实施项目施工安全承诺，确保安全投入。

1.9 信息报告与处置

1.9.1 信息报告与通知

公司应急救援组织设立 24 小时值班电话。

突发安全事故时，事故发现人员立即报告项目负责人，由项目负责人拨打值班电话报告事故情况或直接报告应急救援副总指挥和总指挥。应急值班人员接警后，立即将警情报告应急救援总指挥、副总指挥。

为有效开展事故救援活动，现场项目负责人应在第一时间寻求社会救援力量。

火灾：项目负责人拨打 119，向公安消防部门求援。

急救：项目负责人拨打 120，向医疗急救中心求援。

报告应包括以下内容：事故发生时间、类别、地点和相关设施；遇险人员人数；现场联系人姓名和电话等。

应急救援总指挥、副总指挥事故报告后，符合本预案启动条件时，立即发出启动本预案的指令；应急值班人员接到启动应急预案命令后，立即向各救援小组成员下达赶赴现场指令。

接到突发安全事故指令的各救援小组立即赶赴事故现场进行现场抢救排险。

根据事故类别及时向事故发生地政府主管部门报告。

1.9.2 信息上报

事故信息上报采取分级上报原则，最终由公司主管经理向政府有关部门上报。

信息上报内容包括：事故发生单位情况；事故发生的时间、地点、部位以及事故现场情况；初步掌握的人员伤亡（包括下落不明的人数）、直接经济损失等情况；可能造成的危害以及采取的措施；事故报告单位、报告人、批准人、报告时间及联系方式等。事故伤亡人数及直接经济损失情况发生变化的，应当及时补报。

按照国家规定，在 1 个小时内向事故发生地建设行政主管部门进行报告。

1.9.3 信息传递

事故现场第一发现人员现场项目负责人应急值班电话或直接报告应急救援副总指挥和总指挥各应急小组应急小组人员公司有关部门。

（5）农民工工资发放保障措施。

第一，协商。劳动争议发生后，尤其是工伤待遇争议发生后，双方当事人应当首先进行协商，以达成解决方案。这是最为常见的、也往往是双方都容易接受的。事实上，矛盾不太尖锐的工伤待遇争议，常常都是以这个程序来解决的。对职工来讲，尤其要注意使用协商的方式解决纠纷，因为发生工伤的职工，往往还要在该用人单位工作，如果过分强调用诉讼的方式解决问题，可能会为今后的工作带来不便。当然，我们并不是说要对用人单位作不恰当的妥协，而是想要强调，协商是双方最易接受，效果也最好的方式。

第二，调解。就是企业调解委员会对本单位发生的劳动争议进行调解。从法律、法规的规定看，这并不是必经的程序。但它对于劳动争议的解决却起到很大作用，特别是对希望继续留在本单位工作的职工来说，能够通过调解来解决劳动争议，也不失为一种理想的选择。

第三，仲裁。劳动争议调解不成的，当事人可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人也可以不经调解直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。根据规定，当事人从知道或应当知道其权利被侵害之日起 60 日内，以书面形式向仲裁委员会申请仲裁。仲裁委员会应当自收到申请书之起 7 日内作出受理或不予受理的决定。仲裁庭处理劳动争议自组成仲裁庭之日起 60 日内结束。对于案情复杂需要延期的，经报仲裁委员会批准，可以适当延期，但延长的期限不得超过 30 日。需要强调的是，仲裁是劳动争议处理的必经程序。就是说，当事人未经仲裁程序不得直接向人民法院起诉，否则，人民法院不予受理。

第四，诉讼。当事人对仲裁裁决不服的;可以自收到仲裁裁决书之日起 15 日内向人民法院起诉。人民法院民事审判庭则依据民事诉讼法和劳动法等的规定，受理和审理劳动争议案件。审理期限为 6 个月，如果有特殊情况需要延长的，经院长批准可以延长。当事人如果对人民法院的一审判决不服，可以提起上诉，二审判决是终审判决，当事人必须执行。

二、用人单位什么时候签合同

《劳动合同法》要求用人单位必须在用工之日起一个月内与劳动者签订劳动合同，如自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。本条的规定，给了用人单位一个终止劳动

关系的选择权。当然，这里用人单位需举证证明已经书面通知劳动者签订合同，而劳动者不签订书面劳动合同，因此，用人单位应当具有证据意识，在书面通知送达时应当有劳动者的签收证据或其它可证明已经向劳动者送达书面通知的证据，否则会弄巧成拙。

《劳动合同法》第六条规定用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当依照劳动合同法第八十二条的规定向劳动者每月支付两倍的工资，并与劳动者补订书面劳动合同;劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，并依照《劳动合同法》第四十七条的规定支付经济补偿。

很显然劳动合同方面的纠纷，肯定是发生在劳动者与用人单位之间的，其中比较常见的纠纷就是单位不按照法律中的规定与劳动者签订书面的劳动合同或者在劳动合同当中格外约定由劳动者承担违约责任的情形，遇到这类纠纷可以从上述解决途径中选择恰当的进行处理。

（一） 仲裁的原则

强制仲裁的原则。我国《劳动法》第 79 条规定：“劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。”劳动争议的仲裁不是当事人自愿选择的结果，而是法律的强制性规定，是当事人进行劳动权益救济的必经程序。

先行调解原则。《劳动争议调解仲裁法》第 42 条规定：“仲裁庭在作出裁

决前，应当先行调解。·····调解不成或者调解书送达前，一方当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。”所以调解是仲裁的先行程序，必经程序。

一裁原则。劳动争议仲裁实行一次裁决制度，除《劳动争议调解仲裁法》有特殊规定的除外，当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼；期满不起诉的，裁决书发生法律效力。

仲裁独立原则。劳动争议当事人对仲裁决定不服的，向人民法院起诉的，人民法院应以争议的双方为诉讼当事人，不应将劳动争议仲裁委员会列为被告或第三人。也就是说仲裁和诉讼的效力是各自独立的。

除以上几个原则外，劳动争议仲裁还应遵循区分举证责任原则、合议原则、回避原则等。

（二）仲裁的程序

申请。根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，仲裁时效期间从当事人知道或应该知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

申请人申请仲裁应当提交书面仲裁申请，并按照被申请人人数提交副本。仲裁申请书应当包括以下内容：a. 劳动者的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所，用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；b. 仲裁请求和所根据的事实、理由；c. 证据和证据来源、证人姓名和住所。

受理。劳动争议仲裁委员会收到仲裁申请之日起5日内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知申请人；认为不符合受理条件的，应当书面通知申请人不予受理，并说明理由。对劳动争议仲裁委员会不予受理或逾期未作出决定

的，申请人可以就该劳动争议事项向人民法院提起诉讼。

劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在5日内将仲裁申请书的副本送达被申请人。被申请人收到副本后，应在10日内向劳动争议仲裁委员会提交答辩书。劳动争议仲裁委员会收到答辩书后，应当在5日内将答辩书副本送达申请人。

开庭和裁决。

庭前准备。仲裁庭的组成：劳动争议仲裁委员会裁决劳动争议案件实行仲裁庭制。仲裁庭由3名仲裁员组成，设首席仲裁员。简单劳动争议案件可以由1名仲裁员独任仲裁。劳动争议仲裁委员会应当在受理仲裁之日起5日内将仲裁庭的组成情况书面通知当事人。

审理。开庭审理按以下步骤进行：

第一， 仲裁庭应当在开庭5日前，将开庭日期、地点书面通知双方当事人。

第二， 仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定机构鉴定；当事人没有约定或者无法达成约定的，由仲裁庭指定的鉴定机构鉴定。

第三， 当事人在仲裁过程中有权进行质疑和辩论。

第四， 当事人提供的证据经查证属实的，仲裁庭应当将其作为认定事实的根据。

第五， 仲裁庭应当将开庭情况记入笔记。

第六， 当事人申请劳动争议仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以撤回仲裁申请。

第七， 仲裁庭在作出裁决前，应当先行调解。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书。

审理期限。仲裁庭裁决劳动争议案件，应当自劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请之日起 45 日内结束 。案情复杂需要延期的，经劳动争议仲裁委员会主任批准，可以延期并书面通知当事人，但是延期不得超过 15 日。

裁决书。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见应当记入笔录。裁决书应当载明仲裁请求、争议事实、裁决理由、裁决结果和裁决日期。裁决书由仲裁员签名，加盖劳动争议仲裁委员会印章。

裁决的效力。下列劳动争议， 仲裁裁决为终局裁决，裁决书自作出之日起发生法律效力：a. 追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿金，不超过当地月最低工资标准 12 个月金额争议；b. 因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保障等方面发生的争议。劳动者对上述仲裁不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。

裁决的执行。当事人对发生法律效力的调解书、裁决书，应当依照规定的期限履行。一方当事人逾期不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受理的人民法院应当依法执行。

售后服务方案及承诺

（1）服务响应时间

售后服务响应时间和质量承诺

致：玛沁县自然资源和林业草原局

感谢建设单位对我公司的信任，使我公司有机会参加**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六**的投标，我们十分珍惜这次宝贵机会。为了市民观赏草花的消费物有所值，也为了我公司在强大的市场竞争中不断进步和发展，我们特向所有客户作出如下庄严承诺：

我公司将为本项目提供售后服务承诺和管理维护。

根据设计方案、甲方的实际情况和要求，以最快的速度和最优质的肥料到指定地点进行栽植。

我们将对进场的肥料进行严格的质检：

对肥料进行综合、立体的检查，使之做到清洁、卫生。

对肥料进行整形，使之具有最佳的看面和装饰效果。

对需进行土壤处理的肥料进行土壤处理，使之更适合于客户的环境空间。

我们承诺在整个补植补种过程中做到以下几点：

按业主要求在规定日期内完成承包范围内的补植补种工作。

养护范围内的植物，正常情况下，按规定须保证成活率达到 90%（绿化肥料死亡率低于 10%）。

因养护不当，造成植物死亡，经双方确定、在收到甲方补植补种书面通知书后的 10 日内负责补种同样品种和规格的植物，并保证成活。

保证绿化内无杂草、无虫害、无病死，养护所需一切资材：如工具、农药、化肥、除草剂等均由我方负责。

因不可抗力的自然灾害造成养护植物死亡及非我方人员因素造成养护植物死亡的不属于我方负责范围。（但在风季必须先行采取用支架对树木进行必要的防护）。

各类肥料种植和养护作业后所产生的绿化垃圾（泥土、枯枝、草坪等），均由我方负责清理。

快速响应机制

设立 7×12 小时售后热线及在线客服，接到问题后 1 小时内确认需求，紧急情况 3 小时内出具初步解决方案。

针对远程无法解决的问题，24 小时内安排技术人员上门勘察，根据距离协商最快到达时间。

问题分类处理

质量问题：收到肥料后 7 天内发现死苗、规格不符等，免费补发或退换货，承担运输费用。

突发状况：如遇极端天气导致肥料受损，48 小时内提供补救方案，成本价供应修复所需材料。

售后承诺

质保期限

乔木类质保按合同约定执行，质保期内因非人为因素死亡的肥料，免费更换并承担二次种植费用。

终身跟踪服务

质保期结束后，仍提供长期养护咨询服务，每年定期回访（春季、秋季各 1 次），提醒季节性养护要点，优先以成本价供应肥料所需肥料、农药。

服务监督

设立投诉渠道，投诉事项 24 小时内受理，3 个工作日内反馈处理结果，确保客户满意度达 95%以上。

以上措施旨在从售后响应到长期保障，为客户解决肥料种植过程中的后顾之忧，以专业服务提升合作体验。。

完善的服务，至始至终是我们的宗旨，顾客的满意是我们永远追求的目标，我们将以优质的服务，严密、科学、智能化的管理为您奉献高档次的肥料和绿化生活空间！

投标人：**青海泽标建设工程有限公司**（盖单位章）

2025年07月15日

售后服务计划、 措施及服务承诺

致：玛沁县自然资源和林业草原局

我公司承蒙贵单位信任，参加贵单位**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六**（项目名称）的招标工作深感荣幸，我公司郑重向贵局承诺：

若我公司中标，在七个工作日内按规定缴清农民工工资保障金及履约保证金。

若我公司中标，中标后所有现场施工所需协调事宜，均有我公司自行负责协调解决。

售后服务：响应文件。

标段名称：青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六

服务期限：120（具体按合同约定执行）。

交货地点：拉加镇、东倾沟乡

若我公司中标，中标后负责人承诺到施工现场检查工作。

特此承诺！

投标人：**青海泽标建设工程有限公司**（公章）

法定代表人或委托代理人：李积英（签字或盖章）

2025年07月15日

售后服务措施及服务承诺

致：玛沁县自然资源和林业草原局

我公司为客户提供最优质产品和完善的售后服务。我公司的质量方针：精心操作，严格管理；品质创优，真诚服务；依存客户，持续改进。

为前提，严格按照用户要求为标准，为客户提供最满意的服务。

一、 组建售后服务机构



★ 思想上统一：

为确保该项目的顺利实施，领导重视、思想统一，将于中标后第一时间，抽调技术骨干，专门成立售后服务部。

★ 组织上得力：

公司售后服务人员，均经过严格的专业技能培训，具备了解牧草种子品种、性能；了解补播施工程序技术能力；了解程序技术能力。

★ 技术负责人：

届时，将由项目经理、技术负责人、公司主要管理人员组成有力的服务队伍，保障该项目售后服务工作的实施。

★ 人力资源保障：

售后服务机构的所有成员，均相关工作经验三年以上，最大限度让业主放心、让牧民安心。

二、售后服务内容及措施

我公司按国家有关法律法规和“三包”规定以及合同规定的服务承诺提供服务。验收通过了达到95%。在质保期内有任何质量问题，1小时内响应客户，24小时内回复，**甲方需要提供服务时需 6 小时内到达现场。**如果成活率达不到作业设计要求，由此产生的费用有过公司承担。

三、公司还提供免费培训服务，并指派专人负责与业主方联系售后服务事宜。

四：以下是我公司长期有效的联系方式

联系单位：**青海泽标建设工程有限公司**

联系地址：**青海省西宁市南川东路85号**

联 系 人：**李积英　　总经理　　0971-6249989**

本承诺作为本投标文件中的正式附件，是正式合同具有同等法律效应。

投标人：**青海泽标建设工程有限公司**（盖单位章）

2025 年 07 月 15 日

定期跟踪

一、售后服务方式

（一）线上服务

1. 即时通讯平台：建立微信、QQ 服务群，安排专业技术人员实时在线，及时解答项目方关于防沙治沙技术、植被养护、设施维护等方面的疑问。同时，定期在群内推送防沙治沙知识、最新技术动态、季节性养护提醒等信息。

2. 在线服务平台：开发专属售后服务 APP 或网页平台，设置问题反馈、技术咨询、资料下载、服务进度查询等功能模块。项目方可在线提交服务需求、上传现场照片和视频，技术人员通过平台远程诊断并提供解决方案，还可实现服务流程线上化管理，方便项目方随时了解服务进展。

3. 远程视频指导：针对一些技术操作问题，如灌溉设备调试、简单的病虫害识别与防治等，通过视频会议软件进行远程实时指导，让项目方工作人员在技术人员的指导下完成操作，提高解决问题的效率。

（二）线下服务

1. 定期巡检：组建专业巡检团队，根据项目规模和实际需求，制定季度、半年度或年度巡检计划。对项目区域的植被生长情况、工程设施运行状况进行全面检查，记录存在的问题，并及时进行维护和修复，同时形成详细的巡检报告反馈给项目方。

2. 现场培训：定期组织防沙治沙技术现场培训活动，邀请行业专家、技术骨干进行授课和实操演示。培训内容涵盖植被种植与养护技术、工程设施维护要点、生态监测方法等。通过理论讲解与实际操作相结合的方式，提升项目方及当地工作人员的防沙治沙专业技能和管理水平。

3. 应急响应服务：设立 24 小时应急响应机制，配备专业的应急维修队伍和物资储备。当接到项目方紧急求助信息后，应急队伍迅速响应，携带必要的设备和物资赶赴现场，开展应急抢修和处置工作，保障防沙治沙项目的正常运行。

（三）合作服务

1. 与科研机构合作：联合高校、科研院所等专业机构，为项目方提供技术支持和科研成果转化服务。针对项目中遇到的复杂技术问题，组织专家团队进行联合攻关，将最新的科研成果应用到防沙治沙实践中。

2. 多方联动服务：建立与政府部门、行业协会、企业等多方合作的服务网络。整合各方资源，为项目方争取政策支持、资金扶持和资源对接服务，同时促进防沙治沙经验交流与合作，共同推动行业发展。

二、售后服务特色

（一）全周期服务体系

从项目竣工交付开始，提供涵盖植被生长周期、工程设施使用寿命的全周期售后服务。针对不同阶段的特点和需求，制定个性化的服务方案，确保防沙

治沙成果长期稳定。例如，在植被种植初期重点关注成活率和幼苗养护，中期注重群落结构优化和病虫害防治，后期加强生态系统的稳定维护。

（二）定制化服务方案

根据不同项目的地理位置、气候条件、生态环境、建设目标等因素，量身定制售后服务方案。充分考虑项目方的实际需求和预算，提供差异化的服务内容和服务方式，确保服务的针对性和有效性。

（三）数字化管理模式

引入物联网、大数据、地理信息系统（GIS）等先进技术，对防沙治沙项目进行数字化管理。通过在项目区域安装传感器、监测设备等，实时采集植被生长、土壤水分、风速风向、工程设施状态等数据，建立数据库和分析模型。基于数据分析结果，为售后服务提供科学决策依据，实现精准服务和智能化管理。

（四）生态效益导向

以提升生态效益为核心目标，不仅关注植被覆盖度、工程设施完好率等直观指标，更注重对土壤改良、生物多样性恢复、风沙活动减弱等生态系统整体功能的评估和改善。通过长期的生态监测和数据分析，不断优化售后服务策略，促进防沙治沙区域生态环境的可持续发展。

（五）公益与商业结合

在提供专业化商业售后服务的同时，积极开展生态治理公益活动。组织志愿者参与植被种植、生态宣传等活动，提高公众对生态保护的认识和参与度，树立良好的企业社会形象，实现经济效益与社会效益的双赢。





服务人员及服务机构

售后服务机构的所有成员，均相关工作经验三年以上，最大限度让业主放心、让牧民安心。

二、售后服务内容及措施

我公司按国家有关法律法规和“三包”规定以及合同规定的服务承诺提供服务。验收通过了达到90%。在质保期内有任何质量问题，1小时内响应客户，24小时内回复，**甲方需要提供服务时需 6 小时内到达现场。**如果成活率达不到作业设计要求，由此产生的费用有过公司承担。

三、公司还提供免费培训服务，并指派专人负责与业主方联系售后服务事宜。

售后服务人员的配置及联系方式

职务	姓名	联系方式
售后服务经理	陈慧	13997165993
售后服务专员	王晓梅	15500799275
售后服务专员	郭建芬	18797097950

售后质量服务承诺

一、培训及售后服务：

我公司是信用企业，有完善健全的质量管理体系。公司成立以来始终不渝地贯彻“满足顾客合同要求，确保产品的质量，为客户提供优质服务”的质量方针，加强生产一线和施工全面质量管理，努力提高全体职工的质量意识，因此本公司产品有很好的信誉。

如有幸在此次项目中中标我们仍将一如既往，将一流的质量，一流的售后服务贯彻到整个技术服务中去。

此次投标我公司响应招标文件要求，产品质保期内出现质量问题，我公司无条件更换，产品质保期后延。

二、我方保证：

1、该服务并不能免除我方在合同保证期内所承担的义务。

2、保证售后服务提供的货物是全新的、能正常使用的。

三、本服务保证在最后一批合同货物到达最终目的地后的一年内有效。

四、我公司若有幸中标，本计划即为售后服务承诺，作为合同附件，与合同具有同等的法律效力。

投标人：青海泽标建设工程有限公司（盖单位章）

2025 年 07 月 15 日

售后服务方案

紧急情况的处理措施、预案

建立紧急情况预警机制

安全预警机制

本工程施工管理中本公司将首先建立现场施工安全重大危险源预警机制，强调“安全第一、预防为主”、“安全责任、重于泰山”的安全管理方针，开展本工程施工安全重大危险源辨识与防治管理。具体措施如下：

本项目设一名事故预防员，负责现场员工人员的人身和安全事故预防工作，其有权发布指示，及采取防止事故的保护措施。事故发生后，立即报告有关单位，并采取妥善的处理措施。

进场之初事故预防员对本工程现场的危险源进行识别，并列出详细清单，制作重大危险源识别检查表，施工中依据该检查表进行经常性检查。

现场事故预防员每半个月对各专职安全员施工中的安全检查记录进行汇总分析，识别本阶段安全危险情况的发展趋势，及时在安全会议上公布，发布预警信息，及时提出警示，并将有关情况再现场工人生活区张贴公示。

其他情况预警机制

考虑本工程特点，对可能影响正常生产的用电及材料供应等环节编制紧急情况预案，确保在各种不利条件下依然能够满足现场的正常施工。

建立紧急情况处置组织体系

项目建立以项目经理为组长的紧急情况处置领导小组，项目副经理、安全

总监和事故预防员为副组长，并形成由公司总部、社会机构、项目相关职能部门等共同参加的紧急情况处置组织体系。

领导小组负责统一指挥、调动，并根据发生情况的危害程度，采取对应措施并组织实施。同时向上级和社会有关援助部门（机关）报告请求援助，事后对发生事故的原因组织人员调查，对造成重大损失的相关责任人做出相应处理。

紧急情况的处理措施、预案

材料供应的处理措施、预案

本公司有完善的材料、设备供应商服务网络，拥有大批重合同、守信用、有实力的供应商，能保证工程所需材料、设备随时进入现场。

根据工程进展，各专业工程师提前做好材料需求计划，项目材料部门及时采购。

项目试验员对进场材料及时取样（见证取样）送检，并将检测结果及时呈报监理工程师。及时向监理工程师呈报进场材料合格证，材料供应商资质证明等。

配置高效、环保性能好的机械设备，保证工程所需材料能及时加工并运输至施工层，同时减少对周边环境的影，进行施工用电线路的维护，同时配备 30 部手提应急灯及 30 部手电筒。为保证施工机械在施工过程中运行的可靠性，项目加强对设备的维修保养，对机械易损件的采购储存，落实定期检查制度，保证设备运行状态良好。

突然停电及机械故障的处理措施、预案

现场除利用业主提供的电源作为正常状态下的施工用电，同时现场配备柴油发电机组，作为备用电源，给重要机械及重要部位的照明供电。

现场配电室设置联络柜，柴油发电机组通过联络柜与市政供电线路相互切换，并形成连锁，设置手/自动转换开关，当市电断电后，可通过自动或手动方式启动柴油发电机组,并保证正常照明及 30 分钟的应急照明时间。

在楼梯间、疏散通道、场区消防通道设置疏散指示标志。建筑物的出入口、楼梯间、疏散通道、施工场区的消防通道以及办公区的照明纳入应急供电。停电后，立即启动柴油发电机，由维修电工携带手提应急灯进入施工楼层，检查楼内的照明恢复情况，同时引导工人有秩序撤出。

项目配备 2 名维修电工。

项目部每月由专人组织维修电工对现场电气线路、灯具、配电箱进行检查，每月启动柴油发电机组一次，保证柴油发电机组能随时正常使用。检查结果形成文字记录，并由检测人员签字认可，制定相关责任制。

消防的处理措施、预案

成立义务消防队，并严格按国家文件规定建立相应的消防防范设备。沿建筑物（基坑）周边敷设直径 DN100 钢管作为临时给水源，水管埋深 800mm。现场周边地下式消防栓（设消防栓井），并且每个消防箱配备（内设消防水带 50m、消防枪一个），设明显标志牌，以满足现场周边消防要求。建筑物消防用水由环线水管引到楼层内，并配备成套消防箱，设明显标志牌，以满足楼层现场的消防要求。

采取黑板报、观看 VCD 等形式普及消防知识，提高全体职工的消防意识。

每季举行一次消防演习活动，增强员工的应急应变能力。

发现火情者要大声呼喊，并及时向项目部领导汇报。

消防队长负责现场总指挥，同时向上级领导报告。

义务消防队员用灭火器、消防桶提水、用铁锹铲土灭火,并负责打开消防栓接上水龙带灭火。

由安全员对火情发展态势进行判断，必要时，打 119 电话报警，并安排人员接车。

3 卫生防疫的处理措施、预案

成立疫情管理机构

成立疫情隔离控制指挥部、负责隔离控制协调指挥工作，指挥部由业主、总包单位、监理单位、分包单位的主要负责人和政府、卫生防疫部门、公安机关负责人共同组成，总承包单位负责人负总责。

成立现场应急管理机构，对工地疫情防治、隔离控制、生活保障、治安保卫及对外联系实施具体管理。现场应急管理机构由业主、总承包单位、监理单位和分包单位项目负责人组成，总承包单位项目负责人负总责。

对疫情工地实行严格封闭管理

现场设立隔离区，切断工地与外界的直接接触，隔离区设立醒目标识，禁止无关人员入内，防止疫情扩大。

加强现场保卫，每日 24 小时巡逻检查和门卫 24 小时值班，配备足够的保安人员，保证发生疫情后，工地人员不外出。

工地内采取严密的隔离措施

对于与疫情密切接触者，进行重点隔离，密切接触者严格按防疫部门要求采取严密的隔离措施。

加强对疫情密切接触者隔离区的管理，不得与隔离人员接触，隔离人员不得到隔离区外活动。

做好隔离区内疫情防治工作。

配合卫生防疫部门，做好对隔离区的消毒工作。对隔离区人员每天进行体检，并认真做好记录。

做好对隔离人员的宣传教育工作，普及预防知识，做好隔离区人员思想工作，排除恐慌心理，积极服从和配合卫生防疫部门做好防治工作。

杜绝私自出走或不服从管理的事件发生。

抵抗风险措施

风险因素识别

依据项目承包内容、分包管理、项目管理人付款、市场变化、气候条件等背景资料，本公司施工同类工程的经验及潜在的因素，本项目的风险主要存在于以下几个方面：技术风险，管理风险，过程控制风险，质量风险，市场风险，法律法规，职业安全风险，环境风险，项目管理人及利益相关者等方面。

潜在风险的分类及应对措施

技术风险

风险内容：施工方法选择不当，试验不合格；事前应对措施：优化技术方

案；事中应对措施：制定补救措施；事后应对措施：评估事件技术改进；

管理风险

风险内容：管理不到位个人能力差，施工队素质低；事前应对措施：明确管理机制劳务队预审；事中应对措施：调整组织结构启动备选合格劳务队；事后应对措施：评估事件原因将施工队从合格劳务队中删除；

过程控制风险 风险内容：协调不到位；事前应对措施：工程例会协调；事中应对措施：强化施工过程管理；事后应对措施：进行总结，改进管理；

质量风险风险内容：质量缺陷；事前应对措施：制定创优计划；

事中应对措施：分析质量原因，调整管理方案；事后应对措施：质量总结，开质量分析会；

职业安全风险

风险内容：安全事故传染病；事前应对措施：制定应急预案；

事中应对措施：启用应急预案；

事后应对措施：进行总结，调整应急预案；

环境风险

风险内容：环保不达标；

事前应对措施：制定环境管理计划，制定预案并检查；事中应对措施：及时整改；事后应对措施：对责任人处理；

附件 20：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

材料真实性承诺书

玛沁县自然资源和林业草原局（招标人）：

我公司承蒙贵单位信任，参加贵单位**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六**（项目名称）的招标工作深感荣幸，我公司郑重向贵单位承诺：

我公司保证提供的所有材料的真实性。

我方保证上述信息的真实和准确，否则愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：**青海泽标建设工程有限公司**（公章）

2025 年 07 月 15 日

供应商资格要求承诺函

致：**玛沁县自然资源和林业草原局**

如果我方有幸在本次招标过程中中标，我方郑重承诺：在**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六**工程的施工过程中完全响应招标文件中的如下资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件，并提供下列材料：

<1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

5、本次招标不接受联合体投标。

6、本次采购要求供应商须具备有效的《林草种子生产经营许可证》；肥料、

肥料已提供有效的检测报告。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相关法律责任。

投标人：**青海泽标建设工程有限公司**（单位电子章）

法定代表人：李秋英（签字）

2025 年 07 月 15 日

未被列入严重失信主体名单的市场主体，被青海省林草局列入失信名单的市场主体限制其参加政府投资工程建设项目招标投标活动承诺函

玛沁县自然资源和林业草原局（招标人）：

我公司承蒙贵单位信任，参加贵单位**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六**（项目名称）的招标工作深感荣幸，我公司郑重向贵单位承诺：

我公司在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“信用青海”中未被列入严重失信主体名单的市场主体，未被青海省林草局列入失信名单的市场主体限制其参加政府投资工程建设项目招标投标活动。

我方保证上述信息的真实和准确，否则愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：**青海泽标建设工程有限公司**（公章）

2025 年 07 月 15 日


欢迎访问信用中国（青海西宁）官方网站！今天是：2025年5月14日 星期三
登录 | 关于我们 | 网站声明 | 长者模式 | 【无障碍阅读】
信用中国（青海西宁）
CREDIT.XINING.GOV.CN
信用查询
统一社会信用代码
站内文章
请输入企业 / 工商注册号 统一社会信用代码...
首页
信用动态
政策法规
信用公示
联合奖惩
信用服务
信用承诺
信易+
专项治理
信用研究
典型案例
互动交流
当前位置：信用西宁>>典型案例
青海林草项目工程建设活动主体“失信名单”（第一批）
来源： 青海省林业和草原局 访问次数： 发布时间：2025-02-14 15:09 打印
为加强我省林草项目工程建设领域信用体系建设，创新监管手段，褒扬诚信，惩戒失信，促进工程建设活动主体依法诚信经营，根据《青海省林草项目工程建设“失信名单”和“失信约束”管理办法(试行)》，决定将天奕工程咨询有限公司等7家林草项目工程建设第三方企业列入“失信名单”。“失信名单”管理期限为两年(自公告之日起)，期间，“失信名单”企业不得参与青海省林草项目工程建设。
现予公告。
附件：青海林草项目工程建设活动主体“失信名单”（第一批）
文章搜索
请输入查找文章的关键字
栏目直通车
信用双公示
政策法规
信用红黑榜
联合奖惩

青海林草项目工程建设活动主体“失信名单”（第一批）

序号	失信名单
1	天弈工程咨询有限公司
2	青海霆钧生态建设有限公司
3	海北同宝牧源农畜产品工贸有限公司
4	湟中兴源生态环境治理有限公司
5	亿信联建设项目管理有限公司
6	青海乾海农牧科技开发有限公司
7	北屹城农业开发有限公司

联系电话：0971-6365120

青海省林业和草原局

2025年2月6日

青海林草项目工程建设活动主体"失信名单"（第二批）

青海林草 2025年04月17日 18:45 青海

为加强我省林草项目工程建设领域信用体系建设，创新监管手段，褒扬诚信，惩戒失信，促进工程建设活动主体依法诚信经营，根据《青海省林草项目工程建设"失信名单"和"失信约束"管理办法(试行)》(青林项〔2024〕474号)，决定将西宁恒绿生态治理有限公司等4家林草项目施工第三方企业列入"失信名单"。"失信名单"管理期限为两年(自公告之日起)，期间，被列入"失信名单"企业禁止准入青海省林草领域生态项目施工活动。

现予公告。

附件:林草项目工程建设活动主体"失信名单"（第二批）

序号	失信名单
1	西宁恒绿生态治理有限公司
2	青海昀邦生态农业科技有限公司
3	互助县欧珠绿化有限公司
4	青海盈环建筑劳务有限公司

联系电话：0971-6365120

青海省林业和草原局

2025年4月16日

投标过程中，如发现“以提供虚假类似业绩、虚假发票、虚假人员资质及证件、虚假企业资质”中标的企业，按否决投标处理承诺书

玛沁县自然资源和林业草原局（招标人）：

我公司承蒙贵单位信任，参加贵单位**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六**（项目名称）的招标工作深感荣幸，我公司郑重向贵单位承诺：

投标过程中，如发现“以提供虚假类似业绩、虚假发票、虚假人员资质及证件、虚假企业资质”中标的企业，按否决投标处理。

我方保证上述信息的真实和准确，否则愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：**青海泽标建设工程有限公司**（公章）

2025 年 07 月 15 日

符合《政府采购法》第 22 条条件承诺书

玛沁县自然资源和林业草原局（招标人）：

我公司承蒙贵单位信任，参加贵单位**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六**（项目名称）的招标工作深感荣幸，我公司郑重向贵单位承诺：我公司符合《政府采购法》下列条件：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声 明。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

我方保证上述信息的真实和准确，否则愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺!

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

本项目拒绝转包、分包承诺书

玛沁县自然资源和林业草原局（招标人）：

如果我方有幸在本次招标过程中中标，我方郑重承诺：在**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六**工程的施工过程中我公司全程负责其项目施工，绝不转包、不分包，如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人：**青海泽标建设工程有限公司**（公章）

2025 年 07 月 15 日

借用他人企业资质承诺书

玛沁县自然资源和林业草原局（招标人）：

我公司承蒙贵单位信任，参加贵单位**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六**（项目名称）的招标工作深感荣幸，我公司郑重向贵单位承诺：

投标过程中，我公司没有借用他人企业资质。

我方保证上述信息的真实和准确，否则愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：**青海泽标建设工程有限公司**（公章）

2025 年 07 月 15 日

投标人资格要求承诺函

玛沁县自然资源和林业草原局（招标人）：

如果我方有幸在本次招标过程中中标，我方郑重承诺：在**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六**工程的施工过程中完全响应招标文件中的如下资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件，并提供下列材料：

<1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

5、本次招标不接受联合体投标。

6、本次采购要求供应商须具备有效的《林草种子生产经营许可证》；需提供有效的检测报告（已提供）

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相关法律责任。

投标人：青海泽标建设工程有限公司（单位电子章）

法定代表人：[illegible]（签字）

2025 年 07 月 15 日

不转包、不分包承诺书

致：**玛沁县自然资源和林业草原局**

如果我方有幸在本次招标过程中中标，我方郑重承诺：在**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六**工程的施工过程中，我公司全程负责其项目施工，绝不转包、不分包，如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

特此承诺

投标人：**青海泽标建设工程有限公司**（单位电子章）

法定代表人：李积英（签字）

2025 年 07 月 15 日

具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料承诺书

致：**玛沁县自然资源和林业草原局**

本公司严格遵守招标文件的要求，具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。否则，皆取消投标资格。本公司愿接受招标人及用户单位监督。

特此声明！

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：**玛沁县自然资源和林业草原局**

我公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。本公司愿接受招标人及用户单位监督。

特此声明！

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025年07月15日

履行合同的设备和专业技术能力的承诺函

致：玛沁县自然资源和林业草原局

我公司收到贵方招标采购文件，在完全理解该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我公司决定参加该项目招标采购。

我公司参加的投标活动，现承诺：

1、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

2、按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人。我公司在参加本次政府采购活动中，如获中标，保证具有履行本次采购所具有专业技术能力。

特此承诺。

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

投标人不得存在下列情形之一承诺书

玛沁县自然资源和林业草原局（招标人）：

我公司不存在下列情形：

1.4.2 投标人有下列情况之一的，投标无效；隐瞒实情骗取中标的，中标无效：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）投标资格被暂停、取消或责令停业期间的；

（10）被最高人民法院列为失信被执行人“黑名单”的；

（11）《企业资质证书》或《安全生产许可证》被暂扣或取消期间的；

（12）财产被接管、冻结或企业处于破产状态的；

（13）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段或者未划分标段

的同一招标项目投标的；

（14）未按招标文件规定提交电子投标文件的；

（15）法律法规规定的其他情形。

181.4.3 初步评审时有下列情况之一的，经评标委员会认定，该投标人的投标无效：

（1）投标文件中无企业法人统一社会信用代码证书、安全生产许可证；

（2）投标文件未按招标文件的规定格式填写，关键内容不全的；

（3）投标报价高于最高投标限价的；

（4）投标人递交两份以上内容不同的投标文件或针对同一项目有多个不同报价的，但招标文件另

有规定的除外；

（5）不可竞争费用未按相关规定足额计取或者让利、优惠的；

（6）投标文件载明的工期超过招标文件规定期限的；

（7）投标有效期少于招标文件规定期限的；

（8）未对招标文件的实质性条款做出完全响应的；

（9）法律法规规定的其他情形。

我方保证不存在上述情形，否则愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单的，取消投标资格承诺书

致：玛沁县自然资源和林业草原局

我公司经认真研究，决定参加青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025)退化草原修复工程（围栏封育)包六（项目名称）工程投标，现郑重承诺：我公司没有被经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人：青海泽泽建设工程有限公司(公章)

2025 年 07 月 15 日

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动的承诺书

致：玛沁县自然资源和林业草原局

我公司经认真研究，决定参加青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025)退化草原修复工程（围栏封育)包六（项目名称）工程投标，现郑重承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动否则，皆取消投标资格。

特此承诺！

投标人：青海泽泰建设工程有限公司(公章)

2025 年 07 月 15 日

为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的承诺函

玛沁县自然资源和林业草原局：

本公司严格遵守招标文件的要求，本公司保证为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，皆取消投标资格。本公司愿接受招标人及用户单位监督。

特此声明！

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

本次投标不是联合体投标的承诺书

致：玛沁县自然资源和林业草原局

我公司经认真研究，决定参加**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025)退化草原修复工程(围栏封育)包六**（项目名称）工程投标，现郑重承诺：本次投标不是联合体投标。

特此承诺！





投标人：青海泽标建设工程有限公司(公章)

2025 年 07 月 15 日

非外资独资或外资控股企业声明

致：玛沁县自然资源和林业草原局

本公司注册地址在青海省西宁市城中区南川东路85号40号楼2单元261室，不存在外资独资或外资控股企业等问题。

特此声明！

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025年07月15日

流水作业保证承诺函

致：玛沁县自然资源和林业草原局

我公司经认真研究，决定参加**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025)退化草原修复工程(围栏封育)包六**（项目名称）工程投标，现郑重承诺：**流水作业能保证种植连续、均衡、有节奏地进行。**

特此承诺！

投标人：青海泽标建设工程有限公司(公章)

2025 年 07 月 15 日

雇佣当地30%劳动力承诺（劳动力资源保障承诺）

致：玛沁县自然资源和林业草原局

若我公司中标，做出以下承诺，第一时间与招标人签订合同，在用工方面考虑到当地牧民群众放牧不需要时时看护，因此，有闲置人员的具体情况，通过当地乡、村委会协调，与当地牧民群众中雇佣**30%及以上的人员**参加施工作业，签订正式的劳务合同，确保项目的顺利实施。

特此承诺！

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

在人员、设备、资金方面的承诺

致：玛沁县自然资源和林业草原局

我公司收到贵方招标采购文件，在完全理解该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我公司决定参加该项目招标活动。

我公司参加的投标活动，现承诺：

一、我公司拟投入施工及管理人员完全满足施工需求，并承诺雇佣当地牧民达到 30%及以上。

二、我公司拟投入本项目的机械设备配置合理、中小型机械齐全，完全满足工程需求，生产资源配备齐全。

三、资金方面，保证农民工工资及时足额发放，确保工程资金专款专用，并对资金进行合理分配，保证施工进度的落实和完成。特此承诺！

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

对施工工期的承诺

致：**玛沁县自然资源和林业草原局**

我公司有幸中得 **青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025)退化草原修复工程（围栏封育)包六**，服务期限：120（具体按合同约定执行）。交货地点：拉加镇、东倾沟乡、雪山乡。

1、本投标单位接受招标书中所有招标条件。

2、本投标单位保证，如果我公司的投标被接受，本投标单位作为投标人，愿按照投标文件中合同协议条款和合同条件所确定的各项规定执行。

3、进场后应与甲方管理人员联系，在施工期间配合甲方进度安排和有关配合事宜。各施工段具体施工时间均以甲方下达的施工任务书为准。

特此承诺！

投标人： 青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

不拖欠农民工工资的承诺书

致：玛沁县自然资源和林业草原局

为认真贯彻落实各上级主管部门关于切实解决建设领域拖欠工程款的民工工资问题的要求，我公司特此承诺：在青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六中绝不出现施工单位拖欠民工工资。具体措施为：

1、施工单位与所有民工签订劳动合同。

2、开设专门账户，由公司财务派专人专管，保证工程款的专款专用。

3、根据工程进度计划，让施工单位制定出民工工资支付表。

4、将民工工资的支付情况纳入项目经理部的各项考核指标中进行统一考核

5、严格按照行业主管部门的规定，足额发放农民工工资如果发生农民工工资拖欠现象，无条件接收上级主管部门处罚。

特此承诺!

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

项目管理班子承诺书

致：玛沁县自然资源和林业草原局

我方在此声明，我方拟派往青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六（项目名称）（项目名称，以下简称“本工程”）的项目负责人、技术负责人、技术员现阶段没有担任任何在施建设工程项目的人员。

中标后，我方保证并配置上述项目管理机构，不更换项目管理机构人员。人员常驻工地。

我方保证上述信息的真实和准确，否则愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺!

投标人： 青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

技术水平、文件制作规范的承诺

致：玛沁县自然资源和林业草原局

我公司承蒙贵单位信任，参加贵单位青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六（项目名称）的招标工作深感荣幸，我公司郑重向贵单位承诺：

我公司完全响应招标文件的技术水平要求。并且投标文件制作规范完全响应招标文件，没有细微偏差情形的情况。

资格性审查文件是按照招标文件规定和要求签字、盖章的。

特此承诺！

投标人：　青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025年07月15日

信誉承诺

致：玛沁县自然资源和林业草原局

2020 年 04 月 07 日至本项目发布招标公告之日止，本公司未因安全、质量、违法违纪问题被国家和青海省政府有关部分禁止、限制投标活动的情形，并在资金、人员、设备、技术等方面具有相应的能力；不存在串通投标的行为。

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

规模及服务能力承诺函

致：玛沁县自然资源和林业草原局

在我单位的服务工作过程中，我们将严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻需方的意见，维护需方的利益，严把质量关，把向需方提供优质服务，作为我们工作目标。我单位本着想需方之所想，急需方之所急。在项目服务过程中与需方密切配合，随时随地提供全过程、全方位的服务，保证各项工作的顺利进行。 如我公司有幸中得**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复项目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育)包六**，我公司郑重承诺如下：

一、如果我公司中标，我们保证保质保量完成工程。

二、我公司严格按照需方提供的规格标准进行供货。

三、施工中，我公司会严格按照投标文件及合同中的承诺履行。

投标人： 青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

农民工工资支付保证措施

一、为完成本项目施工任务，保障农民工及施工机械费，我公司做了多项保证措施：

1、我公司为民工设立了绿色通道及举报电话：0971-6249989，民工有意见或难题可直接电话或找农民工专管员：谢甫伟，及时得到解决。

2、我公司有关部门积极采取措施，开设了农民工调查小组，专门调查解决农民工工资拖欠、纠纷等现象，以保证农民工工资及时发放，让农民工劳有所得。发现拖欠民工工资现象，公司将严厉处罚，做到“工程完工工资结清”决不拖欠民工一分钱。

3、在州、县劳动保障部门与建设主管部门监管下，我公司与农民工签订劳动合同，保证民工及时拿到自己的辛苦钱，也保证了工程建设的顺利进行。

4、保证按月、准时发放农民工工资。

5、我公司建立民工工资专用账户，预存工资款，避免由于工程中一些复杂问题而造成资金困难，农民工工资不能按时发放的情况。

二、为认真贯彻落实各上级主管部门关于切实解决由于拖欠工程款，民工工资不能发放问题的要求，我公司承诺：决不出现施工单位拖欠民工工资。

具体措施为：

1、与所有农民工签订劳动合同并及时交付履约保证金，在项目实施地监查大队备案。

2、开设工资专用账户，由公司财务派专人专管，保证工程款的专款专用。

3、根据工程进度计划，制订出民工工资支付计划表。

4、将民工工资的支付情况纳入项目经理的各项考核指标中进行统一考核。

5、严格按行政主管部门规定，足额发放农民工工资，及时支付施工机械费，如果发生拖欠现象，无条件接受上级主管部门处罚，无条件接受建设单位直接从拨付的工程款中扣除所欠农民工工资或施工机械费。

投标人：青海泽标建设工程有限公司（盖单位章）

2025 年 07 月 15 日

无重大违法记录声明

致：玛沁县自然资源和林业草原局

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人：青海泽标建设工程有限公司（公章）

2025 年 07 月 15 日

近年没有发生诉讼和仲裁情况的承诺

玛沁县自然资源和林业草原局：

本公司严格遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，自我司成立之日起至 2025 年 07 月 15 日止，在经营活动中没有重大违法记录，没有发生的诉讼及仲裁情况，本公司愿接受招标人及用户单位监督。

特此声明！

投标人：　青海泽标建设工程有限公司（单位电子章）

2025 年 07 月 15 日

十一、报价一览表

投标报价一览表

投标单位名称：青海潜力农牧科技开发有限公司 **单位：人民币(元)**

项目名称（包号）	投标总报价	交 货（工）期	交货地点	备注
青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复目(2024-2025)退化草原修复工程（围栏封育）（采购项目编号：青海鼎新公招（货物）2025-017）（包七）	大写：玖佰陆拾玖万肆仟玖佰元整 小写：￥9694900.00 元	120 天（具体按合同约定执行）	大武镇查仓村、当洛乡、优云乡、下大武乡	
其他承诺及需要说明的事项：无				

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.投标总报价包括产品费、安装费、施工费、人工费、机械费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货（工）期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.除在投标文件中编制此表以外，投标人应在青海省政府采购电子化平台中进行网上报价，网上报价应和此表报价一致，否则以网上报价为准，不接受者投标无效。

5.投标总报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则，投标无效。

6.投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在报价一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对报价一览表中所载内容无异议。

投标单位：青海潜力农牧科技开发有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

十二、分项报价表

分项报价表

投标单位名称：青海潜力农牧科技开发有限公司

包号：包七　　**单位：人民币（元）**

序号	产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	合计	备注
1	围栏网片	围栏材料、基本参数与施工安装均参照《编结网围栏》（JB/T 7138-2010），编结网围栏的规格（网片为缠绕式）、基本参数、 技术要求和检 验规则执行。 围栏规格为 91L8/110/50（即纬线根数 8 根，纬宽 1.1m，经线间距 50cm），钢丝伸长率不小于 4%，反复弯曲次数规格：顶 10×10cm，底 15×15cm。 相邻纬线自上而下间距为 20cm、18cm、18cm、15cm、13cm、13cm、13cm。	青海潜力农牧科技开发有限公司	673962.7	米	4.00	2695850.80	
2	小立柱	热扎等边角钢 40×40×4×2000mm	青海潜力农牧科技开发有限公司	63570	根	40.00	2542800.00	
3	中间柱	热扎等边角钢 70×70×7×2000mm	青海潜力农牧科技开发有限公司	1687	根	90.00	151830.00	
4	大立柱	热轧等边角钢 90×90×8×2000mm	青海潜力农牧科技开发有限公司	2139	根	110.00	235290.00	
5	支撑杆	电焊钢管 50×3000mm	青海潜力农牧科技开发有限公司	6897	根	95.00	655215.00	
6	双扇门	围栏门框架采用 GB/T13793 中Φ25 的直缝电焊钢管；围栏门采用双扇结构，单扇高 1300mm，宽 1500mm；原材料采用 30×3mm 扁铁，40×40×4mm 角钢，1.5mm 钢板；围栏门扁铁间距为 150mm	青海潜力农牧科技开发有限公司	233	付	380.00	88540.00	

7	门柱	热扎等边角钢 90×90×8×2000mm	青海潜力农牧科技开发有限公司	466	根	110.00	51260.00	
8	地锚	热轧等边角钢 40×40×4×600mm	青海潜力农牧科技开发有限公司	932	根	30.00	27960.00	
9	镀锌拉丝	直径为 2.8mm 的镀锌钢丝	青海潜力农牧科技开发有限公司	673962.7	米	1.00	673962.70	
10	下拉柱	热轧等边角钢 40×40×4×600mm	青海潜力农牧科技开发有限公司	13478	根	30.00	404340.00	
11	绑钩	直径为 2.50mm 的镀锌钢丝，每根长度 200mm	青海潜力农牧科技开发有限公司	606564	根	0.50	303282.00	
12	挂钩	直径为 2.50mm 的镀锌　钢丝，每根长度 200mm	青海潜力农牧科技开发有限公司	134794	根	0.50	67397.00	
13	拉线	直径为 2.8mm 的镀锌钢丝	青海潜力农牧科技开发有限公司	5592	米	1.00	5592.00	
14	安装费	/	青海潜力农牧科技开发有限公司	673962.7	米	2.50	1684906.75	
15	运输费	/	青海潜力农牧科技开发有限公司	673962.7	米	/	106673.75	
投标总价		**大写：玖佰陆拾玖万肆仟玖佰元整** **小写：￥9694900.00 元**						

注：1.本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3.各投标人按照采购需求填写。

投标单位：青海潜力农牧科技开发有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：　　（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

（一）网上报价与投标文件报价一致接受网上报价的承诺

致：玛沁县自然资源和林业草原局

青海鼎新工程项目管理有限公司

我公司**青海潜力农牧科技开发有限公司**提交的**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育）（采购项目编号：青海鼎新公招（货物）2025-017）；投标包号：（包七）**的项目投标过程中，我公司的投标报价保证会跟网上报价与投标文件报价一致，且接受网上报价，不会出现报价不一致的情况。

本公司对上述书面承诺负责，并对因投标文件不一致或不接受网上报价的一切后果自愿承担。

投标单位：青海潜力农牧科技开发有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

（二）不会出现两个或两个以上报价方案的承诺

致：玛沁县自然资源和林业草原局

青海鼎新工程项目管理有限公司

我公司**青海潜力农牧科技开发有限公司**提交的**青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育）（采购项目编号：青海鼎新公招（货物）2025-017）；投标包号：（包七）**的项目投标过程中，我公司的投标文件中的投标报价保证不会出现两个或两个以上报价方案。

本公司对上述书面承诺负责，并对因投标文件中出现以上情况，我公司一切后果自愿承担。

投标单位：青海潜力农牧科技开发有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日

（三）投标总报价保证不超过招标文件规定的最高限价的承诺

致：玛沁县自然资源和林业草原局

青海鼎新工程项目管理有限公司

我公司青海潜力农牧科技开发有限公司提交的青海省果洛州玛沁县阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复目(2024-2025）退化草原修复工程（围栏封育）（采购项目编号：青海鼎新公招（货物）2025-017）；投标包号：（包七）的投标文件中郑重承诺：

我公司提交的投标文件中的投标总报价保证不超过招标文件规定的最高限价。本公司对上述书面承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人：青海潜力农牧科技开发有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

2025 年 07 月 15 日
